



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 16ª REGIÃO


Portfólio de Projetos de TIC

Fevereiro/2019

Sumário

1.	RESUMO DOS PROJETOS	3
2.	COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES	5
3.	SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	6
4.	SETOR DE GOVERNANÇA DE TI	10
5.	SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL	12
6.	SEÇÃO DE APOIO AO PJE	14
7.	SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE	17
8.	SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	19

1. Resumo dos projetos

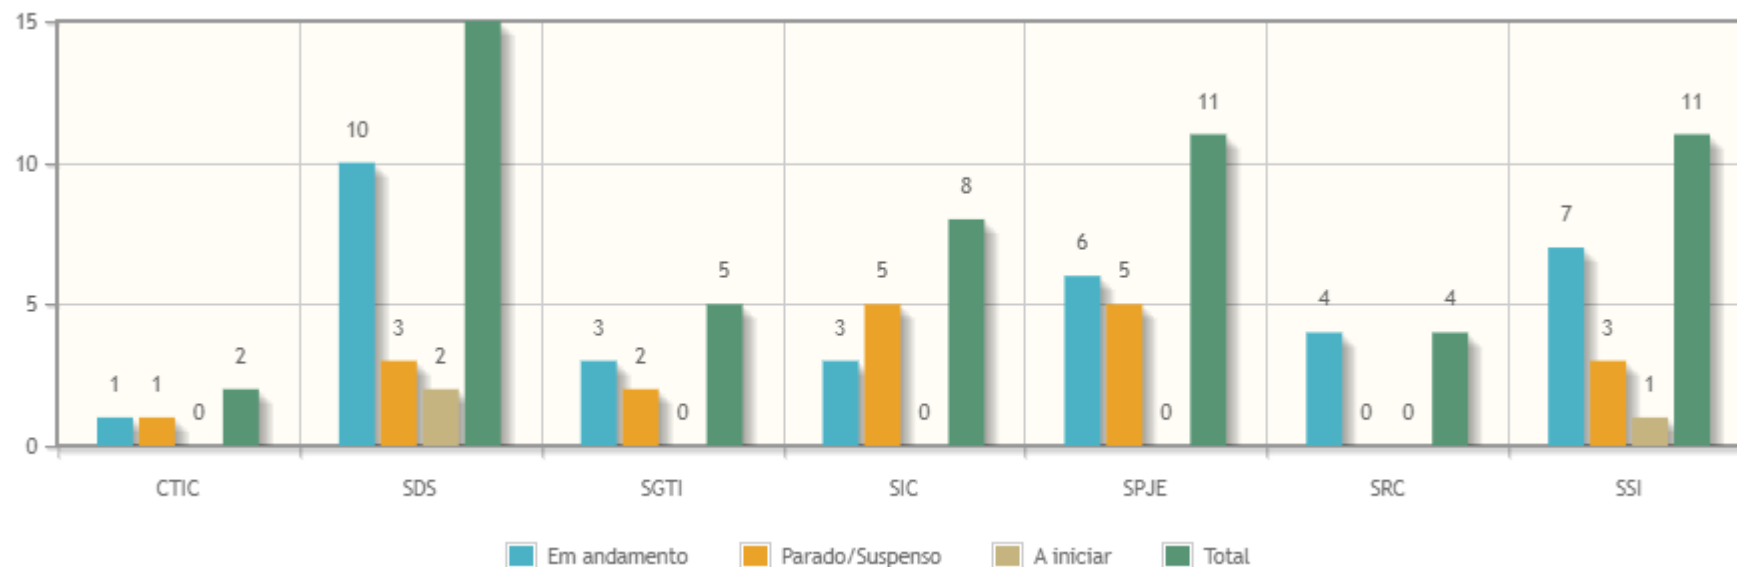

1.1. Projetos concluídos no período

Id	Nome	Gerente do projeto	Unidade responsável	Tipo	Data da demanda	Início realizado	Fim realizado	Status
347	Solução de certificados digitais para magistrados e servidores	Stanley Araujo de Sousa	SSI	Contratação	09/06/2018	11/03/2019	28/02/2019	Concluído
389	Absorção Central Nacional PJE	Carlos Eduardo Ferreira Marins	SRC	Projeto	03/07/2018	17/07/2018	12/02/2019	Concluído
467	Realizar medição dos indicadores do PETIC JT 2015-2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	SGTI	Ação	13/02/2019	18/02/2019	22/02/2019	Concluído
468	Elaborar Relatório de Gestão de TIC 2018 - TCU	Rafael Robinson de Sousa Neto	SGTI	Ação	14/02/2019	25/02/2019	28/02/2019	Concluído

1.2. Projetos iniciados no período


Id	Nome	Gerente do projeto	Unidade responsável	Tipo	Data da demanda	Início realizado	Fim realizado	Status
467	Realizar medição dos indicadores do PETIC JT 2015-2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	SGTI	Ação	13/02/2019	18/02/2019	22/02/2019	Concluído
468	Elaborar Relatório de Gestão de TIC 2018 - TCU	Rafael Robinson de Sousa Neto	SGTI	Ação	14/02/2019	25/02/2019	28/02/2019	Concluído

2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações

CTIC

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

■ dezembro/2018
 ■ janeiro/2019
 ■ fevereiro/2019



#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Progresso no período
1	221	Implantação de ambiente site backup	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Em andamento	Projeto	30/11/2017	26/06/2019			50%	Em construção. Infraestrutura civil concluída e equipamentos maiores entregues (no-breaks e ar-condicionados). Empenho de 2018 todo utilizado. Aguardando envio da descentralização pelo CSJT.

Portfólio de Projetos de TIC - Fevereiro/2019


2	246	Contratação de empresa para prestação de serviço no Sistema de Videomonitoramento IP - CFTV-IP	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Suspenso	Contratação	16/02/2018	28/06/2019			5%	Sem progresso no período.
---	-----	--	-----------------------------------	----------	-------------	------------	------------	--	--	----	---------------------------

3. Setor de Desenvolvimento de Sistemas

SDS

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

■ dezembro/2018
 ■ janeiro/2019
 ■ fevereiro/2019

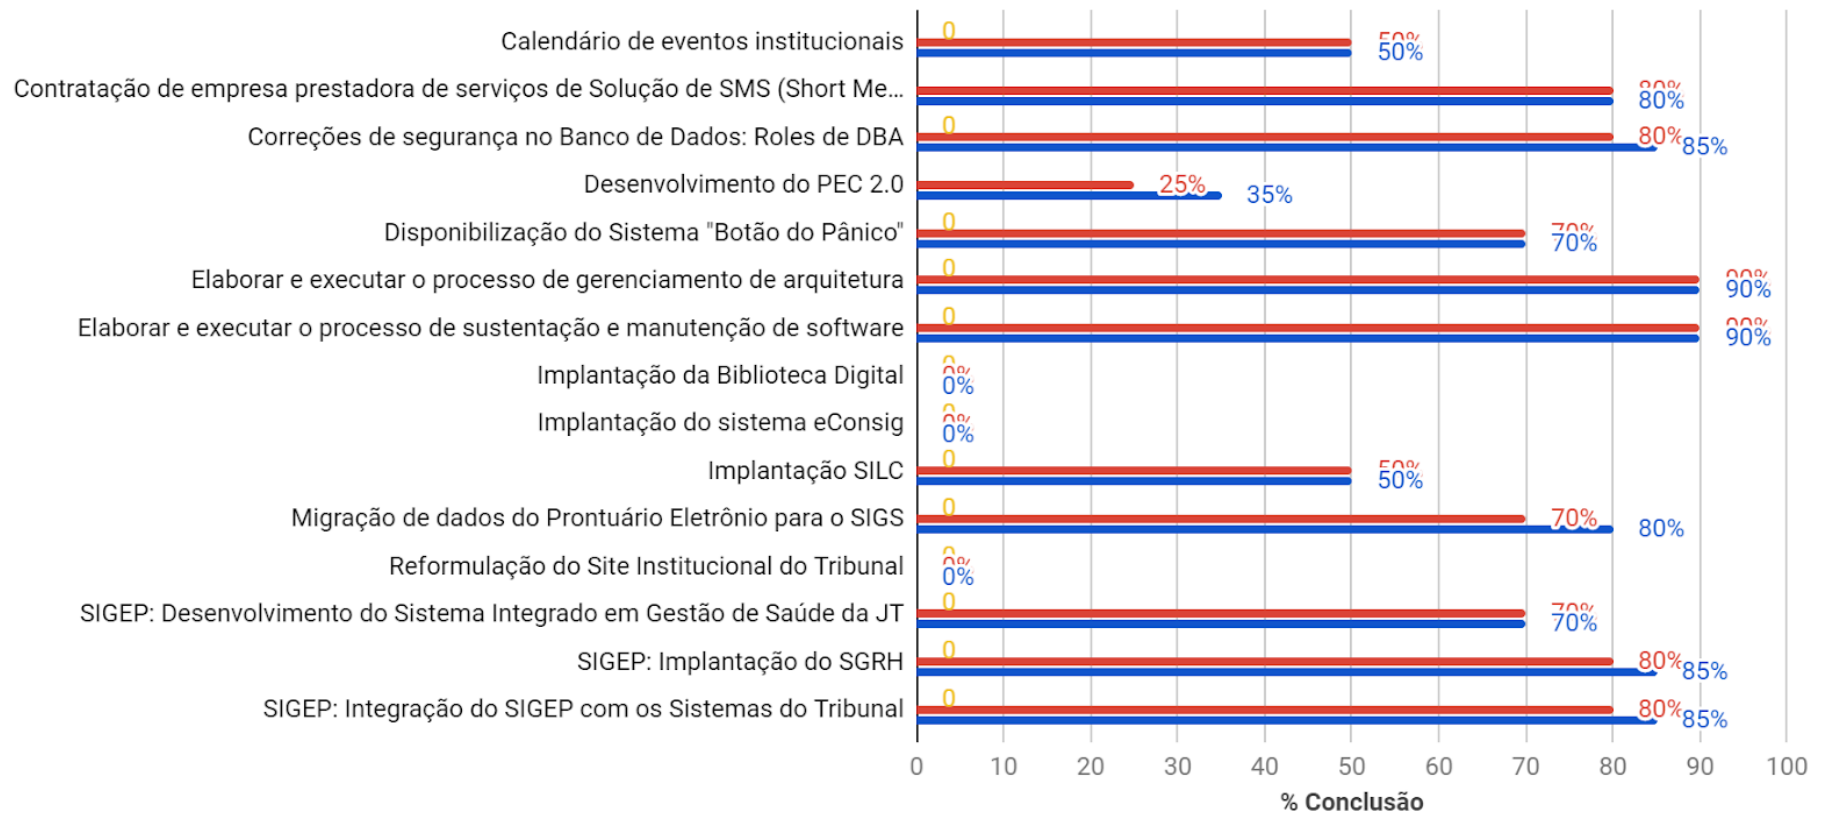

Portfólio de Projetos de TIC - Fevereiro/2019

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	10	Correções de segurança no Banco de Dados: Roles de DBA	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	10/01/2017	30/04/2019			85%	Realizado a revisão e consolidação das permissões de desenvolvimento nos ambientes. Pendente quatro esquemas de sistemas judiciais (LEXML, EJUS, ECALC, CNDT).
2	19	Implantação SILC	Andre Pereira Nunes	Suspensão	Projeto	06/02/2018	31/07/2019			50%	Sem progresso no período.
3	32	SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	24/05/2018	30/04/2019			85%	Concluída adequação do extrator do Assyst e iniciado a adequação da Intranet (servidor).
4	187	SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	Diogo Duailibe da Silva	Em andamento	Projeto	25/08/2017	01/12/2020			70%	Correções de problemas da sprint de janeiro. Iniciada nova sprint relacionada ao E-Social, Auditoria e Alteração de funcionalidades já existentes.
5	223	Calendário de eventos institucionais	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	06/12/2017	29/03/2019			50%	Analisada proposta de alteração de solução para o projeto utilizando a plataforma do Google Calendar.
6	224	Implantação do sistema eConsig	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	06/12/2017	01/07/2019			0%	Sem progressos no período. O projeto só pode iniciar após a o SIGEP e a FolhaWeb estarem em produção.
7	277	SIGEP: Implantação do SGRH	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	01/01/2018	30/04/2019			85%	Plano de Homologação da FolhaWeb: adequações nos layouts de arquivos bancários; Resolução de 48 chamados (via Assyst): 35 do SGRH e 13 FolhaWeb; Integração com a Escola Judicial: migração de palestrantes e participantes externos.
8	279	Implantação da Biblioteca Digital	Andre Pereira Nunes	Suspensão	Projeto	01/01/2018	28/06/2019			0%	Sem progresso no período.


Portfólio de Projetos de TIC - Fevereiro/2019

9	280	Reformulação do Site Institucional do Tribunal	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	01/01/2018	27/12/2019			0%	Sem progresso no período.
10	354	Desenvolvimento do PEC 2.0	Ronny Paterson Cruz da Silva	Em andamento	Projeto	03/07/2018	29/03/2019			35%	Evolução no desenvolvimento dos pacotes: Pacote 01 de 100% para 74%. Pacote 02 de 50% para 60%. Pacote 03 de 0% para 25%. Pacote 04 de 0% para 25%.
11	376	Elaborar e executar o processo de sustentação e manutenção de software	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	02/08/2018	29/03/2019			90%	Documento do processo, minuta da portaria e fluxo elaborados. Aguardando revisão e submissão ao CGovTIC.
12	386	Elaborar e executar o processo de gerenciamento de arquitetura	Diogo Duailibe da Silva	Em andamento	Projeto	27/08/2018	29/03/2019			90%	Documento do processo, minuta da portaria e fluxo elaborados. Aguardando revisão e submissão ao CGovTIC.
13	444	Migração de dados do Prontuário Eletrônico para o SIGS	Darlon José Coqueiro	Em andamento	Projeto	12/11/2018	30/04/2019			80%	Migrado o módulo odontológico (homologação pendente no SIGS);
14	446	Disponibilização do Sistema "Botão do Pânico"	Darlon José Coqueiro	Suspenso	Projeto	13/11/2018	15/03/2019			70%	Sem progresso no período.
15	458	Contratação de empresa prestadora de serviços de Solução de SMS (Short Message Service) Corporativo	Gilberto Cunha Filho	Em andamento	Contratação	22/1/2019	11/03/2019	23/01/2019		80%	Elaborado minuta do aditivo do contrato.

4. Setor de Governança de TI

SGTI

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

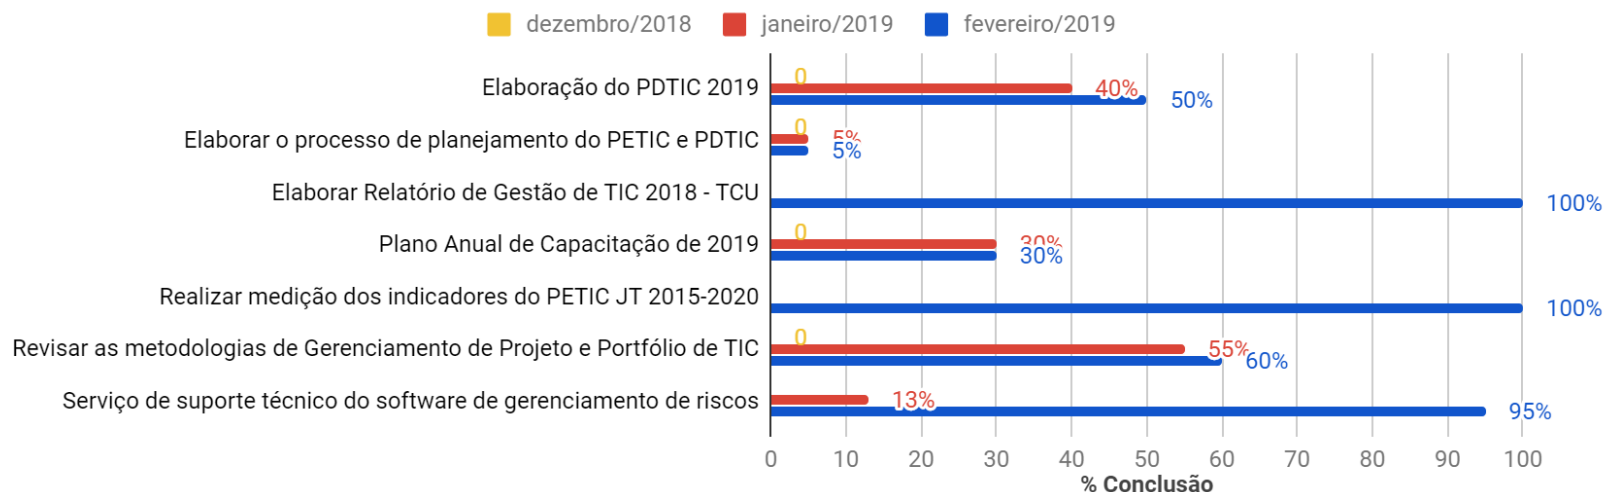

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	365	Elaboração do PDTIC 2019	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Projeto	3/8/2018	03/05/2019			50%	Coleta de necessidades com as unidades da CTIC. Inventário de necessidades em 90% concluído. Próxima etapa: priorização das ações levantadas.
2	372	Elaborar o processo de planejamento do PETIC e PDTIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	Suspenso	Projeto	10/08/2018	03/05/2019			5%	Sem progresso no período.


Portfólio de Projetos de TIC - Fevereiro/2019

3	392	Revisar as metodologias de Gerenciamento de Projeto e Portfólio de TIC	Maickel Roberto Neitzke	Em andamento	Projeto	24/09/2018	31/05/2019			60%	Finalizado a escrita do Processo de Gerenciamento de Demandas;
4	448	Plano Anual de Capacitação de 2019	Jose Augusto	Suspenso	Projeto	14/11/2018	12/04/2019			30%	Sem progresso no período.
5	456	Serviço de suporte técnico do software de gerenciamento de riscos	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Contratação	22/01/2019	15/03/2019	43494		95%	ETP elaborado e trâmites para realização da prorrogação contratual. Contrato assinado pela Presidente. Resta assinatura da contratada.
6	467	Realizar medição dos indicadores do PETIC JT 2015-2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	Concluído	Ação	13/02/2019	22/02/2019	43514	43518	100%	Ação concluída. Realizada a medição dos indicadores e encaminhado ofício ao CSJT com as medições.
7	468	Elaborar Relatório de Gestão de TIC 2018 - TCU	Rafael Robinson de Sousa Neto	Concluído	Ação	14/02/2019	28/02/2019	43521	43524	100%	Ação finalizada no período com as seguintes tarefas realizadas: Planejamento da ação; Elaboração do Relatório de Gestão de TIC; e Preparação e envio do Ofício de encaminhamento do relatório.

5. Setor de Infraestrutura Computacional

SIC

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

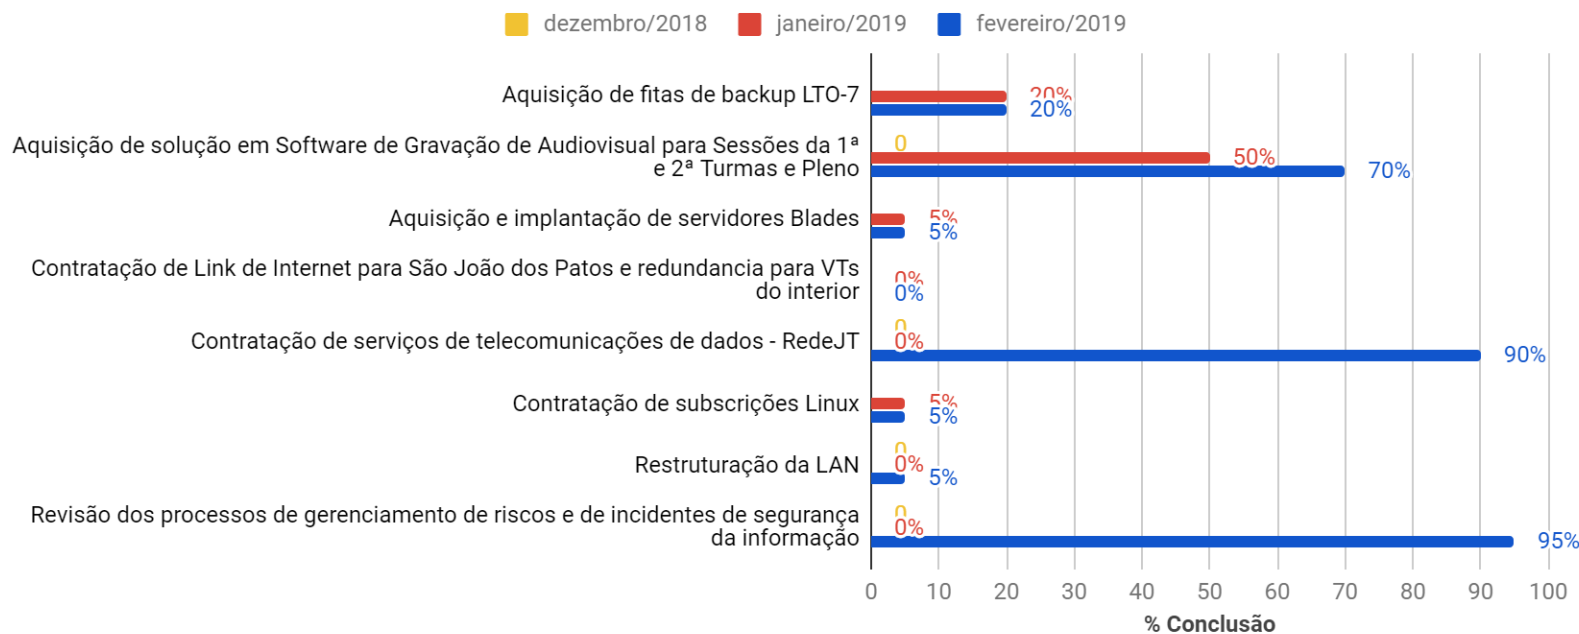

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	51	Contratação de Link de Internet para São João dos Patos e redundância para VTs do interior	Danilo Augusto Alves Leite	Suspensão	Contratação	23/3/2018	15/03/2019			0%	Sem progresso no período.

Portfólio de Projetos de TIC - Fevereiro/2019


2	233	Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT	Danilo Augusto Alves Leite	Em andamento	Contratação	12/01/2018	31/05/2019			90%	Foram concluídos os upgrades de todas as VTs com exceção de Barra do Corda e Presidente Dutra que estão em fase de execução junto à Oi.
3	349	Revisão dos processos de gerenciamento de riscos e de incidentes de segurança da informação	Danilo Augusto Alves Leite	Suspensão	Projeto	19/06/2018	31/05/2019			95%	Sem progresso no período. CGSIC não deliberou o processo.
4	358	Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno	Pablo Teofilo Durans	Em andamento	Contratação	06/07/2018	30/04/2019			70%	Estudos sobre as necessidades e levantamento de possíveis fornecedores considerando os novos requisitos da solução.
5	442	Restruturação da LAN	Danilo Augusto Alves Leite	Suspensão	Projeto	17/10/2018	30/04/2020			5%	Sem progresso no período.
6	455	Aquisição e implantação de servidores Blades	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	Projeto	15/01/2019	28/06/2019	31/01/2019		5%	ETP do Tribunal elaborado e corrigido.
7	460	Aquisição de fitas de backup LTO-7	Aured de Freitas Costa Rodrigues	Suspensão	Projeto	29/01/2019	30/06/2019	30/01/2019		20%	Sem progresso no período. Aguardando resposta do TRT18 de quando será publicada Intenção de Registro de Preços.
8	461	Contratação de subscrições Linux	Fernando Rola Ferreira Filho	Suspensão	Projeto	29/01/2019	31/07/2019	30/01/2019		5%	Sem progresso no período.

6. Seção de Apoio ao PJe

SPJE

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

■ dezembro/2018 ■ janeiro/2019 ■ fevereiro/2019

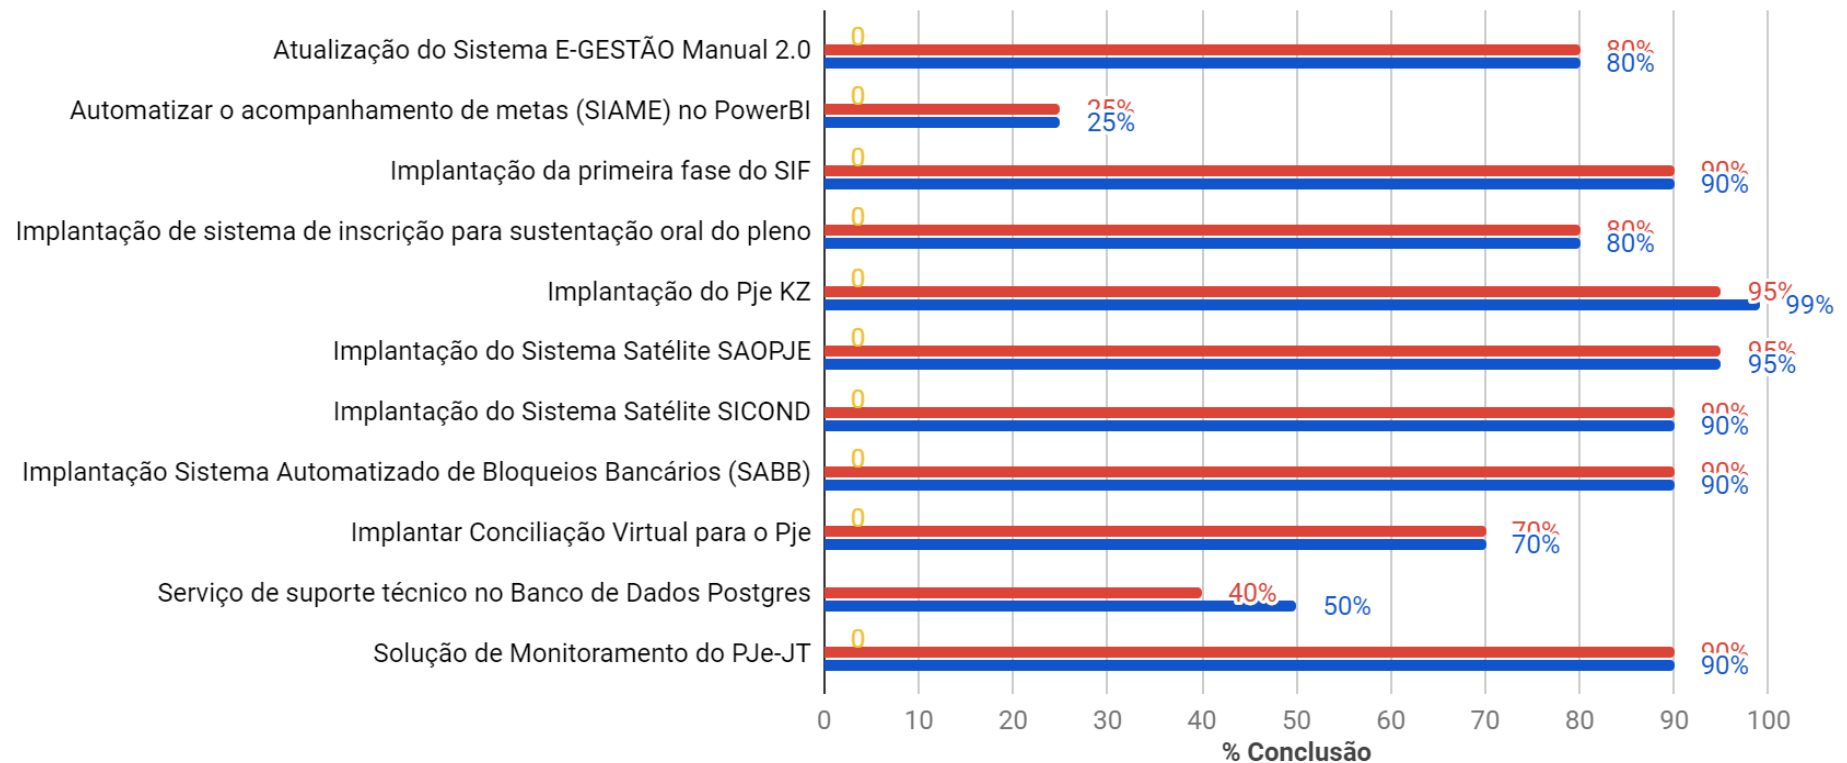

Portfólio de Projetos de TIC - Fevereiro/2019


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	41	Implantação do Pje KZ	Gilberto Cunha Filho	Em andamento	Projeto	02/01/2018	29/03/2019			99%	Enviado para aceite final do projeto.
2	56	Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0	Gilberto Cunha Filho	Suspensão	Projeto	06/04/2018	31/12/2019			80%	Sem progresso no período. Aguardando definição pelo TST da data inicial de vigência para liberação das novas regras já implementadas.
3	132	Implantação da primeira fase do SIF	Gilberto Cunha Filho	Em andamento	Projeto	30/03/2017	30/04/2019			90%	Sem progresso no período.
4	175	Implantar Conciliação Virtual para o Pje	Gutemberg Pereira Vidal Santos	Em andamento	Projeto	20/07/2017	06/06/2019			70%	Restabelecido o sistema e base de dados.
5	236	Implantação do Sistema Satélite SAOPJE	Ronny Paterson Cruz da Silva	Suspensão	Ação	22/01/2018	28/03/2019			95%	Sem progresso no período.
6	237	Implantação do Sistema Satélite SICOND	Ronny Paterson Cruz da Silva	Suspensão	Ação	22/01/2018	29/03/2019			90%	Sem progresso no período.
7	244	Implantação de sistema de inscrição para sustentação oral do pleno	Gilberto Cunha Filho	Em andamento	Projeto	15/02/2018	29/03/2019			80%	Testes realizados em ambiente de homologação.
8	353	Solução de Monitoramento do PJe-JT	Romulo Moura	Suspensão	Contratação	21/06/2018	31/05/2019			90%	Sem progresso no período. O TST informou que o processo seria retomado ainda em fevereiro de 2019.
9	378	Automatizar o acompanhamento de metas (SIAME) no PowerBI	David Tedson Mendonca Ferreira	Suspensão	Ação	23/08/2018	28/06/2019			25%	Sem reporte do gerente do projeto.
10	396	Implantação Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários (SABB)	Gilberto Cunha Filho	Em andamento	Projeto	28/09/2018	29/03/2019			90%	Instalação em mais VTs e no Gabinete Virtual.

11	463	Serviço de suporte técnico no Banco de Dados Postgres	Romulo Moura	Em andamento	Contratação	10/01/2019	31/05/2019	29/01/2019		50%	Planejamento do projeto realizado.
----	-----	---	--------------	--------------	-------------	------------	------------	------------	--	-----	------------------------------------

7. Setor de Relacionamento com o Cliente

SRC

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

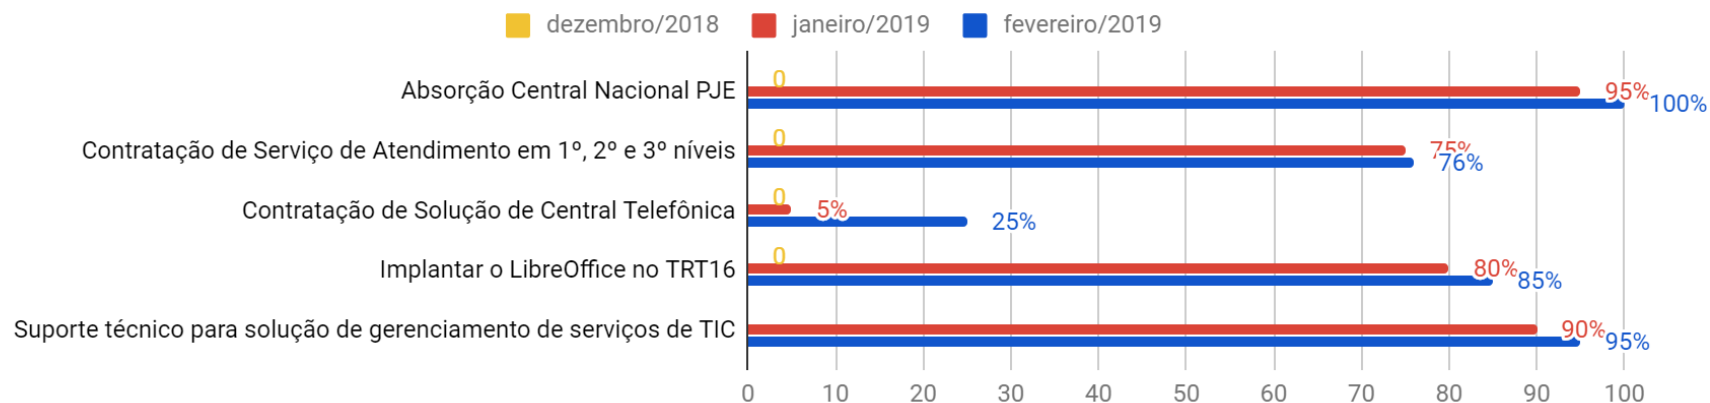

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	351	Implantar o LibreOffice no TRT16	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	25/6/2018	29/03/2019			85%	Estudos do processo de instalação nas VTs do interior pela SIC.
2	381	Contratação de Solução de Central Telefônica	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Contratação	27/08/2018	30/08/2019			25%	Elaborando o ETP, em levantamento das soluções através de pesquisas e reuniões com representantes das empresas.
3	389	Absorção Central Nacional PJE	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Concluído	Projeto	03/07/2018	15/02/2019	17/07/2018	43508	100%	Projeto concluído.

Portfólio de Projetos de TIC - Fevereiro/2019


4	391	Contratação de Serviço de Atendimento em 1º, 2º e 3º níveis	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Contratação	19/09/2018	30/09/2019			76%	ETP finalizado recomendou prorrogação do atual contrato até que se conclua a nova licitação.
5	462	Suporte técnico para solução de gerenciamento de serviços de TIC	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Contratação	30/01/2019	14/03/2019	30/01/2019		95%	ETP sugeriu a renovação do atual contrato de suporte do Assyst. ADITIVO Nº 1 CT 18/2017 assinado.

8. Seção de Segurança da Informação

SSI

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

■ dezembro/2018 ■ janeiro/2019 ■ fevereiro/2019

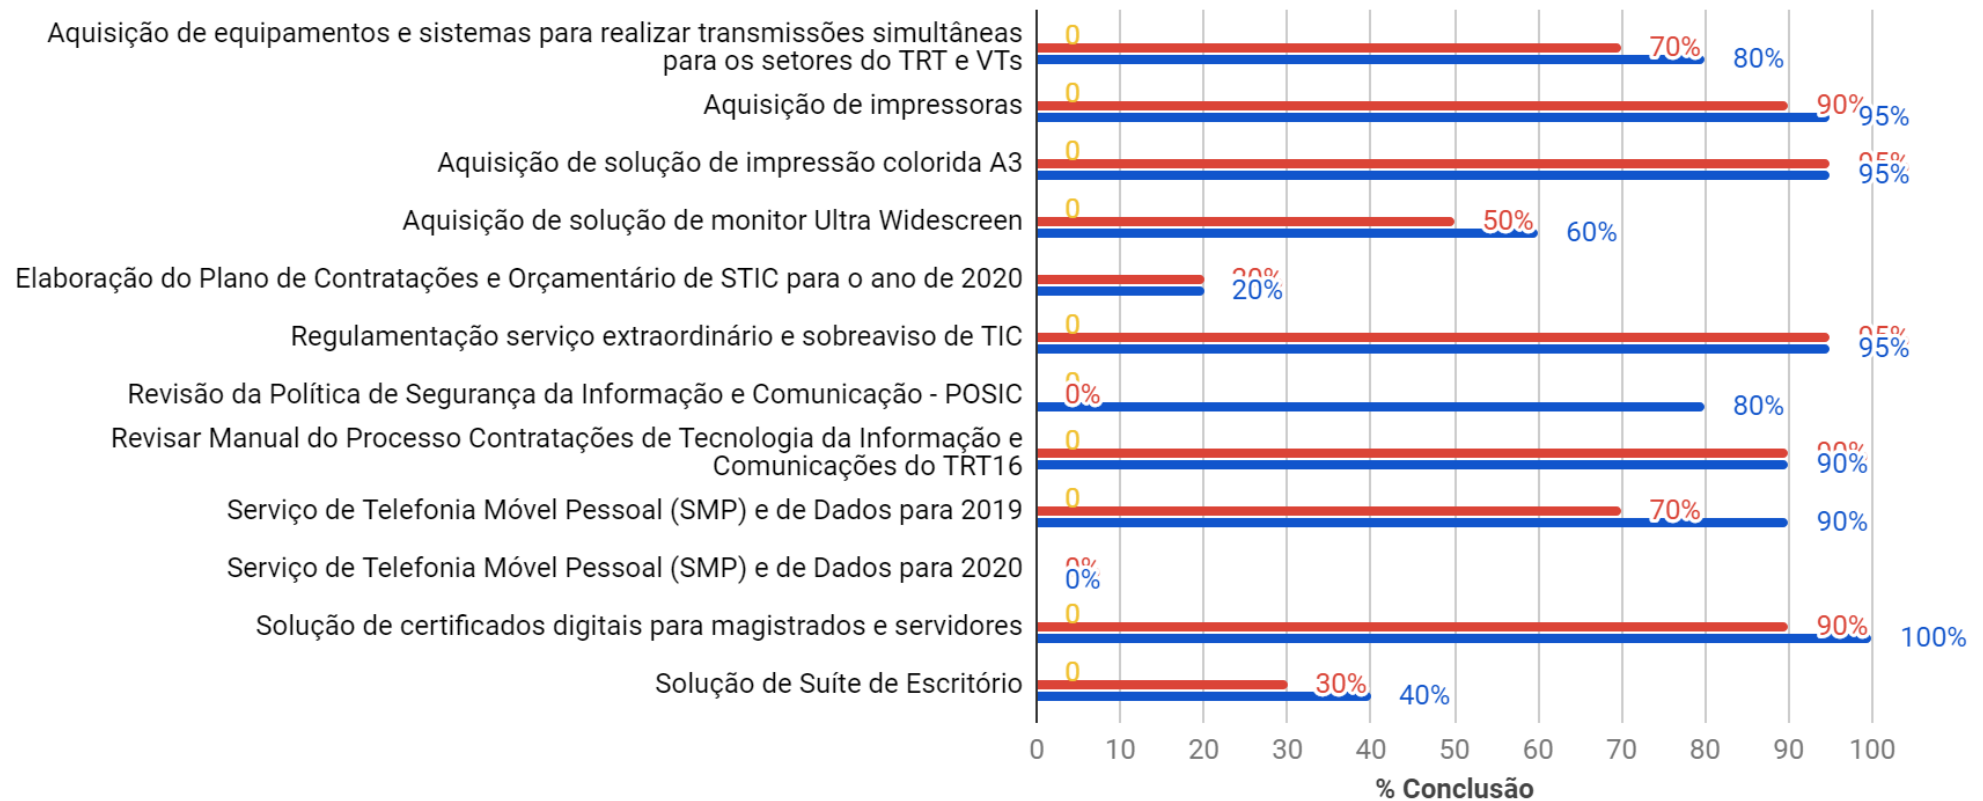

Portfólio de Projetos de TIC - Fevereiro/2019

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	38	Aquisição de impressoras	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Contratação	08/02/2018	30/04/2019			95%	Recebimento dos equipamentos.
2	39	Regulamentação serviço extraordinário e sobreaviso de TIC	Stanley Araujo de Sousa	Suspenso	Ação	27/04/2018	30/04/2019			95%	Sem progresso no período.
3	42	Aquisição de solução de impressão colorida A3	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Contratação	26/10/2017	30/04/2019			95%	Contrato N° 07/2019 assinado.
4	147	Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16	Stanley Araujo de Sousa	Suspenso	Projeto	09/05/2017	09/05/2019			90%	Sem progresso no período.
5	168	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	28/06/2017	31/05/2019			80%	Revisão aprovada pelo CGSIC. Encaminhado para deliberação pela Presidência.
6	222	Aquisição de equipamentos e sistemas para realizar transmissões simultâneas para os setores do TRT e VTs	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Contratação	01/12/2017	31/05/2019			80%	Web Cam HD: 60 recebidas e pagas. Entregue nas unidades judiciais com exceção das VTs de São João dos Patos e Balsas. Bacabal e Chapadinha está agendado para 12 de março. Caixa de Som: 60 recebidas. Entregue nas unidades judiciais com exceção das VTs de São João dos Patos, de Pedreiras, de Balsas, de Barra do Corda, de Presidente Dutra, de Caxias e de Estreito. As unidades de Pinheiro, de Bacabal, de Santa Inês, de Chapadinha e de Barreirinhas agendado para 12 de março de 2019. Microfone: A contratada ainda não assinou o contrato.

Portfólio de Projetos de TIC - Fevereiro/2019

											Providências estão sendo adotadas pela Administração.
7	347	Solução de certificados digitais para magistrados e servidores	Stanley Araujo de Sousa	Concluído	Contratação	09/06/2018	08/03/2019	11/03/2019	28/02/2019	100%	Projeto concluído.
8	375	Aquisição de solução de monitor Ultra Widescreen	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Contratação	27/08/2018	31/07/2019			60%	Em processo pelo CSJT de confirmação do quantitativo informado pelos TRTs e a estimativa orçamentária.
9	390	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2019	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Contratação	21/09/2018	12/04/2019			90%	ETP aprovado pelo NAJ. Está na DG para deliberação.
10	450	Solução de Suíte de Escritório	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Contratação	21/11/2018	28/06/2019			40%	Recebimento das respostas dos órgãos partícipes.
11	454	Elaboração do Plano de Contratações e Orçamentário de STIC para o ano de 2020	Stanley Araujo de Sousa	Suspenso	Projeto	04/01/2019	31/10/2019	04/01/2019		20%	Sem progresso no período.
12	457	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2020	Stanley Araujo de Sousa	A iniciar	Contratação	22/01/2019	10/04/2020			0%	Projeto a iniciar.
