



TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

PORTFÓLIO DE PROJETOS DE TIC

FEVEREIRO/2020

EGP-TIC

SUMÁRIO


1.	RESUMO DOS PROJETOS	3
1.1.	PROJETOS INCLUÍDOS NO PORTFÓLIO	4
1.2.	PROJETOS INICIADOS	4
1.3.	PROJETOS CONCLUÍDOS	4
1.4.	PROJETOS CANCELADOS	4
2.	COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES	5
3.	SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	7
4.	SETOR DE GOVERNANÇA DE TI	11
5.	SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL	13
6.	SEÇÃO DE APOIO AO PJE	17
7.	SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE	19
8.	SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	23

1. RESUMO DOS PROJETOS


Quantidade de projetos nas unidades



Complexidade dos projetos

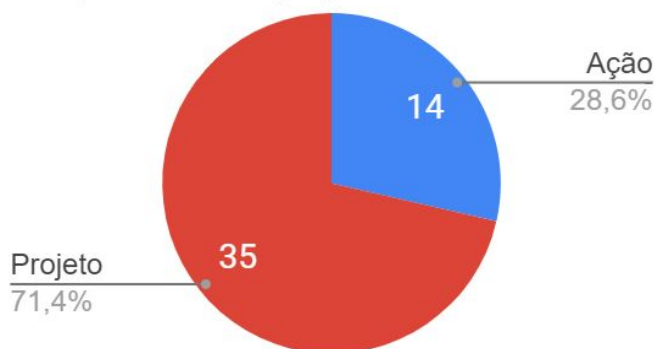

Situação dos projetos

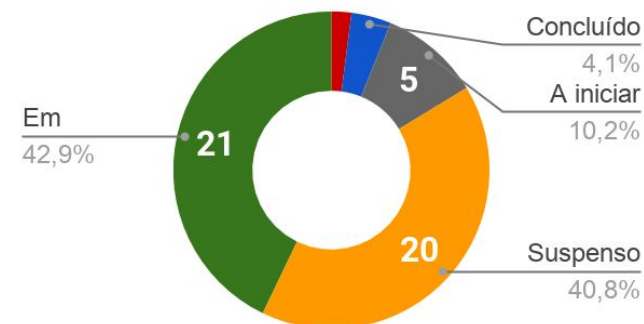

Situação dos projetos nas unidades



1.1. PROJETOS INCLUÍDOS NO PORTFÓLIO

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
523	Serviço de suporte técnico no Banco de Dados Postgres 2020	Fernando Rola Ferreira Filho	SIC	Ação	06/02/2020	06/02/2020		Em andamento
524	Solução de Business Intelligence	Gutemberg Pereira Vidal Santos	SPJE	Ação	12/02/2020	12/02/2020		Em andamento
525	Plano de Contratação e Orçamentário de TIC para o 2021	Stanley Araujo de Sousa	SSI	Ação	18/02/2020	18/02/2020		Em andamento

1.2. PROJETOS INICIADOS

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
523	Serviço de suporte técnico no Banco de Dados Postgres 2020	Fernando Rola Ferreira Filho	SIC	Ação	06/02/2020	06/02/2020		Em andamento
524	Solução de Business Intelligence	Gutemberg Pereira Vidal Santos	SPJE	Ação	12/02/2020	12/02/2020		Em andamento
525	Plano de Contratação e Orçamentário de TIC para o 2021	Stanley Araujo de Sousa	SSI	Ação	18/02/2020	18/02/2020		Em andamento

1.3. PROJETOS CONCLUÍDOS


<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
223	Calendário de eventos institucionais	Andre Pereira Nunes	SDS	Ação	06/12/2017	01/12/2019	19/02/2020	Concluído
378	Automatizar o acompanhamento de metas (SIAME) no PowerBI	David Tedson Mendonca Ferreira	CTIC	Ação	23/08/2018	01/08/2019	04/02/2020	Concluído

1.4. PROJETOS CANCELADOS

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
516	Aquisição de estações de trabalho de alto desempenho	Carlos Eduardo Ferreira Marins	SRC	Projeto	11/12/2019	11/12/2019	13/02/2020	Cancelado

2. COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

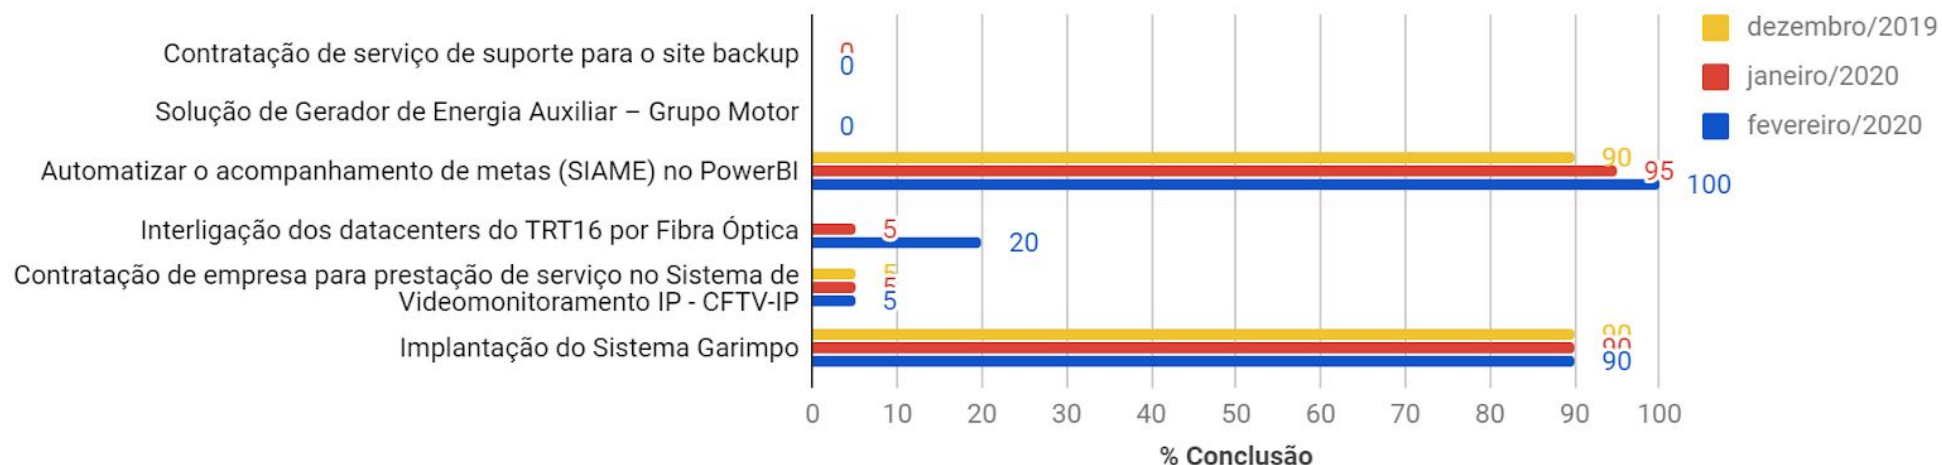


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	519	Contratação de serviço de suporte para o site backup	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	A iniciar	Projeto	15/01/2020	30/06/2020			0	Sem progresso no período. Aguardando a elaboração do TAP.
2	522	Solução de Gerador de Energia Auxiliar – Grupo Motor	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	A iniciar	Projeto	15/01/2020	30/09/2020			0	Projeto a iniciar no segundo semestre de 2020.
3	378	Automatizar o acompanhamento de metas (SIAME) no PowerBI	David Tedson Mendonca Ferreira	Concluído	Ação	23/08/2018	30/03/2020	01/08/2019	04/02/2020	100	Projeto concluído e encerrado formalmente com as metas 01, 02, 03, 05 e 06 do CNJ automatizadas. A meta 7 do CNJ, por não utilizar dados somente do sistema eGestão, não foi automatizada. Como as metas são anuais e a meta 7 já foi alimentada manualmente para o ano de 2019, o projeto foi concluído.

4	521	Interligação dos datacenters do TRT16 por Fibra Óptica	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Em andamento	Projeto	15/01/2020	30/08/2020	21/01/2020		20	Instituída equipe de planejamento. ETP em fase final de elaboração.
5	246	Contratação de empresa para prestação de serviço no Sistema de Videomonitoramento IP - CFTV-IP	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Suspenso	Projeto	16/02/2018	31/08/2019	16/02/2018		5	Sem reporte do Gerente de Projeto (EGP-TIC).
6	489	Implantação do Sistema Garimpo	David Tedson Mendonca Ferreira	Suspenso	Projeto	05/06/2019	31/03/2020	01/09/2019		90	Sem progresso no período. Pendência: implantação em produção pela equipe de infraestrutura computacional.

3. SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

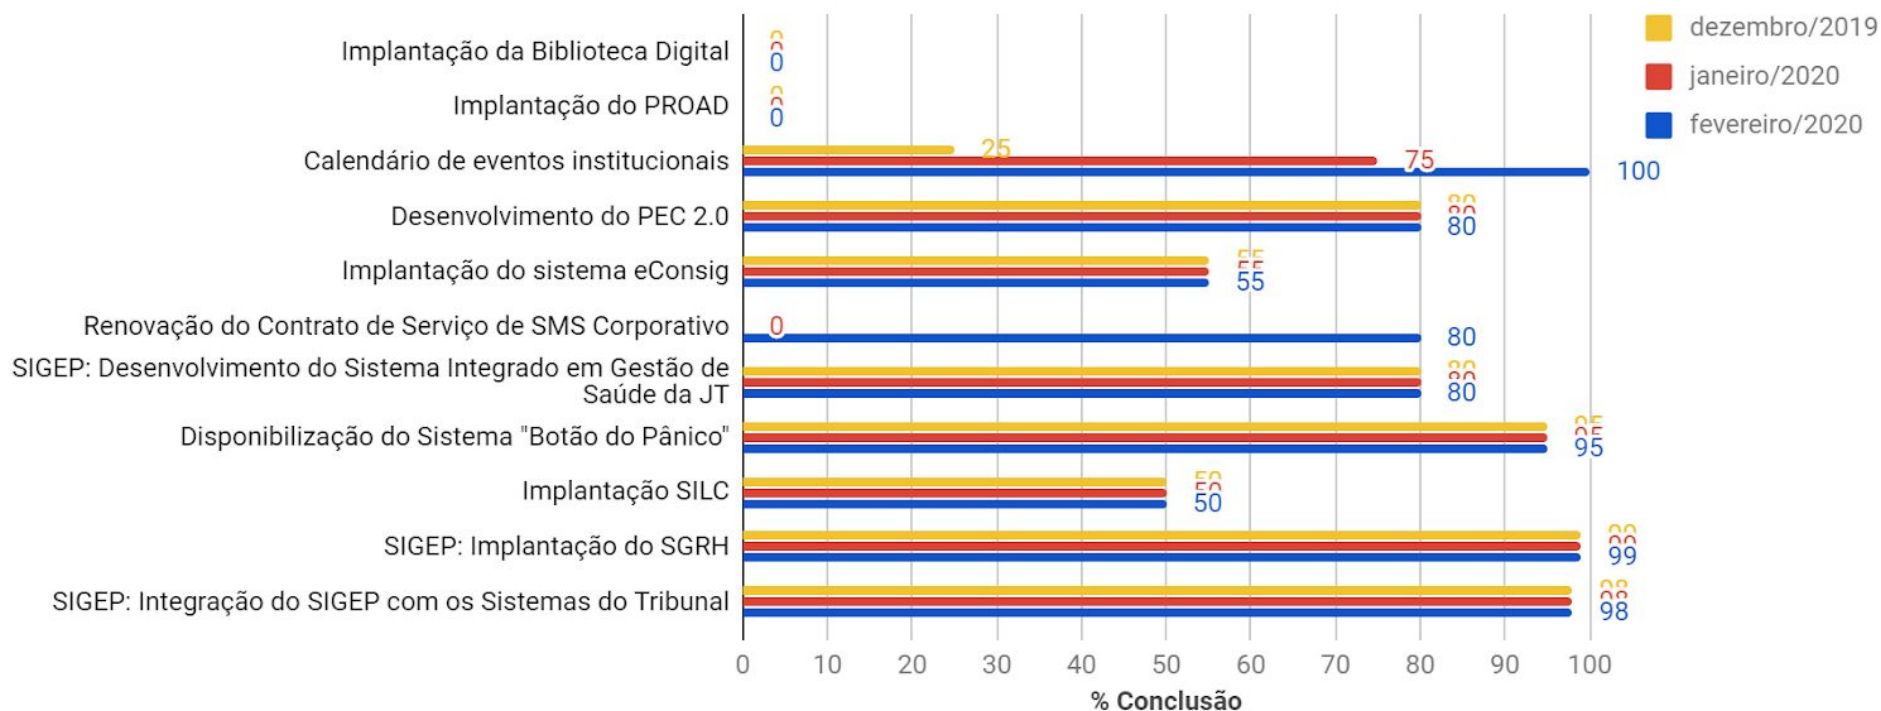

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	279	Implantação da Biblioteca Digital	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	01/01/2018	18/12/2020			0	Sem progressos no período. Projeto previsto para execução no segundo semestre de 2020.
2	499	Implantação do PROAD	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	28/02/2019	31/07/2020	28/08/2019		0	Sem progressos no período. Previsto para iniciar neste mês de Março/2020.


3	223	Calendário de eventos institucionais	Andre Pereira Nunes	Concluído	Ação	06/12/2017	19/02/2020	01/12/2019	19/02/2020	100	Projeto concluído. Termo de entrega aprovado pelo demandante (PA 8990/2017). Entregas realizadas: [ENTREGA 1] Tabela de tipos de eventos: 100% [ENTREGA 2] Módulo de cadastro de eventos na intranet: 100% [ENTREGA 3] Módulo de visualização do calendário: 100% [ENTREGA 4] Treinamento: 100%
4	187	SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	Diogo Duailibe da Silva	Em andamento	Projeto	25/08/2017	01/12/2020	29/08/2017		80	- Resolução de BUGS em virtude da atualização da versão do Angular em Front-end para a versão 9; - Resolução de BUGS em virtude de abertura de chamados pelos regionais.
5	224	Implantação do sistema eConsig	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	06/12/2017	31/03/2020	12/07/2019		55	TRT24 foi contatado para esclarecer dúvidas sobre o layout implementado. Aguardando a Folha de Pagamento responder aos questionamentos (email enviado em 04/02/2020).

6	354	Desenvolvimento do PEC 2.0	Ronny Paterson Cruz da Silva	Em andamento	Projeto	03/07/2018	30/06/2020	02/07/2018		80	Com todas as histórias devidamente integradas, o progresso no período consistiu na finalização da estabilização do PEC, com a correção de defeitos ainda existentes, a serem integrados na versão 2.5.4. Entregável 01 - Cadastro de Atos Agrupados e Exibição de Participantes do Processo 100% Entregável 02 - Cadastro de Destinatários, Outros destinatários e Signatários de Expedientes e Comunicações 100% Entregável 03 - PEC Fora do Fluxo e Impressão de Expedientes e Comunicações Físicos 100% Entregável 04 - Cadastro de Endereços em Expedientes e Comunicações 100% Entregável 05 - Integração com o GIM 100% Entregável 06 - Finalização de Expedientes e Comunicações 100% Entregável 08 - Integração com o GIGS 0% Entregável 09 - Integração com o eCarta 0% Entregável 10 - Integração com as Cartas Precatórias 0%
7	520	Renovação do Contrato de Serviço de SMS Corporativo	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Ação	15/01/2020	31/03/2020	21/01/2020		80	- Realizada pesquisa de preços e recebida proposta comercial de interesse em renovação; - Enviado parecer à Secretaria de Administração justificando ser razoável a renovação; - Minuta do contrato elaborada, parecer favorável do Assessoramento Jurídico, aprovado pelo Direção Geral, confirmado disponibilidade financeira.
8	19	Implantação SILC	Andre Pereira Nunes	Suspenso	Projeto	06/02/2018	18/12/2020	23/04/2018		50	Sem progressos no período. Projeto previsto para execução no segundo semestre de 2020.
9	32	SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	Andre Pereira Nunes	Suspenso	Projeto	24/05/2018	30/06/2020	04/06/2018		98	- Conforme solicitado, os sistemas satélites de Folha e Rh continuarão executando em paralelo por mais alguns meses. A data de virada dos sistemas satélites foi alterada para dia 01/06/2020.

10	277	SIGEP: Implantação do SGRH	Andre Pereira Nunes	Suspensão	Projeto	28/04/2015	31/03/2020	28/04/2015		99	Sem progressos no período. Pendência: aguardando o aceite da Escola Judicial (Encaminhado via PA 2372/2015).
11	446	Disponibilização do Sistema "Botão do Pânico"	Darlon José Coqueiro	Suspensão	Projeto	13/11/2018	31/12/2019	13/11/2018		95	Sem progresso no período. Pendência: Setor de Segurança resolver sobre a disponibilidade de Chefes e Diretores de Vara utilizarem o sistema.

4. SETOR DE GOVERNANÇA DE TI

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

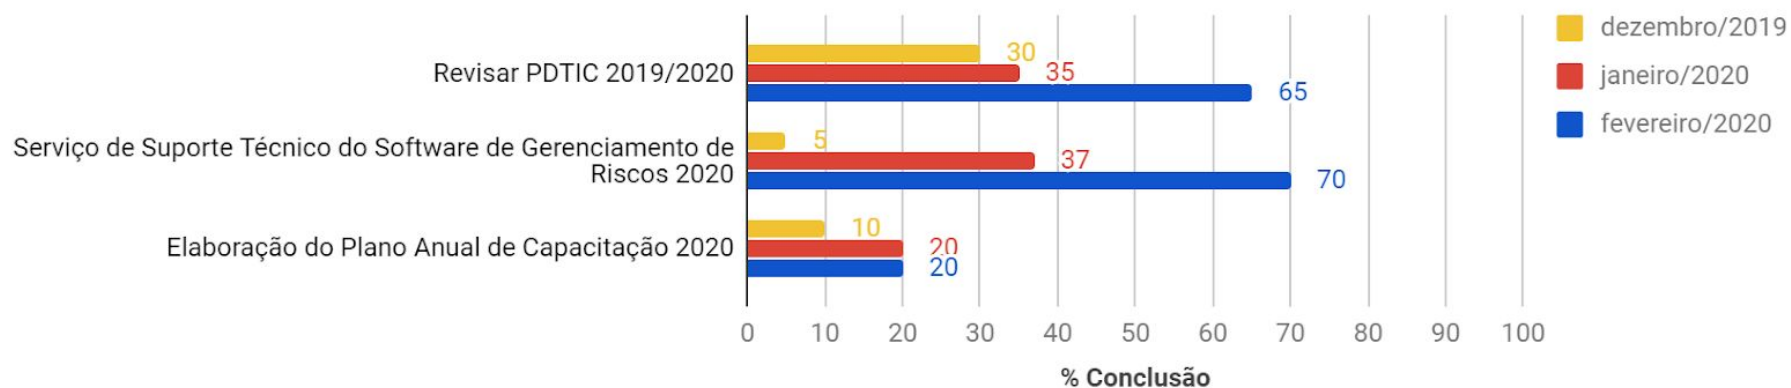


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	483	Serviço de Suporte Técnico do Software de Gerenciamento de Riscos 2020	Jose Augusto	Em andamento	Ação	25/04/2019	16/03/2020	16/01/2020		70	Evolução dos entregáveis: 1 Preparação Fechada 100% 2 Estudo Técnico Preliminar Fechado 100% 3 Termo de Referência Fechado 100% 4 Contratação Nova 0%
2	509	Revisar PDTIC 2019/2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Ação	04/11/2019	27/03/2020	14/11/2019		65	- Realizada a análise de execução do exercício de 2019; - Definida a lista de projetos e ações atualizadas para o exercício de 2020; - Em fase de finalização da minuta da nova versão do PDTIC; - Evolução nos entregáveis: -- Avaliação do resultado das metas e ações previstas para 2019 - Em andamento 100% -- Necessidades mapeadas e priorizadas para 2020 - Em andamento 100%

											<ul style="list-style-type: none"> -- Minuta da nova versão do PDTIC elaborada - Em andamento 80% -- Nova versão do PDTIC apreciada pelo CGovTIC - Nova 0% -- Nova versão do PDTIC publicada pela Presidência - Nova 0%
3	510	Elaboração do Plano Anual de Capacitação 2020	Jose Augusto	Suspense	Ação	23/10/2019	31/03/2020	25/11/2019		20	<p>Sem progresso no período.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Lista de documentos de referência Fechada 100% 2 Lista de cursos aprovados Em andamento 75% 3 Minuta da portaria do plano Nova 0% 4 Minuta do PAC Nova 0%

5. SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

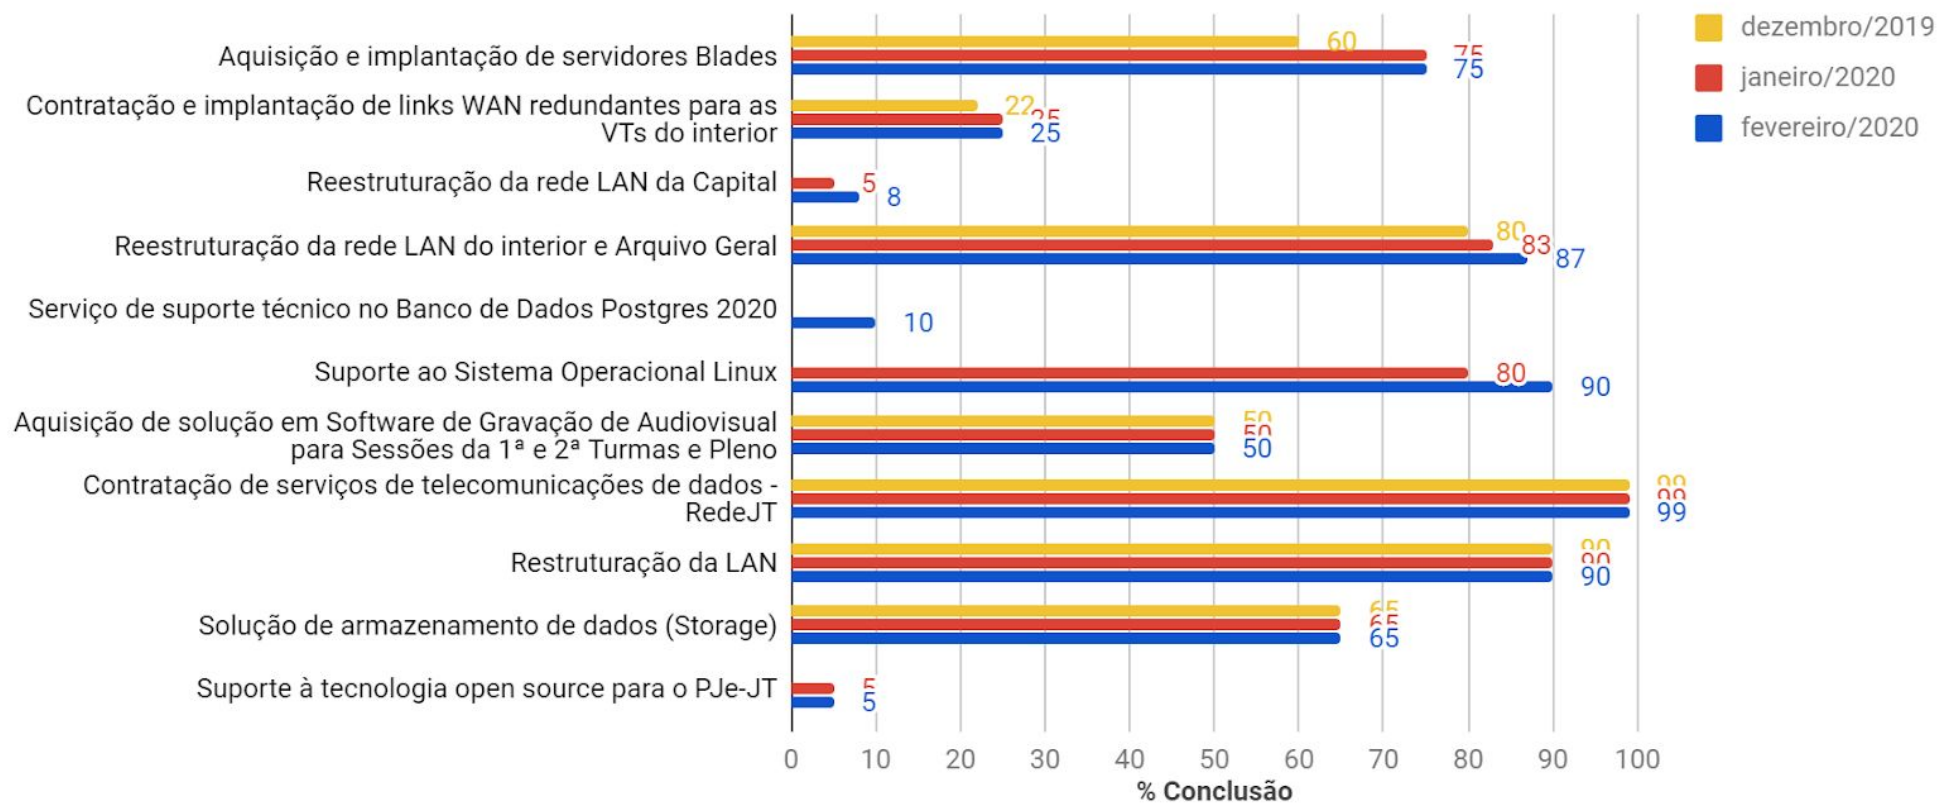


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	455	Aquisição e implantação de servidores Blades	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	Projeto	15/01/2019	19/06/2020	31/01/2019		75	<p>Chamados Técnicos foram abertos para troca de peças, 3 lâminas do tipo full apresentaram defeito na placa-mãe.</p> <p>Problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O equipamento apresentou defeitos físicos que foram sanados pela Contratadas, contudo, atrasará a criação do novo cluster de virtualização e a migração dos clusters antigos para o novo. - A homologação do equipamento identificou pontos de melhoria do hardware, a disponibilização dos equipamentos para o ambiente de produção sofrerá um atraso, a Contratada está auxiliando a equipe técnica do Tribunal no ajuste fino dos equipamentos (customização do hardware para maior performance, i.e., aplicação de boas práticas para o equipamento Synergy 12000. - A configuração e migração do ambiente virtualizado será planejada para segunda quinzena de fevereiro de ABRIL/2020 com prazo de término estipulado para JUNHO/2020, caso o ajuste fino do equipamento seja concluído em tempo hábil e a disponibilidade de recursos humanos seja respeitada;
2	461	Suporte ao Sistema Operacional Linux	Fernando Rola Ferreira Filho	Em andamento	Projeto	29/01/2019	31/03/2020	30/01/2019		90	- Finalizado o Pregão eletrônico 030/19 do TRT 5.
3	476	Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo Geral	Antoniél Magalhaes de Carvalho	Em andamento	Projeto	01/04/2019	30/06/2020	16/04/2019		87	Corrigido o WiFi (está funcionando a Rede Institucional) nas VTs de Bacabal (no momento apenas 1 dos 2 APs), Estreito, Pinheiro, Presidente Dutra e Santa Inês.

4	480	Contratação e implantação de links WAN redundantes para as VTs do interior	Rodrigo Silveira Alexandre	Em andamento	Projeto	15/04/2019	31/12/2020	08/03/2019		25	- Realizados ajustes nos anexos do edital conforme solicitação da CPL.
5	518	Reestruturação da rede LAN da Capital	Antoniél Magalhaes de Carvalho	Em andamento	Projeto	13/01/2020	02/11/2020	27/01/2020		8	Foi concluído o levantamento da interconexão e das portas dos switches do Bloco C. Além disso todos os switches desse Bloco foram trocados por HUAWEI, menos o do Setor de Infraestrutura. Levantamento das portas e alteração da topologia nas 7 VTs do Forum. Evolução dos entregáveis: - Switches do Bloco C Em andamento 50% - Switches do Bloco B Nova 0% - Switches do Bloco A Nova 0% - Switches do Forum Astolfo Serra Nova 0% - Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e Storages do FAS Nova 0% - Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e Storages Sede Nova 0% - Alteração dos IPs de Servidores Sede Nova 0%
6	523	Serviço de suporte técnico no Banco de Dados Postgres 2020	Fernando Rola Ferreira Filho	Em andamento	Ação	06/02/2020	31/05/2020	06/02/2020		10	- Formalização do início do projeto; - Formalização da equipe de planejamento;
7	233	Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspensão	Projeto	12/01/2018	28/02/2020	19/01/2018		99	Sem reporte do gerente de projeto (EGP-TIC).

8	358	Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno	Pablo Teofilo Durans	Suspenso	Projeto	06/07/2018	29/10/2020	22/10/2018		50	Sem reporte do gerente de projeto (EGP-TIC).
9	442	Restruturação da LAN	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspenso	Projeto	17/10/2018	30/04/2020	01/11/2018		90	Sem reporte do gerente de projeto (EGP-TIC).
10	490	Solução de armazenamento de dados (Storage)	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Suspenso	Projeto	18/06/2019	13/05/2020	18/06/2019		65	Primeiro treinamento de 2 da solução foi realizado em fevereiro. O segundo está agendado para março.
11	517	Suporte à tecnologia open source para o PJe-JT	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspenso	Projeto	09/12/2019	30/04/2020	09/12/2019		5	Sem progresso no período. Pendência: aguardando processo licitatório do TRT12.

6. SEÇÃO DE APOIO AO PJE

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

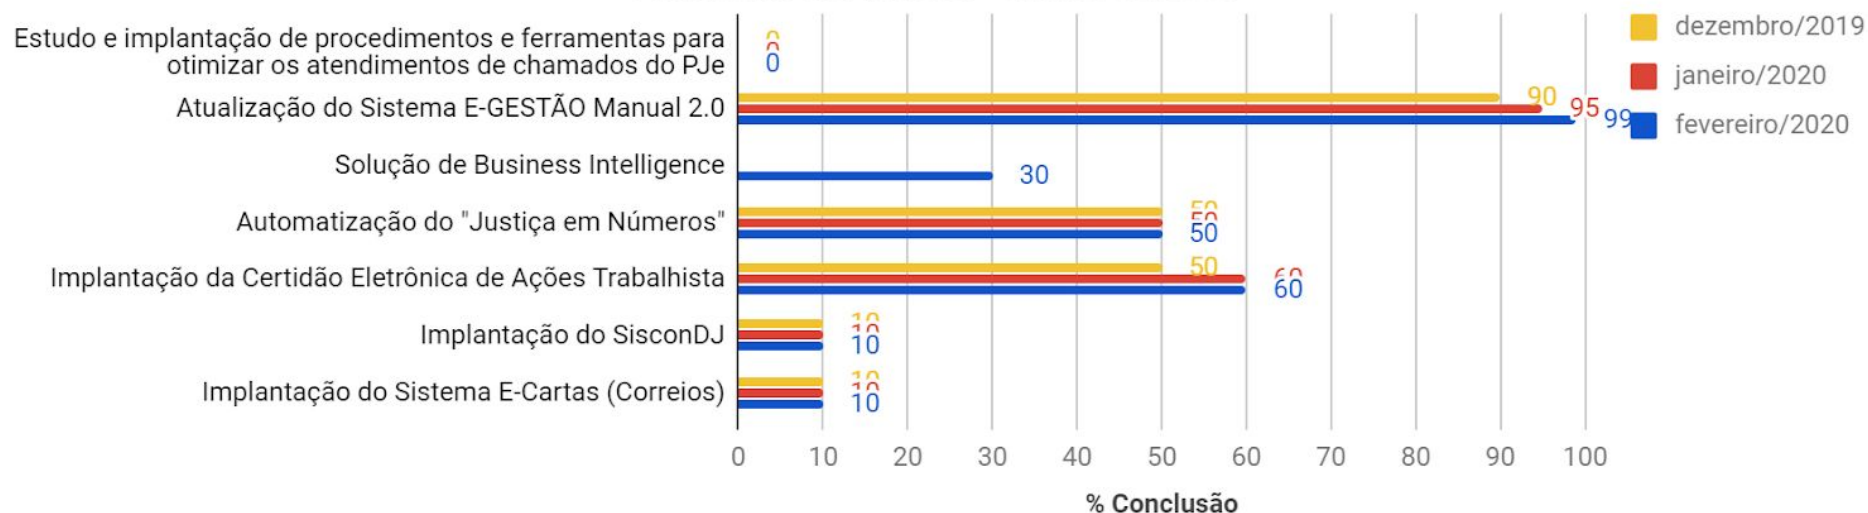


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	492	Estudo e implantação de procedimentos e ferramentas para otimizar os atendimentos de chamados do PJe	Gilberto Cunha Filho	A iniciar	Projeto	18/06/2019	31/03/2020			0	Sem progresso no período;
2	56	Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0	Djeison Rafael Neitzke	Em andamento	Projeto	06/04/2018	20/03/2020	06/04/2018		99	- Implantada a versão 2.5.4 do Extrator em PRODUÇÃO; - Geradas e reenviadas todas as remessas de 2019 e Jan-2020 com a nova versão do extrator;

3	524	Solução de Business Intelligence	Gutemberg Pereira Vidal Santos	Em andamento	Ação	12/02/2020	31/03/2020			30	- Elaboração do ETP; - Levantamento de custo de Licitação; - OFÍCIO CTIC-TRT16 N° 032 - 2020 - LANLINK - Solicitação de Interesse em Prorrogação Contratual BI a contratante solicitando "manifestação oficial sobre o interesse na prorrogação do contrato por período de 24 (vinte e quatro) meses.";
4	477	Implantação do SisconDJ	Gilberto Cunha Filho	Suspensão	Ação	05/12/2018	31/03/2020	01/04/2019		10	Sem progresso no período. Sem recurso humano de Infraestrutura para execução das tarefas de criação do ambiente de homologação/produção.
5	481	Automatização do "Justiça em Números"	Djeison Rafael Neitzke	Suspensão	Ação	23/04/2019	30/06/2020	19/06/2019		50	Sem progresso no período.
6	504	Implantação do Sistema E-Cartas (Correios)	Gutemberg Pereira Vidal Santos	Suspensão	Ação	10/09/2019	30/03/2020	01/11/2019		10	- Sem progresso no período. Verificou-se que há um projeto nacional sendo desenvolvido pelo CSJT com o mesmo escopo desse projeto. Com isso, há o provável conflito com a Resolução 242/2019 do CSJT, podendo o Regional sofrer as penalidades previstas na resolução, em especial a do art. 5º da mesma; - Elaborado o TEF recomendando o encerramento do projeto. Aguardando a manifestação do demandante.
7	506	Implantação da Certidão Eletrônica de Ações Trabalhista	Gutemberg Pereira Vidal Santos	Suspensão	Ação	27/09/2018	31/03/2020	14/10/2019		60	Sem progresso no período.

7. SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

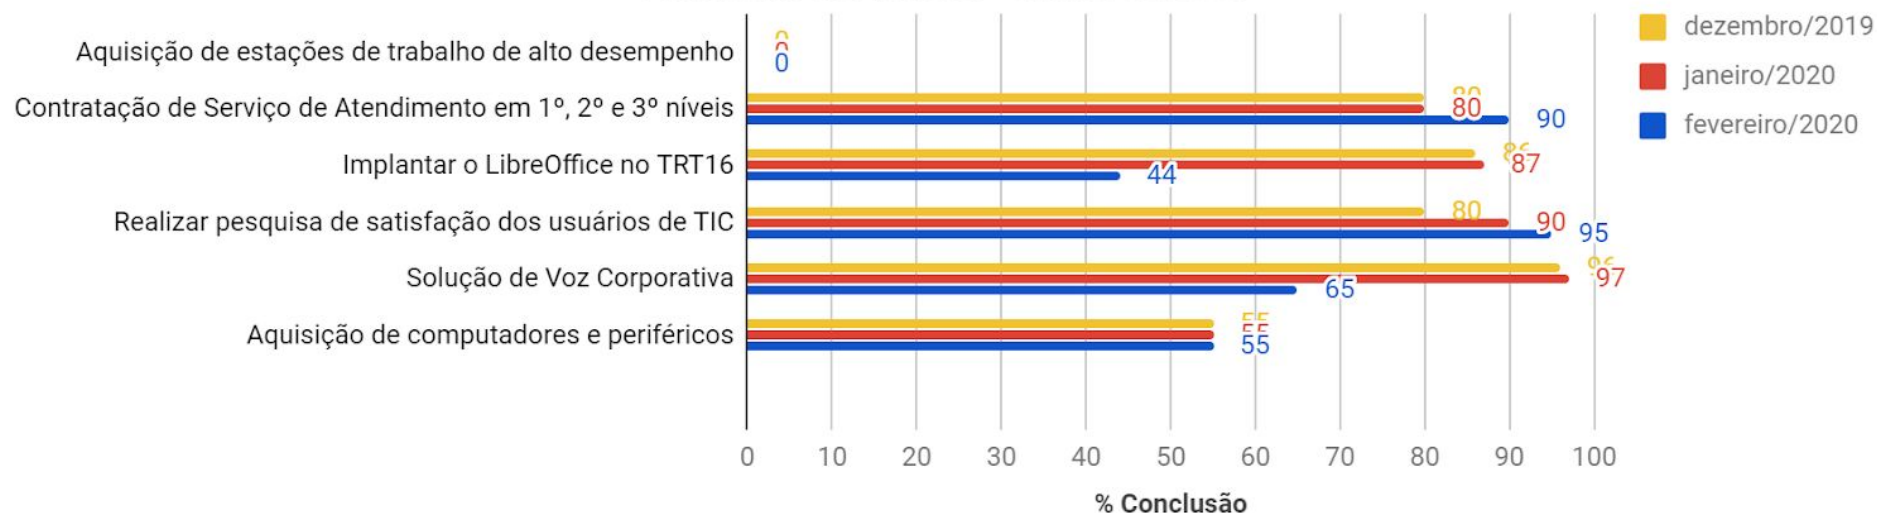


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	516	Aquisição de estações de trabalho de alto desempenho	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Cancelado	Projeto	11/12/2019	13/02/2020	11/12/2019	13/02/2020	0	O projeto foi cancelado por falta de previsão orçamentária, conforme Termo de Encerramento do Projeto.

2	351	Implantar o LibreOffice no TRT16	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	25/06/2018	30/04/2020	25/06/2018		44	<p>Projeto reajustado conforme entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalação do Libre Office (51% do Projeto); - Desinstalação do suite Office (25,5% do Projeto); - Campanha de notificação (23,5% do Projeto); <p>Estatística Instalação</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 VT de Imperatriz 100,00% 2 VT de Imperatriz 94,74% Distribuição do FMAMR 100,00% VT de Açailândia 100,00% VT de Bacabal 17,65% VT de Balsas 100,00% VT de Barra do Corda 93,75% VT de Barreirinhas 92,86% VT de Caxias 100,00% VT de Chapadinha 86,67% VT de Estreito 100,00% VT de Pedreiras 33,33% VT de Pinheiro 94,12% VT de Presidente Dutra 80,00% VT de Santa Inês 100,00% VT de São João dos Patos 66,67% VT de Timon 100,00% SLZ 0,00% FAS 0,00% Taxa Geral 85,87% <p>Estatística Desinstalação</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 VT de Imperatriz 0,00% 2 VT de Imperatriz 0,00% Distribuição do FMAMR 0,00% VT de Açailândia 0,00% VT de Bacabal 0,00% VT de Balsas 0,00% VT de Barra do Corda 0,00% VT de Barreirinhas 0,00% VT de Caxias 0,00% VT de Chapadinha 0,00% VT de Estreito 0,00% VT de Pedreiras 0,00%
---	-----	----------------------------------	--------------------------------	---------------------	---------	------------	------------	------------	--	----	--

											<p>VT de Pinheiro 0,00%</p> <p>VT de Presidente Dutra 0,00%</p> <p>VT de Santa Inês 0,00%</p> <p>VT de São João dos Patos 0,00%</p> <p>VT de Timon 0,00%</p> <p>SLZ 0,00%</p> <p>FAS 0,00%</p> <p>Taxa Geral 0,00%</p>
3	381	Solução de Voz Corporativa	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	27/08/2018	30/05/2020	31/08/2018		65	<p>- Realizado vistoria técnica da sala de telefonia e levantado os requisitos de infraestrutura necessários para a implantação da solução, que foram encaminhados ao setor de infraestrutura.</p> <p>- Ajustado o % de conclusão do projeto, visto que o anterior continha apenas tarefas do processo de contratação, superestimando o valor. O PGP será alterado para contemplar as tarefas de implantação e o percentual de conclusão foi ajustado para 65%, 60% referente ao processo de contratação já concluído e 5% referente às atividades iniciais do processo de implantação.</p> <p>Pendências:</p> <p>- A vistoria técnica detectou a necessidade de alguns materiais para a adequação da sala de telefonia, dos quais alguns o TRT16 ainda precisa adquirir. No cenário atual de corte de despesas esse ponto pode ser um entrave ao projeto.</p> <p>- O setor de Infraestrutura continua sobrecarregado e com dificuldades para entregar todos os itens solicitados.</p> <p>- O servidor responsável pelo projeto e detentor do conhecimento técnico relacionado foi desligado do TRT16, o que deve causar dificuldades no processo de implantação da solução.</p>
4	391	Contratação de Serviço de Atendimento em 1º, 2º e 3º níveis	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	19/09/2018	30/04/2020	21/09/2018		90	<p>- ETP concluído apontando para a renovação do contrato atual. Enviado para a Diretoria-Geral.</p>

5	508	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Ação	17/10/2019	12/03/2020	25/10/2019		95	- Finalizado o relatório da pesquisa que será publicado no início de março, quando o projeto será finalizado.
6	500	Aquisição de computadores e periféricos	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Suspenso	Projeto	05/08/2019	31/03/2020	05/08/2019		55	Sem progresso no período. Risco efetivado: não há orçamento previsto para essa demanda. O projeto será encerrado e, em surgindo previsão orçamentária, as aquisições se realizarão por meio de ações pontuais.

8. SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

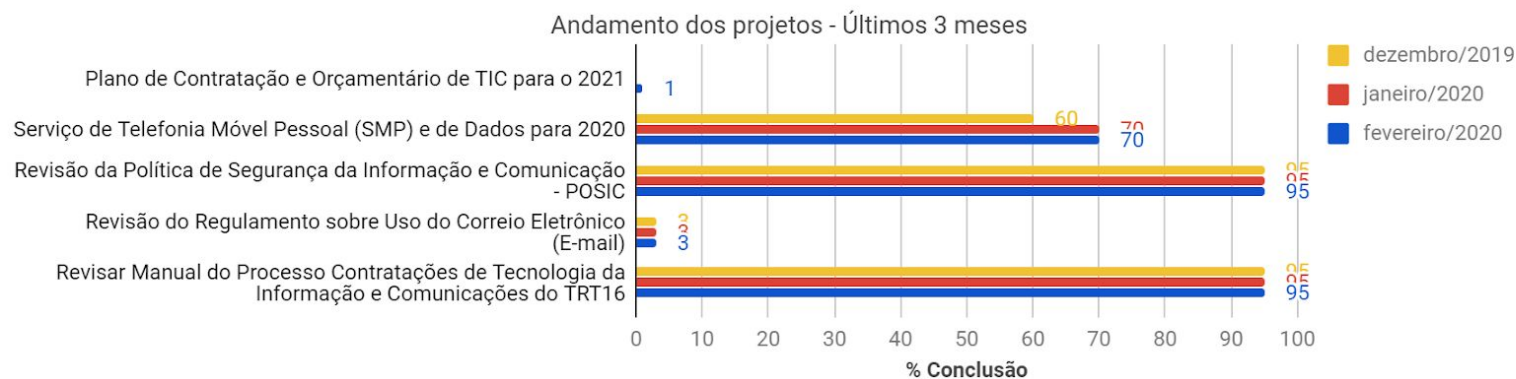

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	457	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2020	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	22/01/2019	31/03/2020	15/03/2019		70	Elaborado a minuta do Edital.
2	525	Plano de Contratação e Orçamentário de TIC para o 2021	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Ação	18/02/2020	30/09/2020			1	Início da coleta de informações para as contratações previstas para o ano de 2021.
3	147	Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	09/05/2017	29/05/2020	09/05/2019		95	Sem progresso no período. Pedido de vista regimental pela Desembargadora Ilka Esdra Silva Araújo.
4	168	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	28/06/2017	29/05/2020	28/06/2017		95	Sem progresso no período. Pedido de vista regimental pelos Desembargadores James Magno Araújo Farias e Ilka Esdra Silva Araújo.
5	475	Revisão do Regulamento sobre Uso do Correio Eletrônico (E-mail)	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	05/04/2019	31/07/2020	26/04/2019		3	Sem progresso no período.
