



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 16ª REGIÃO


Portfólio de Projetos de TIC

Junho/2019

Sumário

1.	RESUMO DOS PROJETOS	3
1.1.	PROJETOS INICIADOS NO PERÍODO	4
1.2.	PROJETOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO	4
1.3.	PROJETOS CANCELADOS NO PERÍODO	4
2.	COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES	5
3.	SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	6
4.	SETOR DE GOVERNANÇA DE TI	9
5.	SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL	11
6.	SEÇÃO DE APOIO AO PJE	13
7.	SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE	15
8.	SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	16

1. Resumo dos projetos

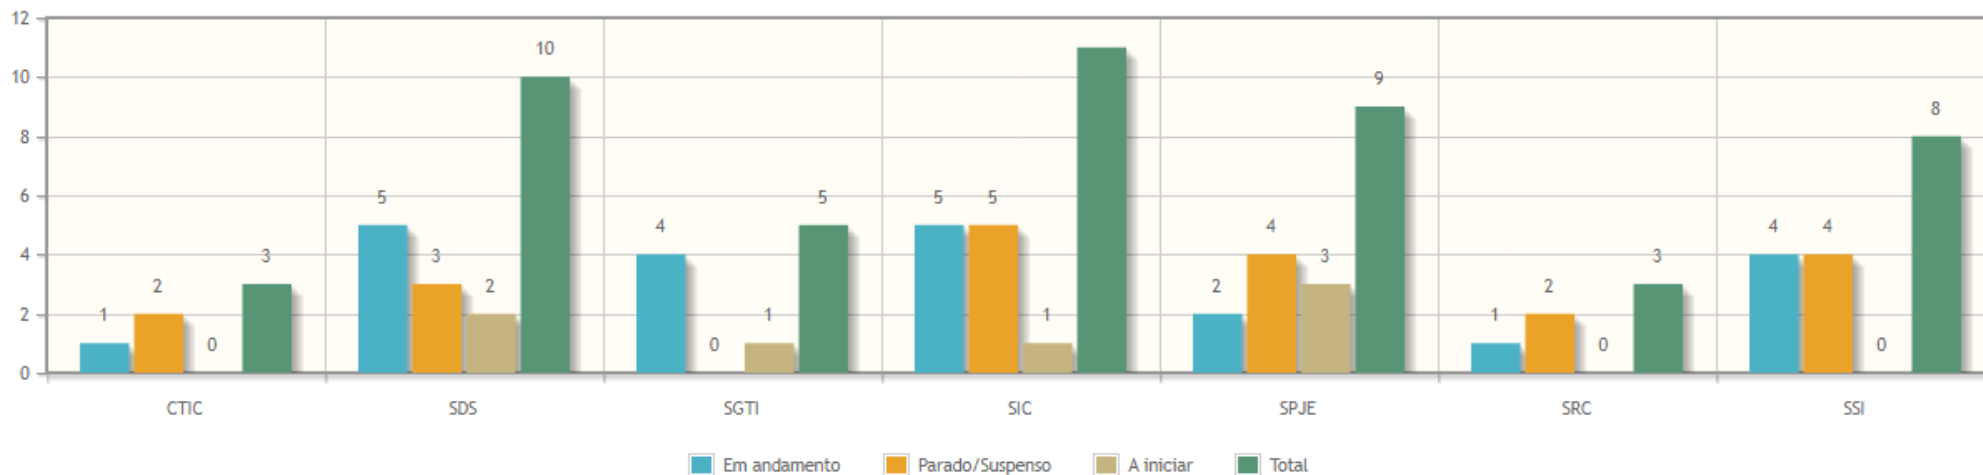

1.1. Projetos iniciados no período

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
490	Solução de armazenamento de dados (Storage)	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	SIC	Contratação	18/06/2019	18/06/2019		Em andamento
481	Automatização do "Justiça em Números"	Djeison Rafael Neitzke	SPJE	Ação	23/04/2019	19/06/2019		Em andamento


1.2. Projetos concluídos no período

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
463	Serviço de suporte técnico no Banco de Dados Postgres	Romulo Moura	SPJE	Contratação	10/01/2019	29/01/2019	06/06/2019	Concluído
472	Curso em Gestão de Riscos de TI - NBR 31000 e NBR 27005	Stanley Araujo de Sousa	SSI	Ação	14/03/2019	27/03/2019	06/06/2019	Concluído
484	Revisar o Processo de Software	Rafael Robinson de Sousa Neto	SGTI	Ação	26/04/2019	26/04/2019	18/06/2019	Concluído
479	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do PABX	Carlos Eduardo Ferreira Marins	SRC	Contratação	23/04/2019	24/04/2019	27/06/2019	Concluído
39	Regulamentação serviço extraordinário e sobreaviso de TIC	Stanley Araujo de Sousa	SSI	Ação	27/04/2018	17/05/2018	28/06/2019	Concluído

1.3. Projetos cancelados no período


2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

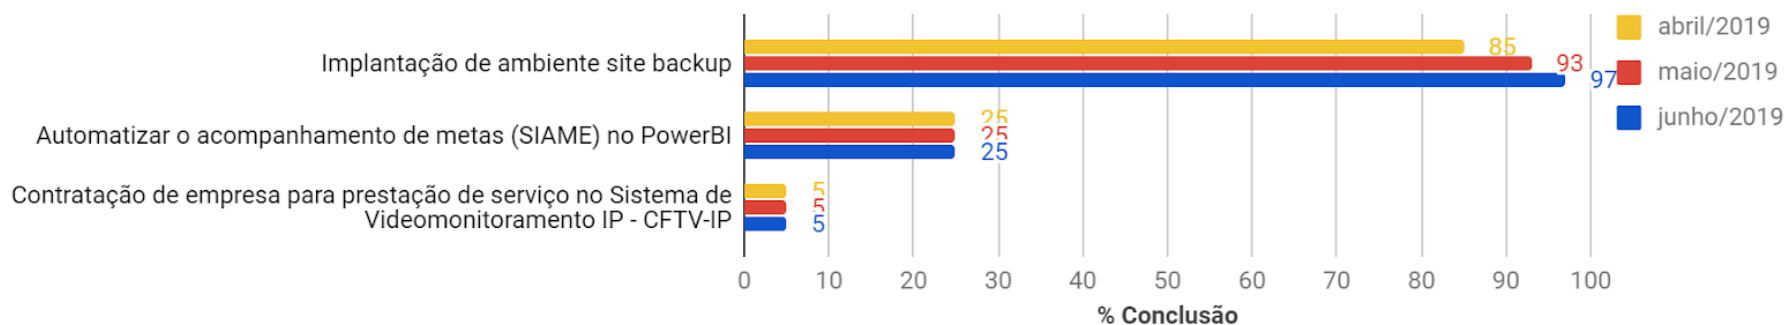

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	221	Implantação de ambiente site backup	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Em andamento	Projeto	30/11/2017	31/07/2019			97	Datacenter entregue. Falta a realização do recebimento definitivo a ser realizado por comissão nomeada pela Diretoria Geral.
2	246	Contratação de empresa para prestação de serviço no Sistema de Videomonitoramento IP - CFTV-IP	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Suspensão	Contratação	16/02/2018	20/09/2019			5	Sem progresso no período.
3	378	Automatizar o acompanhamento de metas (SIAME) no PowerBI	David Tedson Mendonca Ferreira	Suspensão	Ação	23/08/2018	30/08/2019			25	Sem reporte do Gerente do Projeto. (EGP-TIC)

3. Setor de Desenvolvimento de Sistemas

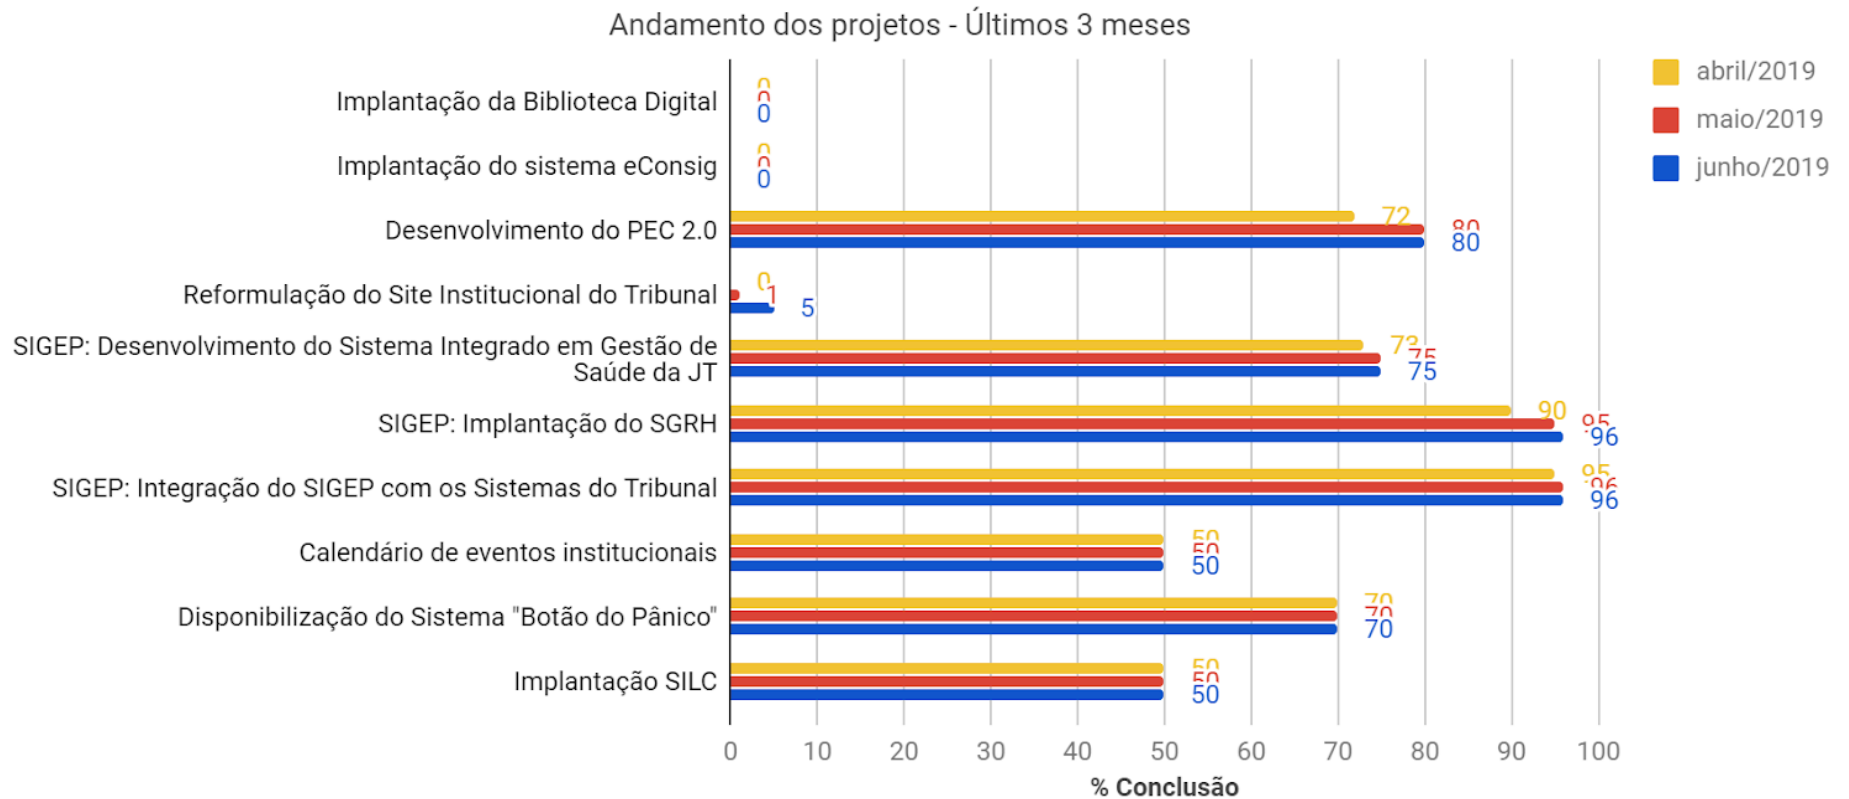

Portfólio de Projetos de TIC - Junho/2019


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	224	Implantação do sistema eConsig	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	06/12/2017	30/08/2019			0	Sem progresso no período. Aguardando a celebração do contrato de comodato com a Zetrasoft pelo Setor de Folha de Pagamento para o início do projeto. O FolhaWeb já entrou em produção, não havendo mais impedimentos para o projeto.
2	279	Implantação da Biblioteca Digital	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	01/01/2018	18/12/2020			0	Sem progressos no período. Projeto previsto para execução em 2020 de acordo com o PDTIC 2019/2020.
3	32	SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	24/05/2018	30/08/2019			96	- Criação de script de migração da Agenda Odontológica para o SIGS; - Testes de transição no sistema de Prontuário Eletrônico; - Correção de erros em views do schema de transição: SETOR e SERVIDOR; - Verificação da lista de objetos que ficaram inválidos após retirar os grants de execute do schema RH legado;
4	187	SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	Diogo Duailibe da Silva	Em andamento	Projeto	25/08/2017	01/12/2020			75	Alteração da Auditoria para abarcar as necessidades do TRT5. Reuniões de homologação com o TRT2, onde os mesmos detectaram algumas possíveis mudanças/melhorias.
5	277	SIGEP: Implantação do SGRH	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	01/01/2018	31/08/2019			96	- Em fase de homologação com a execução dos sistemas de FolhaWeb e SGRH em paralelo com os sistema de Rh e Folha legados; - Resolução de 93 chamados (via Assyst), 61 de SGRH e 32 de FolhaWeb.

Portfólio de Projetos de TIC - Junho/2019

6	280	Reformulação do Site Institucional do Tribunal	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	01/01/2018	27/12/2019	29/05/2019		5	<ul style="list-style-type: none"> - TAP aprovado e projeto iniciado; - Concluídas as tratativas para a vinda de um servidor do TRT8 (PA 4367/2019) para atuar como consultor técnico na primeira semana de julho/2019; - Realizado o mapeamento de menus e páginas do portal atual e do portal novo, para subsidiar a medição do trabalho a ser feito; - Realizada reunião com a ASCOM para apresentação do planejamento do projeto (ata anexa) na qual foi feita a sugestão de suspensão das alterações no site atual enquanto durar o desenvolvimento do novo portal.
7	354	Desenvolvimento do PEC 2.0	Ronny Paterson Cruz da Silva	Em andamento	Projeto	03/07/2018	23/12/2019			80	<p>Progresso no desenvolvimento das demandas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PJEKZ-16093 de 50% para 80%; - PJEKZ-16045 de 50% para 80%; - PJEKZ-14571 de 50% para 80%; - PJEKZ-14334 de 50% para 80%; - PJEKZ-14333 de 50% para 80%; - PJEKZ-14332 de 50% para 80%.
8	19	Implantação SILC	Andre Pereira Nunes	Suspensão	Projeto	06/02/2018	31/07/2020			50	Sem progressos no período. Projeto postergado para execução em 2020 conforme PDTIC. (EGP-TIC)
9	223	Calendário de eventos institucionais	Andre Pereira Nunes	Suspensão	Projeto	06/12/2017	30/06/2020			50	Sem progresso no período.
10	446	Disponibilização do Sistema "Botão do Pânico"	Darlon José Coqueiro	Suspensão	Projeto	13/11/2018	15/08/2019			70	Sem progressos no período. Pendência de atendimento do chamado S40061 pela SIC para prosseguimento.

4. Setor de Governança de TI

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

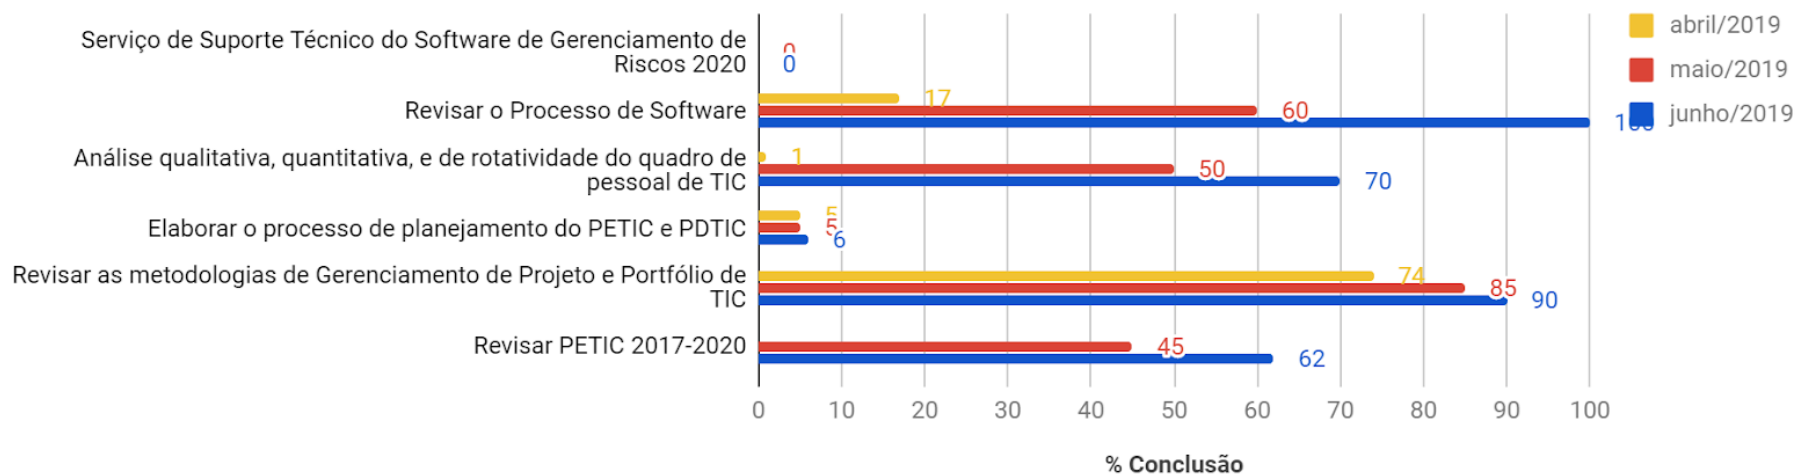


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	483	Serviço de Suporte Técnico do Software de Gerenciamento de Riscos 2020	Jose Augusto	A iniciar	Projeto	25/04/2019	31/12/2019			0	Sem progresso no período. Aguardando a definição da necessidade de contratação.
2	484	Revisar o Processo de Software	Rafael Robinson de Sousa Neto	Concluído	Ação	26/04/2019	18/06/2019	26/04/2019	18/06/2019	100	Projeto concluído com êxito com a publicação do Ato Regulamentar GP Nº 03/2019, que instituiu a Política de Gerenciamento de Software, e o Processo de trabalho do Gerenciamento de Software.

Portfólio de Projetos de TIC - Junho/2019

3	372	Elaborar o processo de planejamento do PETIC e PDTIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Projeto	10/08/2018	30/08/2019			6	- Iniciado o novo planejamento do projeto; - Iniciado levantamento de materiais de referência para a elaboração dos artefatos do processo.
4	392	Revisar as metodologias de Gerenciamento de Projeto e Portfólio de TIC	Maickel Roberto Neitzke	Em andamento	Projeto	24/09/2018	31/07/2019			90	- Finalizado os processos de Gerenciamento de Demandas e de Portfólio. - Publicado os Atos Regulamentares 04 05 e 06 de 2019, que regulamentam as políticas de gerenciamento de demandas, portfólio e projetos.
5	482	Análise qualitativa, quantitativa, e de rotatividade do quadro de pessoal de TIC	Jose Augusto	Em andamento	Projeto	24/04/2019	16/08/2019	29/04/2019		70	- Montagem das planilhas referentes a força de trabalho e referentes a rotatividade; - Finalização da Força de trabalho no relatório e do módulo de rotatividade;
6	486	Revisar PETIC 2017-2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Ação	13/05/2019	19/07/2019	14/05/2019		62	- Finalização do novo mapa estratégico; - Definição dos indicadores estratégicos; - Elaboração da minuta preliminar da nova versão do Plano Estratégico de TIC .

5. Setor de Infraestrutura Computacional

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

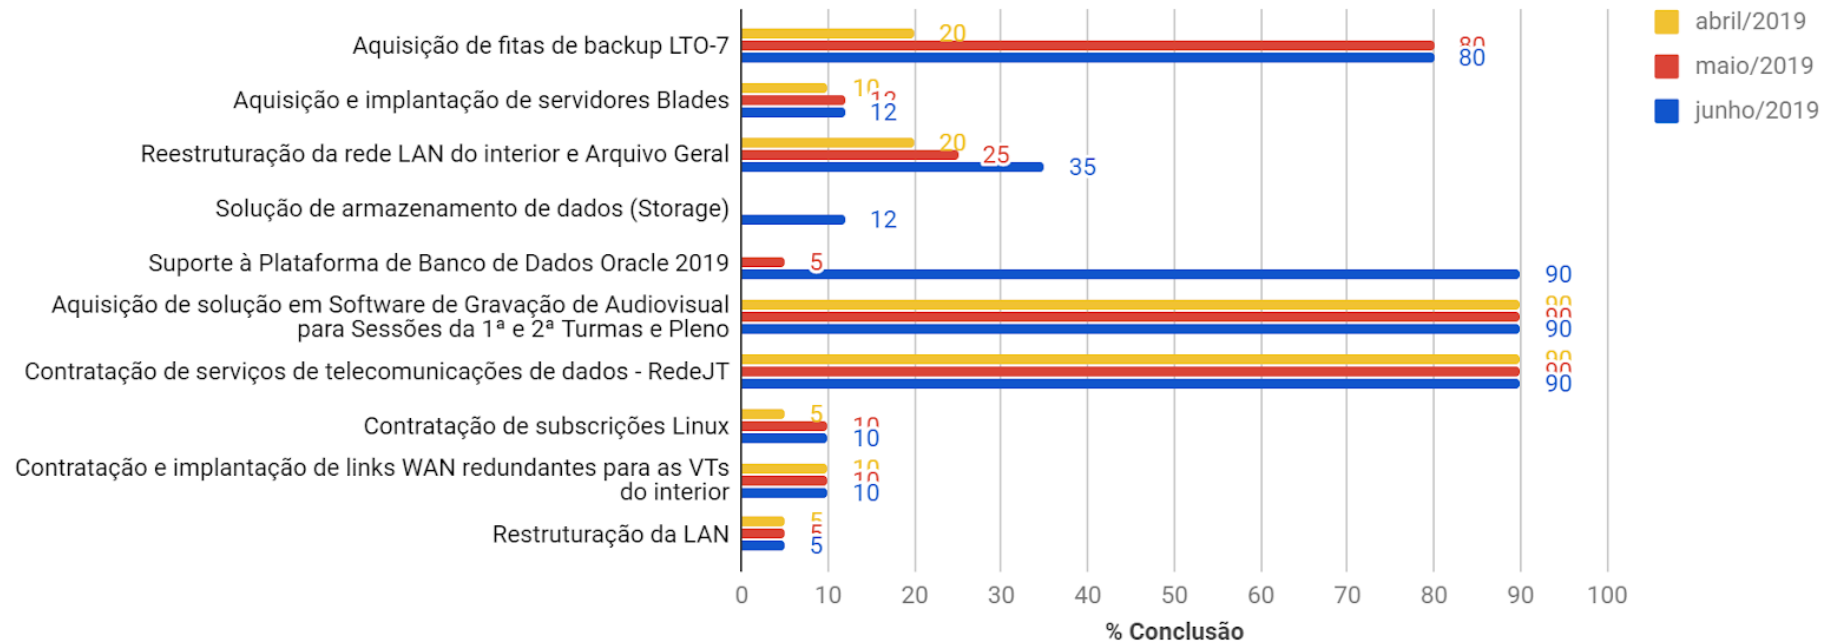

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	455	Aquisição e implantação de servidores Blades	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	Projeto	15/01/2019	31/12/2019	31/01/2019		12	- Minutas de contrato 20 e 21/2019 revisadas; - DDO retificado a pedido do CSJT; - Nota de crédito emitida; - Notas de empenho emitidas; - Parecer Jurídico do NAj emitido no dia 26/06/19, com ressalvas;


Portfólio de Projetos de TIC - Junho/2019

2	460	Aquisição de fitas de backup LTO-7	Aured de Freitas Costa Rodrigues	Em andamento	Projeto	29/01/2019	30/07/2019	30/01/2019		80	Sem progresso no período. Publicada em 27/06 a ARP assinada pelo TRT18 e fornecedores.
3	476	Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo Geral	Antonieli Magalhaes de Carvalho	Em andamento	Projeto	01/04/2019	07/09/2019	16/04/2019		35	- Reestruturação da rede LAN da VT de Caxias e Timon; - WiFi em Caxias em funcionamento.
4	485	Suporte à Plataforma de Banco de Dados Oracle 2019	Leonel Pereira	Em andamento	Contratação	02/05/2019	27/10/2019	17/05/2019		90	O Estudo Técnico Preliminar elaborado e encaminhado à CTIC.
5	490	Solução de armazenamento de dados (Storage)	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	Contratação	18/06/2019	31/12/2019	18/06/2019		12	- TAP elaborado e aprovado no dia 18/06/19; - Instituição da Equipe de Planejamento da Contratação, 27/06/19 - Portaria DG nº 393/2019; - Estudo Técnico Preliminar - Justificativa do TRT16 finalizado no dia 27/06/19; - Assinatura da Intenção de Registro de Preço pelo Ordenador de Despesas no dia 28/06/19;
6	233	Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT	Danilo Augusto Alves Leite	Suspensão	Contratação	12/01/2018	28/06/2019			90	Sem reporte do Gerente do Projeto. (EGP-TIC)
7	358	Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno	Pablo Teofilo Durans	Suspensão	Contratação	06/07/2018	31/07/2019			90	Sem reporte do Gerente do Projeto. (EGP-TIC)
8	442	Restruturação da LAN	Danilo Augusto Alves Leite	Suspensão	Projeto	17/10/2018	30/06/2019			5	Sem reporte do Gerente do Projeto. (EGP-TIC)
9	461	Contratação de subscrições Linux	Fernando Rola Ferreira Filho	Suspensão	Projeto	29/01/2019	31/08/2019	30/01/2019		10	Sem reporte do Gerente do Projeto. (EGP-TIC)

10	480	Contratação e implantação de links WAN redundantes para as VTs do interior	Danilo Augusto Alves Leite	Suspensão	Contratação	15/04/2019	15/07/2020	08/03/2019		10	Sem reporte do Gerente do Projeto. (EGP-TIC)
----	-----	--	----------------------------	-----------	-------------	------------	------------	------------	--	----	--

6. Seção de Apoio ao PJe

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

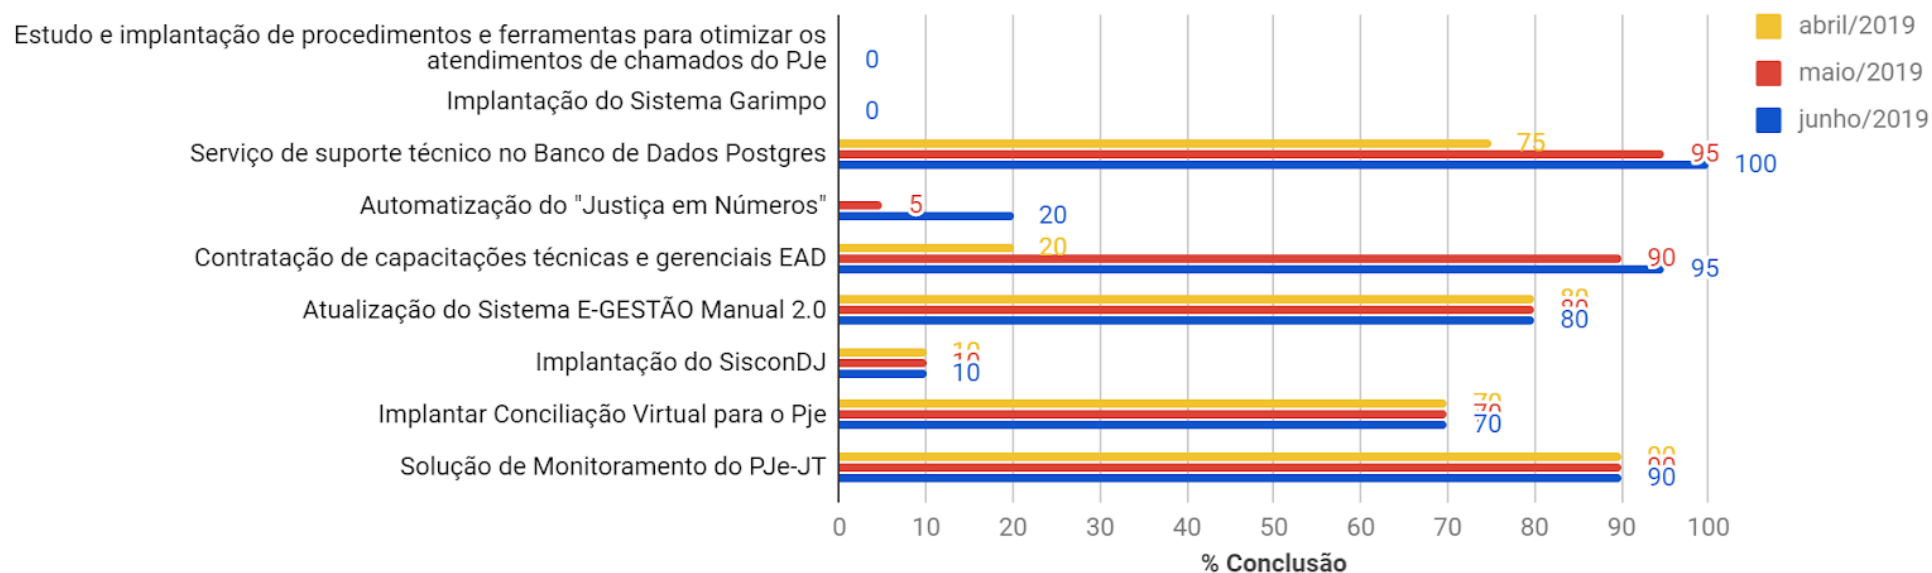


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	489	Implantação do Sistema Garimpo	Gilberto Cunha Filho	A iniciar	Projeto	05/06/2019	31/12/2019			0	Projeto a iniciar. Aguardando o CSJT validar o projeto antes dos regionais implantar.

Portfólio de Projetos de TIC - Junho/2019

2	492	Estudo e implantação de procedimentos e ferramentas para otimizar os atendimentos de chamados do PJe	Gilberto Cunha Filho	A iniciar	Projeto	18/06/2019	30/08/2019				0	Projeto não iniciado.
3	463	Serviço de suporte técnico no Banco de Dados Postgres	Romulo Moura	Concluído	Contratação	10/01/2019	07/06/2019	29/01/2019	06/06/2019		100	Projeto concluído com o aditivo nº 04 ao contrato nº 04/2016 assinado.
4	474	Contratação de capacitações técnicas e gerenciais EAD	Gilberto Cunha Filho	Em andamento	Capacitação	28/03/2019	28/06/2019	29/03/2019			95	- Liberado o acesso aos passaportes; - Nota fiscal emitida. Aguardando a realização do pagamento para encerrar formalmente o projeto.
5	481	Automatização do "Justiça em Números"	Djeison Rafael Neitzke	Em andamento	Ação	23/04/2019	25/08/2019	19/06/2019			20	- Projeto iniciado e definido novo gerente; - 3 reuniões de alinhamento de requisitos; - Planejamento e registro das tarefas realizadas e pendentes; - Relatório sobre investigação de assuntos considerados inválidos pelo CNJ, e possíveis soluções; - Criação de máquina virtual onde o sistema será implantado; - Criação de objetos de banco (views) a ser utilizadas na geração do xml referente aos sistemas legados;
6	56	Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0	Gilberto Cunha Filho	Suspenso	Projeto	06/04/2018	31/12/2019				80	Sem progresso no período.
7	175	Implantar Conciliação Virtual para o Pje	Gilberto Cunha Filho	Suspenso	Projeto	20/07/2017	31/07/2019				70	Sem progresso no período.
8	353	Solução de Monitoramento do PJe-JT	Romulo Moura	Suspenso	Contratação	21/06/2018	31/07/2019				90	Sem progresso no período.
9	477	Implantação do SiconDJ	Gilberto Cunha Filho	Suspenso	Ação	05/12/2018	08/07/2019				10	Sem progresso no período. Pendência de recursos humanos da SIC.

7. Setor de Relacionamento com o Cliente

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

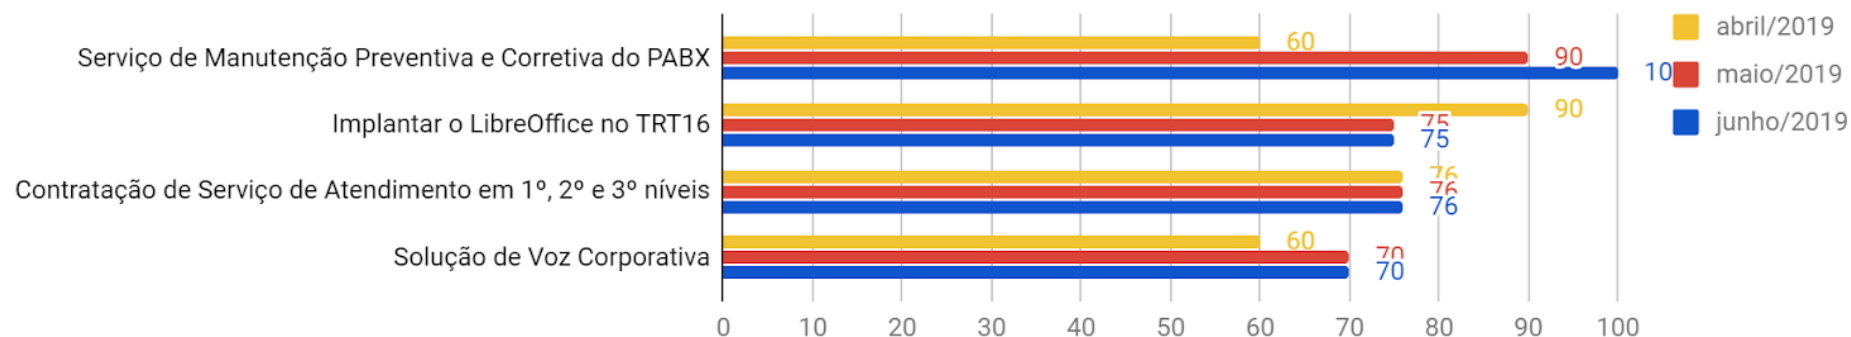


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	479	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do PABX	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Concluído	Contratação	23/04/2019	01/07/2019	24/04/2019	27/06/2019	100	Projeto concluído. Aditivo assinado pelas partes em 24/06/2019.
2	351	Implantar o LibreOffice no TRT16	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	25/06/2018	30/08/2019			75	Instalações do Libre Office no Interior do Estado através da aplicação de GPOs. Localidades Porcentual Instalado Balsas 81,82% Açailandia 76,92% Estreito 52,94% Pinheiro 29,41% SJD* 0,00% Santa Inês 18,75% Caxias 62,50% Timon 50,00%
3	381	Solução de Voz Corporativa	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Suspensão	Contratação	27/08/2018	30/08/2019			70	Sem progresso no período. Realizado pequenos ajustes no ETP e TR. Ainda aguarda-se o retorno das empresas para concluir o ETP.

4	391	Contratação de Serviço de Atendimento em 1º, 2º e 3º níveis	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Suspensão	Contratação	19/09/2018	20/12/2019			76	Sem progresso no período. Em reunião do CGesTIC realizada no dia 28/06, foi definido pela não inclusão do suporte de 3º nível no projeto. Alterado a previsão de fim para 20/12.
---	-----	---	--------------------------------	-----------	-------------	------------	------------	--	--	----	--

8. Seção de Segurança da Informação

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

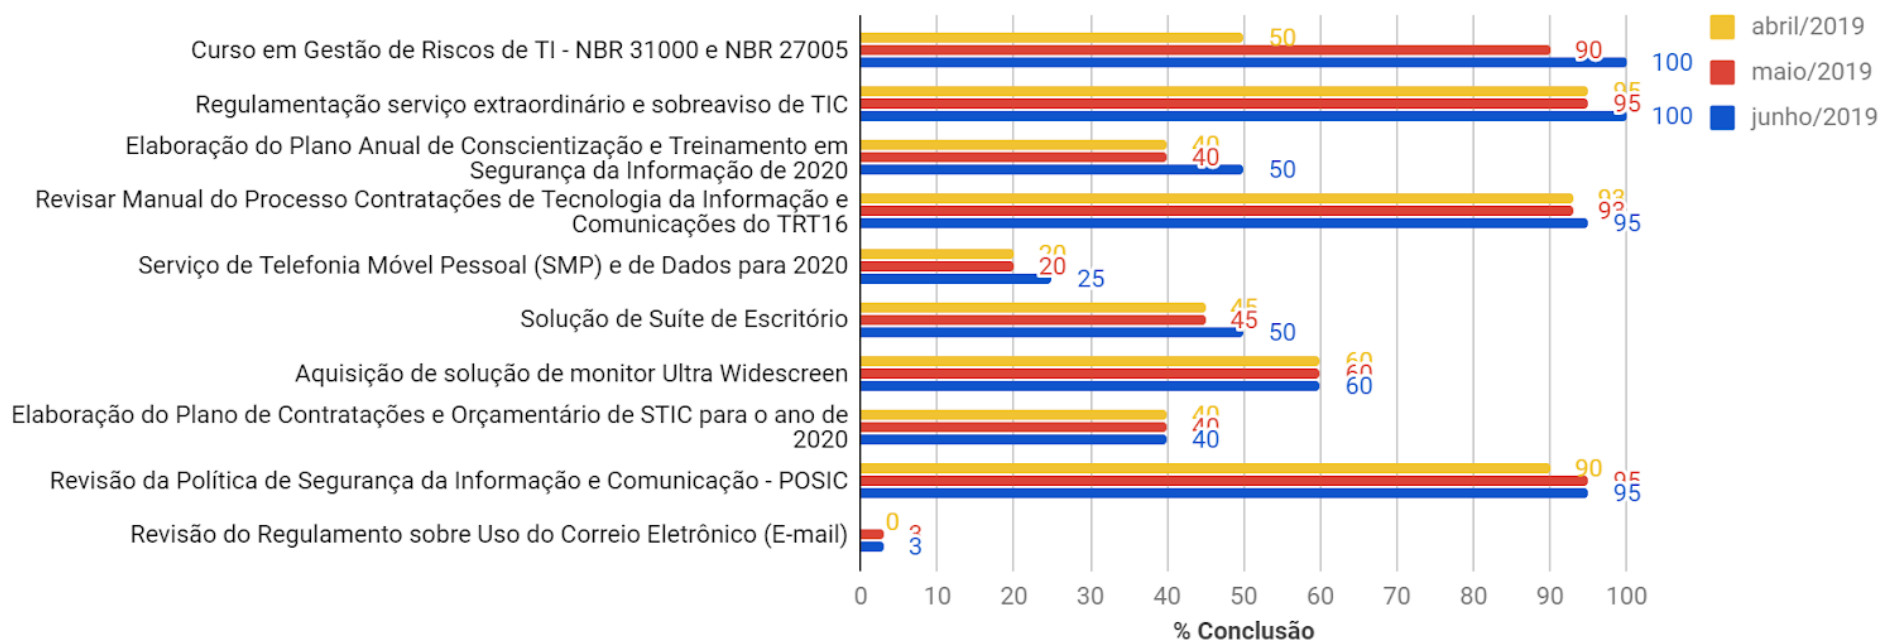

Portfólio de Projetos de TIC - Junho/2019

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	39	Regulamentação serviço extraordinário e sobreaviso de TIC	Stanley Araujo de Sousa	Concluído	Ação	27/04/2018	28/06/2019	17/05/2018	28/06/2019	100	Projeto concluído. Publicado Ato Regulamentar nº 08/2019.
2	472	Curso em Gestão de Riscos de TI - NBR 31000 e NBR 27005	Stanley Araujo de Sousa	Concluído	Ação	14/03/2019	06/06/2019	27/03/2019	06/06/2019	100	Projeto concluído.
3	147	Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	09/05/2017	15/08/2019			95	- Adequações sugeridas pela DG; - Aprovação pela DG e SADM. Despacho da Presidência encaminhado a Sec. do Pleno.
4	450	Solução de Suíte de Escritório	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Contratação	21/11/2018	31/10/2019			50	Melhorias no ETP e no TR. Atualização da pesquisa de preço.
5	457	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2020	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Contratação	22/01/2019	27/03/2020	15/03/2019		25	Propostas apresentadas ao Comitê de Governança, na 4ª Reunião de 2019, que decidiu, item 7.15, "...sobrestar a decisão sobre a escolha do modelo até a definição da equipe de transição, para que a deliberação pelo modelo mais adequado seja compartilhada com a nova administração".
6	473	Elaboração do Plano Anual de Conscientização e Treinamento em Segurança da Informação de 2020	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	01/04/2019	31/10/2019	08/04/2019		50	Minuta do plano elaborado.
7	168	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	28/06/2017	31/07/2019			95	Sem progresso no período.

Portfólio de Projetos de TIC - Junho/2019

8	375	Aquisição de solução de monitor Ultra Widescreen	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Contratação	27/08/2018	30/09/2019			60	Sem progresso no período. Licitação conduzida pela CSJT. Nesse cenário, a influência da CTIC no processo de contratação é quase inexistente.
9	454	Elaboração do Plano de Contratações e Orçamentário de STIC para o ano de 2020	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	04/01/2019	31/10/2019	04/01/2019		40	Sem progresso no período.
10	475	Revisão do Regulamento sobre Uso do Correio Eletrônico (E-mail)	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	05/04/2019	30/09/2019			3	Sem progresso no período.
