



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 16ª REGIÃO


Portfólio de Projetos de TIC

Maio/2019

Sumário

| | |
|---|----|
| 1. RESUMO DOS PROJETOS | 3 |
| 2. COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES | 5 |
| 3. SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 7 |
| 4. SETOR DE GOVERNANÇA DE TI | 10 |
| 5. SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL | 13 |
| 6. SEÇÃO DE APOIO AO PJE | 15 |
| 7. SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE | 17 |
| 8. SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 19 |

1. Resumo dos projetos

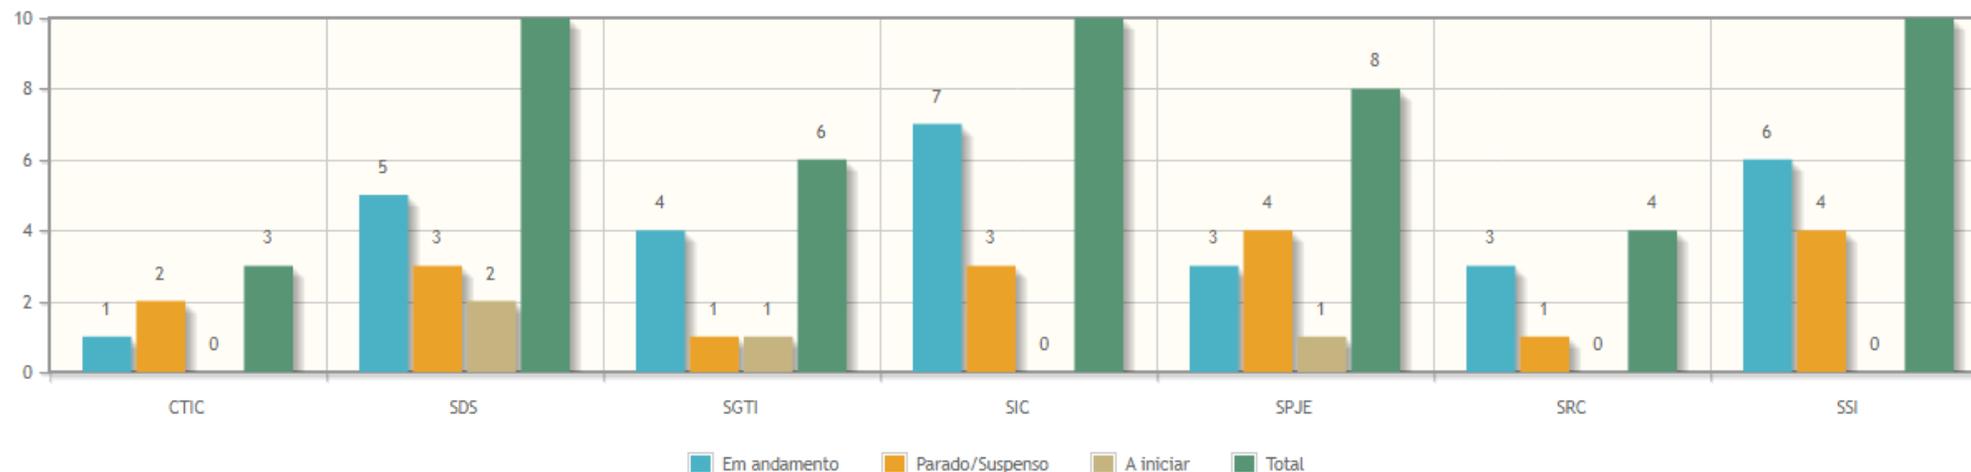

1.1. Projetos iniciados no período

| Id | Nome | Gerente do projeto | Unidade responsável | Tipo | Data da demanda | Início realizado | Fim realizado | Status |
|-----|--|-------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|
| 280 | Reformulação do Site Institucional do Tribunal | Andre Pereira Nunes | SDS | Projeto | 01/01/2018 | 29/05/2019 | | Em andamento |
| 485 | Suporte à Plataforma de Banco de Dados Oracle 2019 | Leonel Pereira | SIC | Contratação | 02/05/2019 | 17/05/2019 | | Em andamento |
| 486 | Revisar PETIC 2017-2020 | Rafael Robinson de Sousa Neto | SGTI | Ação | 13/05/2019 | 14/05/2019 | | Em andamento |

1.2. Projetos concluídos no período

| Id | Nome | Gerente do projeto | Unidade responsável | Tipo | Data da demanda | Início realizado | Fim realizado | Status |
|-----|--|-------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------|
| 10 | Correções de segurança no Banco de Dados: Roles de DBA | Andre Pereira Nunes | SDS | Projeto | 10/01/2017 | | 07/05/2019 | Concluído |
| 42 | Aquisição de solução de impressão colorida A3 | Stanley Araujo de Sousa | SSI | Contratação | 26/10/2017 | 14/06/2018 | 21/05/2019 | Concluído |
| 244 | Implantação de sistema de inscrição para sustentação oral do pleno | Gilberto Cunha Filho | SPJE | Projeto | 15/02/2018 | | 16/05/2019 | Concluído |
| 376 | Elaborar e executar o processo de sustentação e manutenção de software | Andre Pereira Nunes | SDS | Projeto | 02/08/2018 | | 07/05/2019 | Concluído |
| 386 | Elaborar e executar o processo de gerenciamento de arquitetura | Diogo Duailibe da Silva | SDS | Projeto | 27/08/2018 | | 07/05/2019 | Concluído |
| 396 | Implantação Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários (SABB) | Gilberto Cunha Filho | SPJE | Projeto | 28/09/2018 | | 08/05/2019 | Concluído |
| 444 | Migração de dados do Prontuário Eletrônico para o SIGS | Darlon José Coqueiro | SDS | Projeto | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 30/05/2019 | Concluído |
| 365 | Elaboração do PDTIC 2019 | Rafael Robinson de Sousa Neto | SGTI | Projeto | 03/08/2018 | | 15/05/2019 | Concluído |

1.3. Projetos cancelados no período

| Id | Nome | Gerente do projeto | Unidade responsável | Tipo | Data da demanda | Início realizado | Fim realizado | Status | Justificativa |
|-----|--|-----------------------------------|---------------------|------|-----------------|------------------|-------------------|-----------|---|
| 237 | Implantação do Sistema Satélite SICOND | Claudio Henrique Carneiro Sampaio | CTIC | Ação | 22/01/2018 | | 24/05/2019 | Cancelado | Projeto cancelado pelo demandante: "Considerando que o sistema SICOND tem por objetivo auxiliar na criação da Ata de Correição e que, no entanto, este Tribunal criou uma ferramenta própria para este fim, atendendo, na visão de negócio e técnica, de forma mais completa que o Sicond, a Corregedoria entende |


que, no momento, projeto não deve prosseguir.”

2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações

CTIC

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

março/2019 abril/2019 maio/2019

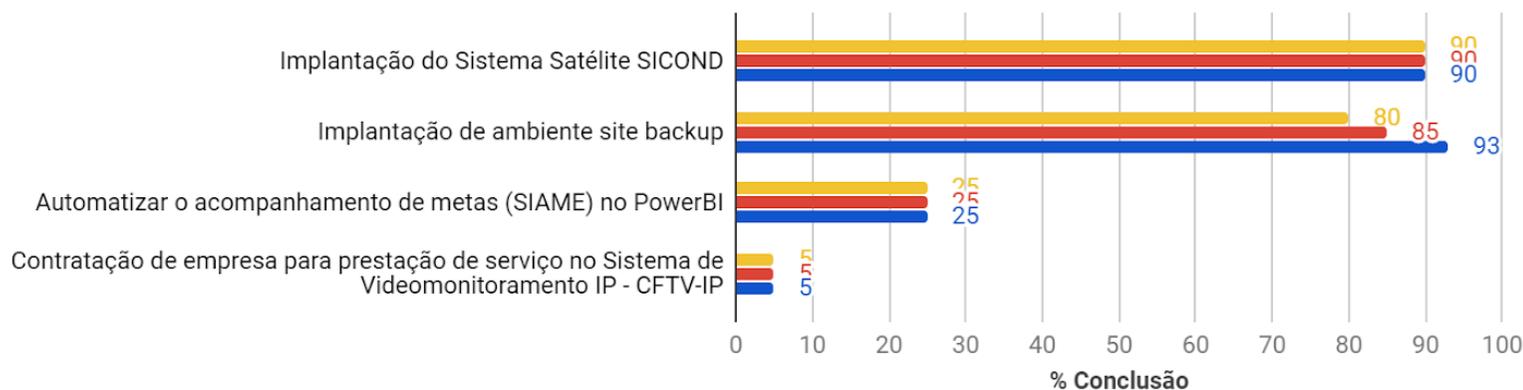

| # | Id | Projeto | Gerente do projeto | Status | Tipo | Data da demanda | Fim previsto | Início realizado | Fim realizado | % Conclusão | Conclusão da RDS |
|---|-----|--|-----------------------------------|--------------|---------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-------------|--|
| 1 | 237 | Implantação do Sistema Satélite SICOND | Claudio Henrique Carneiro Sampaio | Cancelado | Ação | 22/01/2018 | 24/05/2019 | | 24/05/2019 | 90 | Projeto cancelado pelo demandante. |
| 2 | 221 | Implantação de ambiente site backup | Claudio Henrique Carneiro Sampaio | Em andamento | Projeto | 30/11/2017 | 26/06/2019 | | | 93 | A sala encontra-se operacional, com todos os subsistemas em funcionamento. Falta iniciar o processo de movimentação dos equipamentos que serão instalados na sala. Foi solicitado pela FONMART o recebimento provisório. |

Portfólio de Projetos de TIC - Maio/2019


| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|-----------------------------------|----------|-------------|------------|------------|--|--|----|--|
| 3 | 378 | Automatizar o acompanhamento de metas (SIAME) no PowerBI | David Tedson Mendonca Ferreira | Suspensa | Ação | 23/08/2018 | 30/08/2019 | | | 25 | Projeto suspenso. Previsto para retomar em 10/06/2019. (EGP-TIC) |
| 4 | 246 | Contratação de empresa para prestação de serviço no Sistema de Videomonitoramento IP - CFTV-IP | Claudio Henrique Carneiro Sampaio | Suspensa | Contratação | 16/02/2018 | 20/09/2019 | | | 5 | Sem progresso no período. |

3. Setor de Desenvolvimento de Sistemas

SDS

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

março/2019 abril/2019 maio/2019

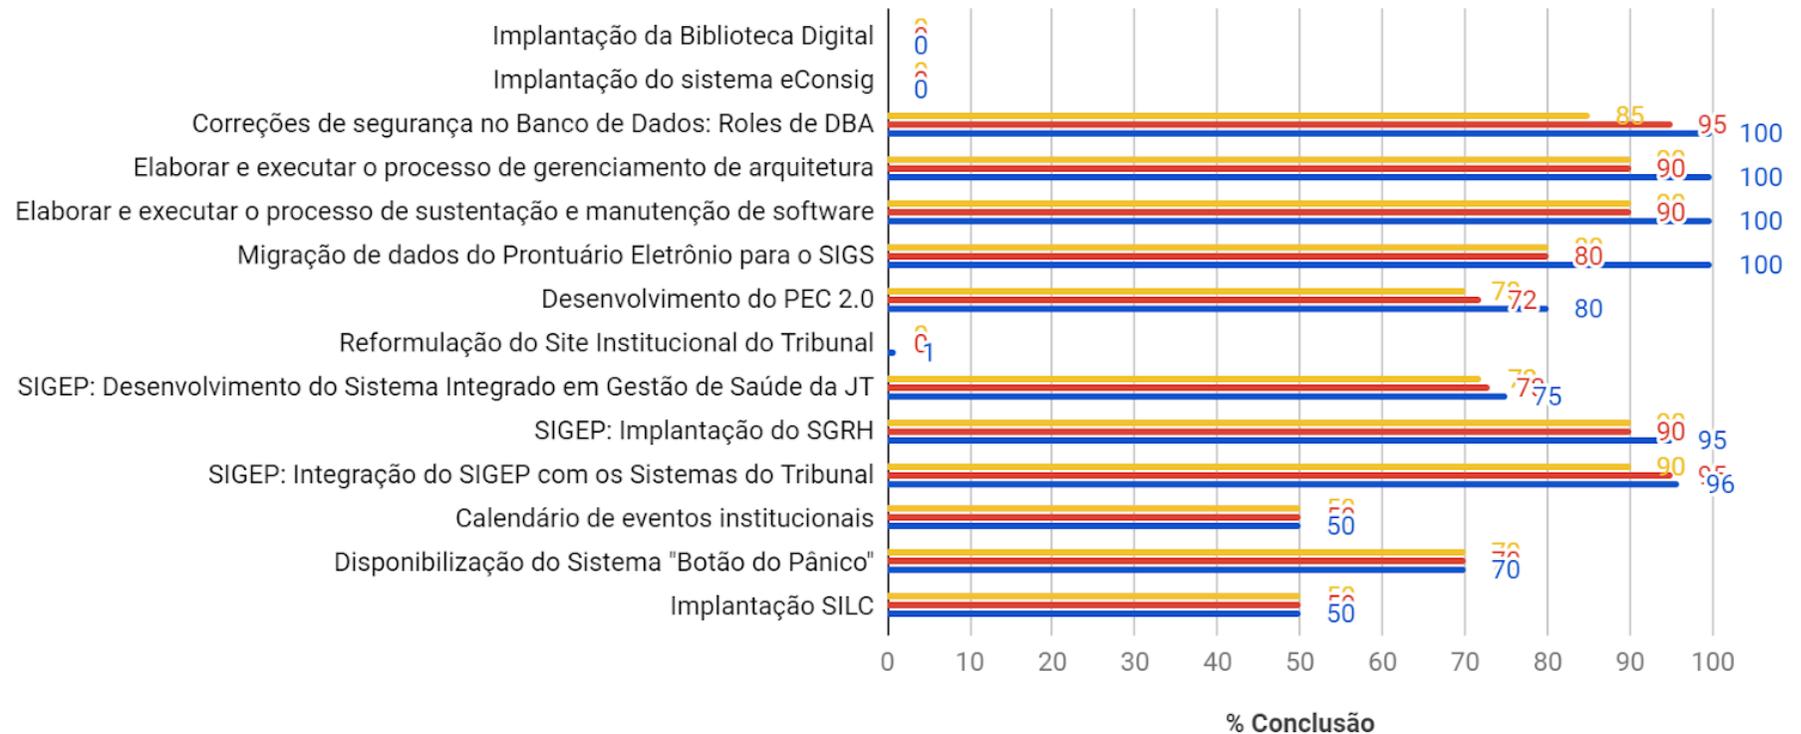

Portfólio de Projetos de TIC - Maio/2019

| # | Id | Projeto | Gerente do projeto | Status | Tipo | Data da demanda | Fim previsto | Início realizado | Fim realizado | % Conclusão | Conclusão da RDS |
|---|-----|--|-------------------------|--------------|---------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-------------|---|
| 1 | 224 | Implantação do sistema eConsig | Andre Pereira Nunes | A iniciar | Projeto | 06/12/2017 | 30/08/2019 | | | 0 | Sem progresso no período. Aguardando a entrada da FolhaWeb em produção. |
| 2 | 279 | Implantação da Biblioteca Digital | Andre Pereira Nunes | A iniciar | Projeto | 01/01/2018 | 18/12/2020 | | | 0 | Sem progressos no período. Projeto previsto para execução em 2020. |
| 3 | 10 | Correções de segurança no Banco de Dados: Roles de DBA | Andre Pereira Nunes | Concluído | Projeto | 10/01/2017 | 31/05/2019 | | 07/05/2019 | 100 | Projeto encerrado formalmente. |
| 4 | 376 | Elaborar e executar o processo de sustentação e manutenção de software | Andre Pereira Nunes | Concluído | Projeto | 02/08/2018 | 31/05/2019 | | 07/05/2019 | 100 | Projeto concluído parcialmente. Artefatos elaborados, porém não publicados. Eles foram utilizados no projeto de revisão da política de gerenciamento de software. |
| 5 | 386 | Elaborar e executar o processo de gerenciamento de arquitetura | Diogo Duailibe da Silva | Concluído | Projeto | 27/08/2018 | 07/05/2019 | | 07/05/2019 | 100 | Projeto concluído parcialmente. Artefatos elaborados, porém não publicados. Eles foram utilizados no projeto de revisão da política de gerenciamento de software. |
| 6 | 444 | Migração de dados do Prontuário Eletrônico para o SIGS | Darlon José Coqueiro | Concluído | Projeto | 12/11/2018 | 31/05/2019 | 12/11/2018 | 30/05/2019 | 100 | Projeto concluído. Elaborado procedimentos de migração que serão executados através de chamado operacional. |
| 7 | 32 | SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal | Andre Pereira Nunes | Em andamento | Projeto | 24/05/2018 | 30/08/2019 | | | 96 | Identificado e realizado a adequação de esquemas do BD que acessam ao esquema do RH legado. |
| 8 | 187 | SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT | Diogo Duailibe da Silva | Em andamento | Projeto | 25/08/2017 | 01/12/2020 | | | 75 | Implementado Auditoria via filtros. Inserção da anotação de auditoria nos métodos Ocupacionais e Assistenciais. Correção da consulta de Auditoria para contemplar as mudanças feitas pela implementação do filtro de Auditoria. |

Portfólio de Projetos de TIC - Maio/2019

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|------------------------------|--------------|---------|------------|------------|------------|--|----|---|
| 9 | 277 | SIGEP: Implantação do SGRH | Andre Pereira Nunes | Em andamento | Projeto | 01/01/2018 | 30/08/2019 | | | 95 | Realizado a carga definitiva em PRODUÇÃO no SGRH, a partir do Sistema de RH Legado. Resolução de 78 chamados (via Assyst), referente a correções para a carga, revisões de privilégios de acesso e atualização de versão. |
| 10 | 280 | Reformulação do Site Institucional do Tribunal | Andre Pereira Nunes | Em andamento | Projeto | 01/01/2018 | 31/12/2019 | 29/05/2019 | | 1 | Realizado o estudo de portais candidatos. Definida a infraestrutura necessária. Proposta de TAP aprovada na 4ª Reunião do CGovTIC. |
| 11 | 354 | Desenvolvimento do PEC 2.0 | Ronny Paterson Cruz da Silva | Em andamento | Projeto | 03/07/2018 | 24/01/2020 | | | 80 | Evolução no desenvolvimento dos pacotes: <ul style="list-style-type: none"> • 100% - DAS • 95% - Pacote 01 - Atos Agrupados e Exibição de Participantes do Processo • 90% - Pacote 02 - Destinatários e Outros destinatários • 90% - Pacote 03 - Expedientes Fora do Fluxo • 50% - Pacote 04 - Edição e Assinatura de Atos de Comunicação • 0% - Pacote 05 - GIM e GIGS 0% para • 50% - PEC - Pacote 06 - Melhorias no PAC 2 |
| 12 | 19 | Implantação SILC | Andre Pereira Nunes | Suspenso | Projeto | 06/02/2018 | 31/07/2020 | | | 50 | Projeto postergado para execução em 2020 conforme PDTIC. (EGP-TIC) |
| 13 | 223 | Calendário de eventos institucionais | Andre Pereira Nunes | Suspenso | Projeto | 06/12/2017 | 30/06/2019 | | | 50 | Sem progressos no período. Pendência no tratamento de problemas encontrados, e decisão acerca do novo portal. |
| 14 | 446 | Disponibilização do Sistema "Botão do | Darlon José Coqueiro | Suspenso | Projeto | 13/11/2018 | 15/07/2019 | | | 70 | Sem progressos no período. Pendência da Infraestrutura. |


Pânico"

4. Setor de Governança de TI

SGTI

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

■ março/2019 ■ abril/2019 ■ maio/2019

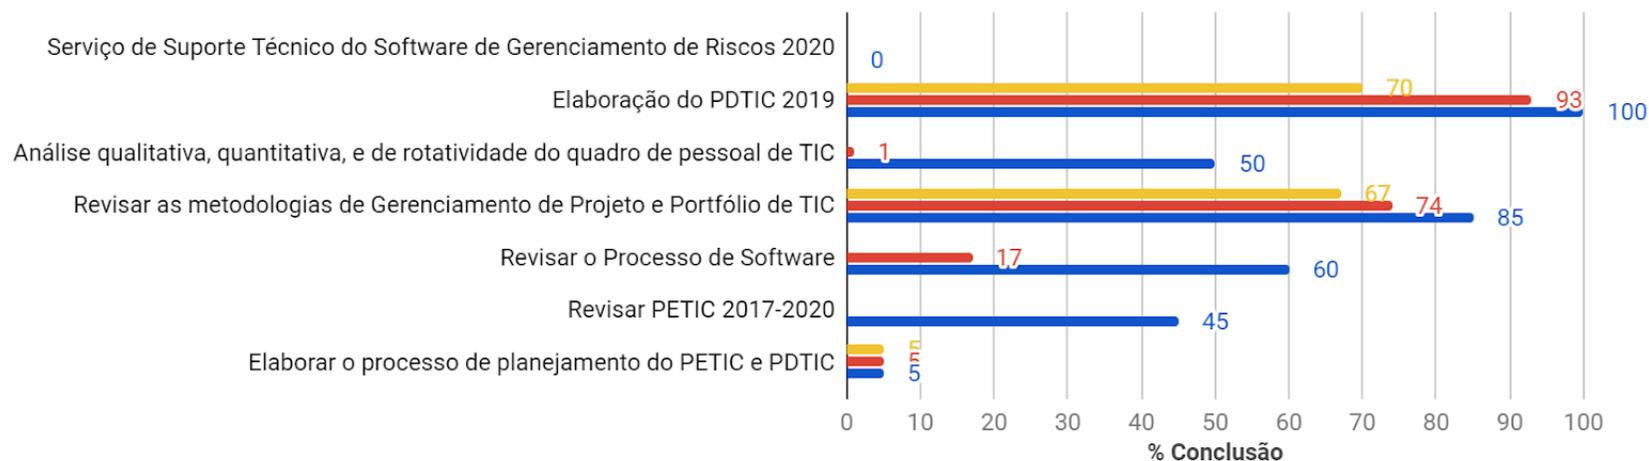


| # | Id | Projeto | Gerente do projeto | Status | Tipo | Data da demanda | Fim previsto | Início realizado | Fim realizado | % Conclusão | Conclusão da RDS |
|---|-----|--|--------------------|-----------|---------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| 1 | 483 | Serviço de Suporte Técnico do Software de Gerenciamento de Riscos 2020 | Jose Augusto | A iniciar | Projeto | 25/04/2019 | 31/12/2019 | | | 0 | Sem progresso no período. |

Portfólio de Projetos de TIC - Maio/2019

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|-------------------------------|--------------|---------|------------|------------|------------|------------|-----|---|
| 2 | 365 | Elaboração do PDTIC 2019 | Rafael Robinson de Sousa Neto | Concluído | Projeto | 03/08/2018 | 15/05/2019 | | 15/05/2019 | 100 | Projeto concluído com êxito. O Plano Diretor de TIC 2019-2020 foi instituído pelo Tribunal através da Portaria GP Nº 368/2019 |
| 3 | 392 | Revisar as metodologias de Gerenciamento de Projeto e Portfólio de TIC | Maickel Roberto Neitzke | Em andamento | Projeto | 24/09/2018 | 28/06/2019 | | | 85 | Documento da MGP e fase de revisão. Minutas das portarias das políticas de gerenciamento de demandas, portfólio e projetos analisadas e aprovadas na 4ª Reunião do CGovTIC. |
| 4 | 482 | Análise qualitativa, quantitativa, e de rotatividade do quadro de pessoal de TIC | Jose Augusto | Em andamento | Projeto | 24/04/2019 | 31/07/2019 | 29/04/2019 | | 50 | Análise quantitativa concluída. Mapeadas as competências das unidades: SGTI, SPJE, SDS, SRC e SSI. |
| 5 | 484 | Revisar o Processo de Software | Rafael Robinson de Sousa Neto | Em andamento | Ação | 26/04/2019 | 21/06/2019 | 26/04/2019 | | 60 | Elaboração dos 4 fluxos do Processo Gerenciar Software: Desenvolver Software, Implantar Software, Sustentar Software e Desativar Software. Finalização da minuta cujo objetivo é instituir a Política de Gerenciamento de Software. Elaboração de 50% do Processo de Trabalho de Gerenciamento de Software. |
| 6 | 486 | Revisar PETIC 2017-2020 | Rafael Robinson de Sousa Neto | Em andamento | Ação | 13/05/2019 | 19/07/2019 | 14/05/2019 | | 45 | Planejamento da ação com a definição do cronograma de execução. Levantamento dos documentos de referência e realização do diagnóstico no PETIC atual. Definição do novo mapa estratégico e início da elaboração dos novos indicadores e metas. |
| 7 | 372 | Elaborar o processo de planejamento do PETIC e PDTIC | Rafael Robinson de Sousa Neto | Suspensão | Projeto | 10/08/2018 | 31/07/2019 | | | 5 | Sem progresso no período. |

5. Setor de Infraestrutura Computacional

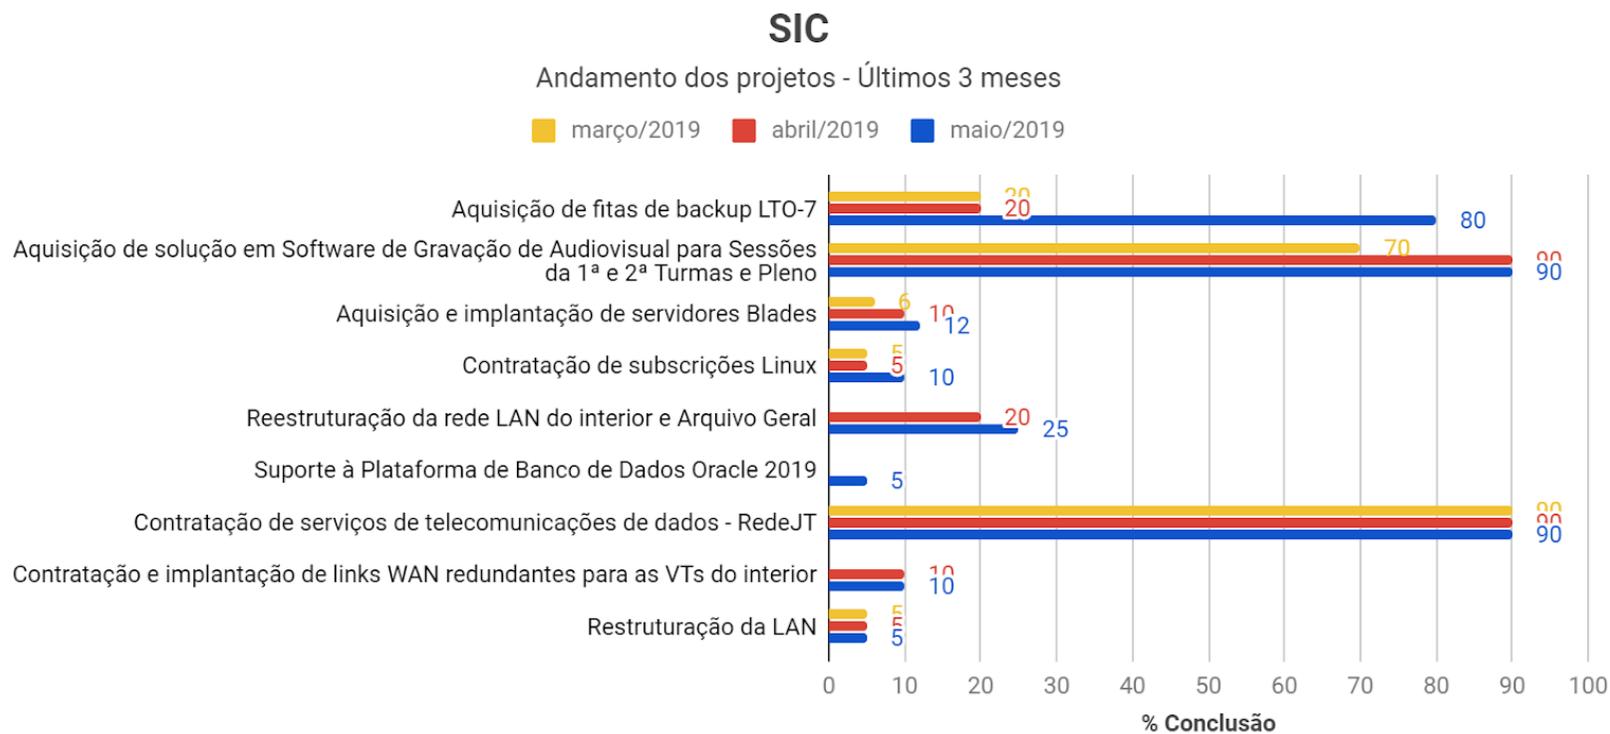

| # | Id | Projeto | Gerente do projeto | Status | Tipo | Data da demanda | Fim previsto | Início realizado | Fim realizado | % Conclusão | Conclusão da RDS |
|---|-----|--|----------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-------------|---|
| 1 | 358 | Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno | Pablo Teofilo Durans | Em andamento | Contratação | 06/07/2018 | 31/07/2019 | | | 90 | Sem progresso no período. Apesar de interações em busca de entendimento entre setores administrativos e técnicos. |

Portfólio de Projetos de TIC - Maio/2019


| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|----------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--|----|---|
| 2 | 455 | Aquisição e implantação de servidores Blades | Vinicius Muniz Silva de Jesus. | Em andamento | Projeto | 15/01/2019 | 29/11/2019 | 31/01/2019 | | 12 | Despachado os quantitativos das unidades do item 9 da ARP. Minuta do contrato elaborada e repassada para o Setor de Contratos. Emissão de certidões do SICAF da empresa vencedora da licitação. |
| 3 | 460 | Aquisição de fitas de backup LTO-7 | Aured de Freitas Costa Rodrigues | Em andamento | Projeto | 29/01/2019 | 30/06/2019 | 30/01/2019 | | 80 | ARP com previsão para 30/05. |
| 4 | 461 | Contratação de subscrições Linux | Fernando Rola Ferreira Filho | Em andamento | Projeto | 29/01/2019 | 31/08/2019 | 30/01/2019 | | 10 | Equipe de planejamento instituída. Iniciado o ETP com análise de viabilidade. |
| 5 | 476 | Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo Geral | Antonieli Magalhaes de Carvalho | Em andamento | Projeto | 01/04/2019 | 23/08/2019 | 16/04/2019 | | 25 | Reestruturado a rede LAN da VT de Santa Inês. |
| 6 | 485 | Suporte à Plataforma de Banco de Dados Oracle 2019 | Leonel Pereira | Em andamento | Contratação | 02/05/2019 | 27/10/2019 | 17/05/2019 | | 5 | PGP elaborado, portaria da equipe de planejamento publicada, e elaboração do ETP iniciada. |
| 7 | 233 | Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT | Danilo Augusto Alves Leite | Suspensão | Contratação | 12/01/2018 | 19/12/2019 | | | 90 | Sem progresso no período. |
| 8 | 442 | Restruturação da LAN | Danilo Augusto Alves Leite | Suspensão | Projeto | 17/10/2018 | 30/06/2019 | | | 5 | Sem progresso no período. |
| 9 | 480 | Contratação e implantação de links WAN redundantes para as VTs do interior | Danilo Augusto Alves Leite | Suspensão | Contratação | 15/04/2019 | 15/07/2020 | 08/03/2019 | | 10 | Sem progresso no período. |

6. Seção de Apoio ao PJe

SPJE

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

■ março/2019 ■ abril/2019 ■ maio/2019

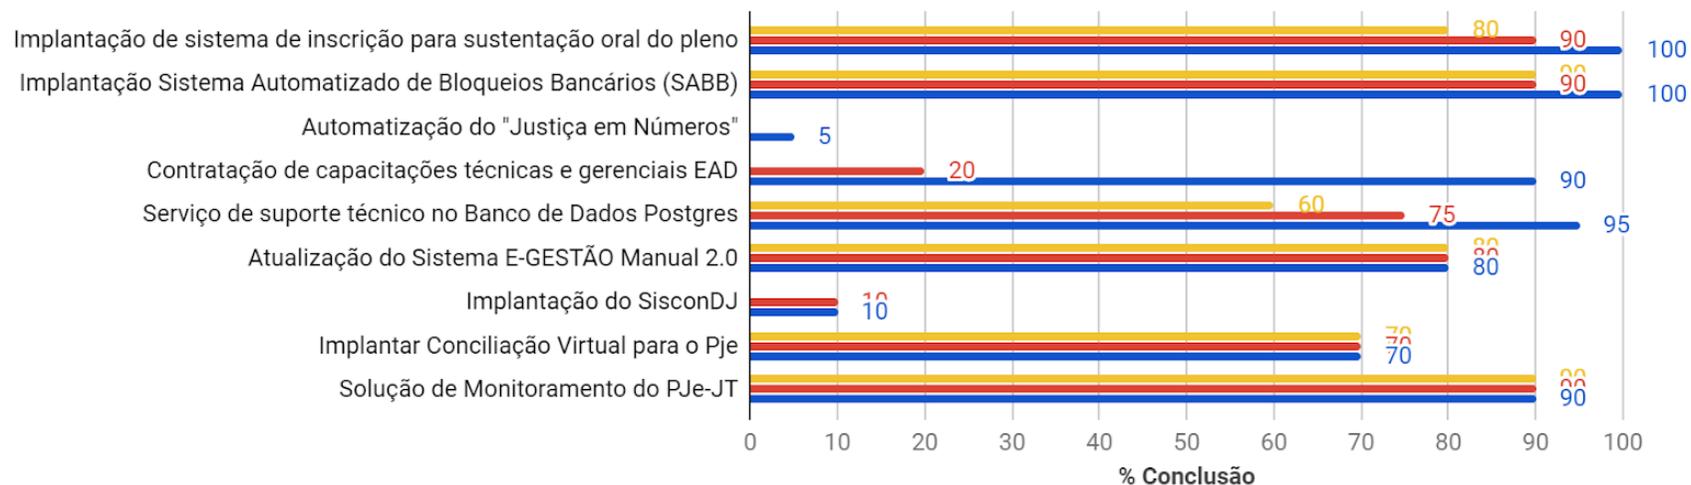


| # | Id | Projeto | Gerente do projeto | Status | Tipo | Data da demanda | Fim previsto | Início realizado | Fim realizado | % Conclusão | Conclusão da RDS |
|---|-----|--|----------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-------------|--|
| 1 | 244 | Implantação de sistema de inscrição para sustentação oral do pleno | Gilberto Cunha Filho | Concluído | Projeto | 15/02/2018 | 16/05/2019 | | 16/05/2019 | 100 | Termo de entrega despachado e Projeto concluído; |
| 2 | 396 | Implantação Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários (SABB) | Gilberto Cunha Filho | Concluído | Projeto | 28/09/2018 | 08/05/2019 | | 08/05/2019 | 100 | Projeto concluído. |
| 3 | 463 | Serviço de suporte técnico no Banco de Dados Postgres | Romulo Moura | Em andamento | Contratação | 10/01/2019 | 28/06/2019 | 29/01/2019 | | 95 | Aditivo nº 04 do contrato nº 04/2016 assinado e juntado ao PA 5809/2015. Resta o encerramento formal do projeto. |

Portfólio de Projetos de TIC - Maio/2019

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|------------------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|--|----|--|
| 4 | 474 | Contratação de capacitações técnicas e gerenciais EAD | Gilberto Cunha Filho | Em andamento | Capacitação | 28/03/2019 | 28/06/2019 | 29/03/2019 | | 90 | Envio de certidões de regularidade; Propostas atualizadas; Confirmação de dotação orçamentária; |
| 5 | 481 | Automatização do "Justiça em Números" | Djeison Rafael Neitzke | Em andamento | Ação | 23/04/2019 | 19/07/2019 | 19/06/2019 | | 5 | Criado modelo de dados; Implementada a 1ª versão de desenvolvimento no Pentaho; Realizado teste com 3 itens do módulo produtividade. |
| 6 | 56 | Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0 | Gilberto Cunha Filho | Suspensão | Projeto | 06/04/2018 | 31/12/2019 | | | 80 | Sem progresso no período; |
| 7 | 175 | Implantar Conciliação Virtual para o Pje | Gilberto Cunha Filho | Suspensão | Projeto | 20/07/2017 | 31/07/2019 | | | 70 | Sem progresso no período; |
| 8 | 353 | Solução de Monitoramento do PJe-JT | Romulo Moura | Suspensão | Contratação | 21/06/2018 | 28/06/2019 | | | 90 | Sem progresso no período. |
| 9 | 477 | Implantação do SisconDJ | Gilberto Cunha Filho | Suspensão | Ação | 05/12/2018 | 08/07/2019 | | | 10 | Sem progresso no período |

7. Setor de Relacionamento com o Cliente

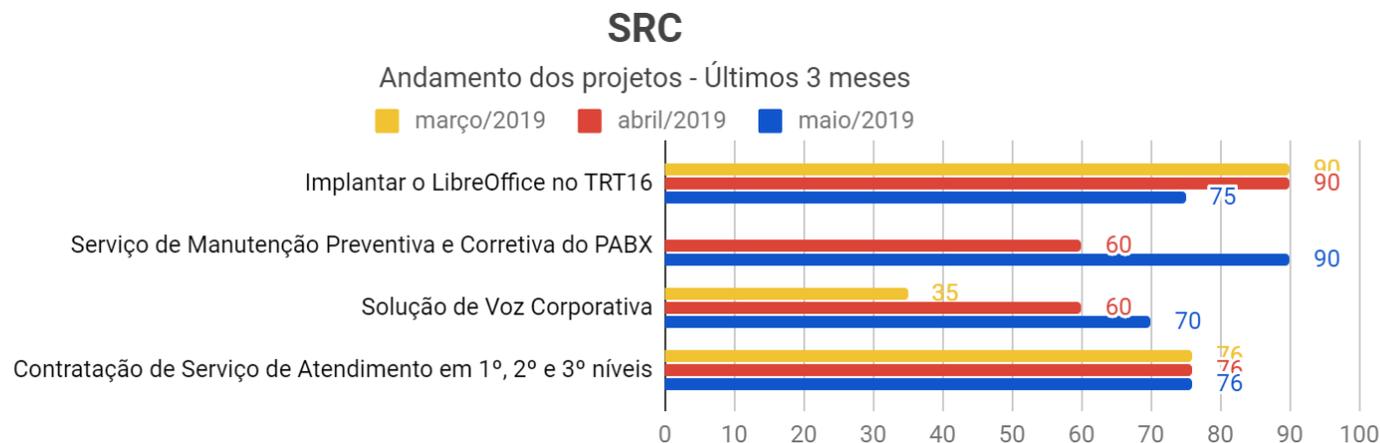

| # | Id | Projeto | Gerente do projeto | Status | Tipo | Data da demanda | Fim previsto | Início realizado | Fim realizado | % Conclusão | Conclusão da RDS |
|---|-----|----------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-------------|--|
| 1 | 351 | Implantar o LibreOffice no TRT16 | Carlos Eduardo Ferreira Marins | Em andamento | Projeto | 25/06/2018 | 30/08/2019 | | | 75 | Instalador do LibreOffice incluído nas máquinas do ponto em todas as VTs do Interior. Colocado em produção GPOs para 4 VT de interior. Realizado o ajuste no percentual de conclusão do projeto. |
| 2 | 381 | Solução de Voz Corporativa | Carlos Eduardo Ferreira Marins | Em andamento | Contratação | 27/08/2018 | 30/08/2019 | | | 70 | Concluído o levantamento das especificações técnicas da solução, foram enviadas solicitações de propostas para empresas. Aguarda-se o retorno das empresas para concluir o ETP. |

Portfólio de Projetos de TIC - Maio/2019


| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|--------------------------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|--|----|---|
| 3 | 479 | Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do PABX | Carlos Eduardo Ferreira Marins | Em andamento | Contratação | 23/04/2019 | 01/07/2019 | 24/04/2019 | | 90 | ETP concluído recomendando um aditivo ao contrato vigente. Minuta do aditivo elaborado e verificado dotação orçamentária. |
| 4 | 391 | Contratação de Serviço de Atendimento em 1º, 2º e 3º níveis | Carlos Eduardo Ferreira Marins | Suspenso | Contratação | 19/09/2018 | 30/09/2019 | | | 76 | Sem progresso no período. Priorização de outros projetos e atividades do setor. |

8. Seção de Segurança da Informação

SSI

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

■ março/2019 ■ abril/2019 ■ maio/2019

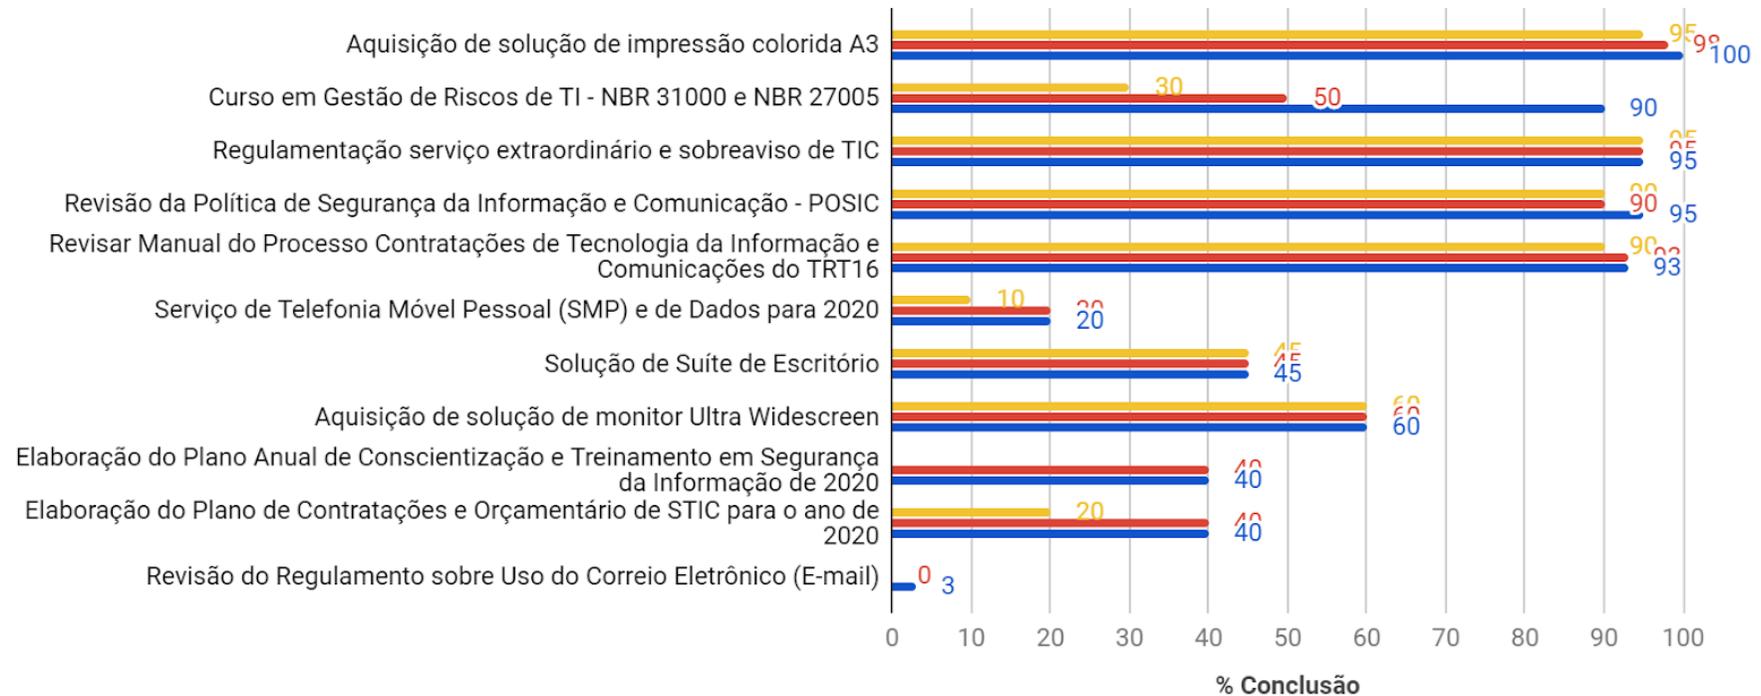

Portfólio de Projetos de TIC - Maio/2019

| # | Id | Projeto | Gerente do projeto | Status | Tipo | Data da demanda | Fim previsto | Início realizado | Fim realizado | % Conclusão | Conclusão da RDS |
|---|-----|---|-------------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-------------|---|
| 1 | 42 | Aquisição de solução de impressão colorida A3 | Stanley Araujo de Sousa | Concluído | Contratação | 26/10/2017 | 31/05/2019 | 14/06/2018 | 21/05/2019 | 100 | Projeto concluído. |
| 2 | 39 | Regulamentação serviço extraordinário e sobreaviso de TIC | Stanley Araujo de Sousa | Em andamento | Ação | 27/04/2018 | 28/06/2019 | | | 95 | Minuta de regulamentação aprovada na 4ª Reunião do CGovTIC. |
| 3 | 147 | Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16 | Stanley Araujo de Sousa | Em andamento | Projeto | 09/05/2017 | 15/08/2019 | | | 93 | Realizado ajustes no texto com sugestões da Diretoria-Geral. |
| 4 | 168 | Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC | Stanley Araujo de Sousa | Em andamento | Projeto | 28/06/2017 | 31/07/2019 | | | 95 | Revisão da POSIC aprovada pela Presidência. Na Secretaria do Pleno para reunião administrativa. |
| 5 | 450 | Solução de Suíte de Escritório | Stanley Araujo de Sousa | Em andamento | Contratação | 21/11/2018 | 28/09/2019 | | | 45 | Apresentado a solicitações de licenças pelas unidades do Tribunal na 4ª Reunião do CGovTIC. Recomendou-se consulta ao SOF sobre disponibilidade orçamentária. |
| 6 | 457 | Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2020 | Stanley Araujo de Sousa | Em andamento | Contratação | 22/01/2019 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | | 20 | Apresentado as opções sobre o modelo de contrato na 4ª Reunião do CGovTIC. A decisão foi sobrestada. |

Portfólio de Projetos de TIC - Maio/2019

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|-------------------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|--|----|---|
| 7 | 472 | Curso em Gestão de Riscos de TI - NBR 31000 e NBR 27005 | Stanley Araujo de Sousa | Em andamento | Ação | 14/03/2019 | 21/06/2019 | 27/03/2019 | | 90 | Capacitação realizada no período de 27 a 31 de maio. Resta o pagamento e encerramento do projeto. |
| 8 | 375 | Aquisição de solução de monitor Ultra Widescreen | Stanley Araujo de Sousa | Suspensão | Contratação | 27/08/2018 | 31/08/2019 | | | 60 | Sem progresso no período. Apenas melhorias no Termo de Referência por parte do CSJT. |
| 9 | 454 | Elaboração do Plano de Contratações e Orçamentário de STIC para o ano de 2020 | Stanley Araujo de Sousa | Suspensão | Projeto | 04/01/2019 | 31/10/2019 | 04/01/2019 | | 40 | Sem progresso no período. |
| 10 | 473 | Elaboração do Plano Anual de Conscientização e Treinamento em Segurança da Informação de 2020 | Stanley Araujo de Sousa | Suspensão | Projeto | 01/04/2019 | 24/09/2019 | 08/04/2019 | | 40 | Sem progresso no período; |
| 11 | 475 | Revisão do Regulamento sobre Uso do Correio Eletrônico (E-mail) | Stanley Araujo de Sousa | Suspensão | Projeto | 05/04/2019 | 30/09/2019 | | | 3 | Sem progresso no período. |
