



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 16ª REGIÃO

Portfólio de Projetos de TIC

Setembro/2019

Sumário


1.	RESUMO DOS PROJETOS	3
1.1.	PROJETOS INCLUÍDOS NO PORTFÓLIO	4
1.2.	PROJETOS INICIADOS	4
1.3.	PROJETOS CONCLUÍDOS	5
1.4.	PROJETOS CANCELADOS	5
2.	COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES	6
3.	SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	7
4.	SETOR DE GOVERNANÇA DE TI	11
5.	SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL	15
6.	SEÇÃO DE APOIO AO PJE	20
7.	SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE	22
8.	SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	25

1. Resumo dos projetos


Quantidade de projetos nas unidades



Complexidade dos projetos



Situação dos projetos



Situação dos projetos nas unidades



1.1. Projetos incluídos no portfólio

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
501	Capacitação nas tecnologias Docker e Kubernetes	Gustavo Soares De Melo	SPJE	Ação	03/09/2019	05/09/2019		Em andamento
502	Revisão do Catálogo e do Processo de Gerenciamento de Serviços de TIC	Jose Augusto	SGTI	Ação	09/09/2019	30/09/2019		Em andamento
503	Instituir a Política de Gerenciamento de Mudanças e Liberação de Serviços de TIC	Maickel Roberto Neitzke	SGTI	Ação	09/09/2019	10/09/2019		Em andamento
504	Implantação do Sistema E-Cartas (Correios)	Gutemberg Pereira Vidal Santos	SPJE	Ação	10/09/2019			A iniciar
505	Implantar o Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	SGTI	Ação	17/09/2019	30/09/2019		Em andamento

1.2. Projetos iniciados

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
501	Capacitação nas tecnologias Docker e Kubernetes	Gustavo Soares De Melo	SPJE	Ação	03/09/2019	05/09/2019		Em andamento
502	Revisão do Catálogo e do Processo de Gerenciamento de Serviços de TIC	Jose Augusto	SGTI	Ação	09/09/2019	30/09/2019		Em andamento
503	Instituir a Política de Gerenciamento de Mudanças e Liberação de Serviços de TIC	Maickel Roberto Neitzke	SGTI	Ação	09/09/2019	10/09/2019		Em andamento
505	Implantar o Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	SGTI	Ação	17/09/2019	30/09/2019		Em andamento

1.3. Projetos concluídos


<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
450	Solução de Suíte de Escritório	Stanley Araujo de Sousa	SSI	Projeto	21/11/2018	17/01/2019	20/09/2019	Concluído
497	Elaborar Política de Gestão de Pessoas de TIC	Maickel Roberto Neitzke	SGTI	Ação	06/08/2019	12/08/2019	24/09/2019	Concluído
372	Elaborar o processo de planejamento do PETIC e PDTIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	SGTI	Projeto	10/08/2018	01/06/2019	25/09/2019	Concluído
482	Análise qualitativa, quantitativa, e de rotatividade do quadro de pessoal de TIC	Jose Augusto	SGTI	Projeto	24/04/2019	29/04/2019	27/09/2019	Concluído
375	Aquisição de solução de monitor Ultra Widescreen	Stanley Araujo de Sousa	SSI	Projeto	27/08/2018	28/08/2018	30/09/2019	Concluído
473	Elaboração do Plano Anual de Conscientização e Treinamento em Segurança da Informação de 2020	Stanley Araujo de Sousa	SSI	Projeto	01/04/2019	08/04/2019	30/09/2019	Concluído
494	14º Congresso de Inovação no Poder Judiciário	Gilberto Cunha Filho	SPJE	Ação	05/07/2019	05/07/2019	30/09/2019	Concluído

1.4. Projetos cancelados

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>	<i>Justificativa</i>
353	Solução de Monitoramento do PJe-JT	Romulo Moura	SPJE	Projeto	21/06/2018	03/07/2018	30/09/2019	Cancelado	Cláudio Sampaio, após reunião dos diretores de TIC da Justiça do Trabalho, ocorrida no mês 08/2019, informou que a licitação da "Solução de Monitoramento do PJe - APM" foi cancelada pelo TST. Este projeto tinha como premissa a realização da licitação por parte do TST, motivo pelo qual foi cancelado.
498	Treinamento em Integração e Entrega Contínua (Git, Jenkins, Nexus e Sonar)	Andre Pereira Nunes	SDS	Ação	19/08/2019	20/08/2019	30/09/2019	Cancelado	Durante a coleta de preços foi avaliado que o curso de DevOps a ser lançado pela Caelum em 2020 tem ementa mais completa e valor total menor que a melhor opção até agora encontrada, que era o curso da 4Linux. A questão foi levada ao CGestIC e ficou acordado que os valores reservados para essa contratação podem ser utilizados para outra iniciativa ainda em 2019, estando adiada para 2020 essa capacitação.

2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações


Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

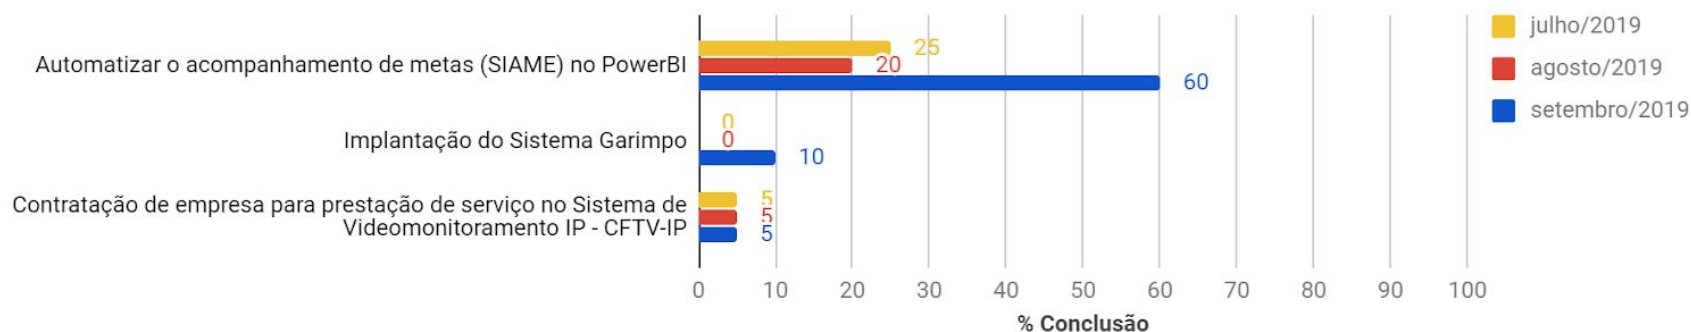

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	378	Automatizar o acompanhamento de metas (SIAME) no PowerBI	David Tedson Mendonca Ferreira	Em andamento	Ação	23/08/2018	31/10/2019			60	- Implementação da Meta 01; - Criação de estruturas de dados para agilizar a geração dos dados ; - Criação de template do Power Bi e do sql gerador da meta, visando agilizar a implementação das demais metas.
2	489	Implantação do Sistema Garimpo	David Tedson Mendonca Ferreira	Em andamento	Projeto	05/06/2019	30/11/2019			10	- Realização de treinamento em Brasília; - Implantação do sistema em ambiente de homologação; - Extração, em homologação, dos dados do arquivo da CEF.
3	246	Contratação de empresa para prestação de serviço no Sistema de Videomonitoramento IP - CFTV-IP	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Suspensão	Projeto	16/02/2018	31/10/2019			5	Sem progresso no período. Problema: Outras demandas priorizadas.

3. Setor de Desenvolvimento de Sistemas

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

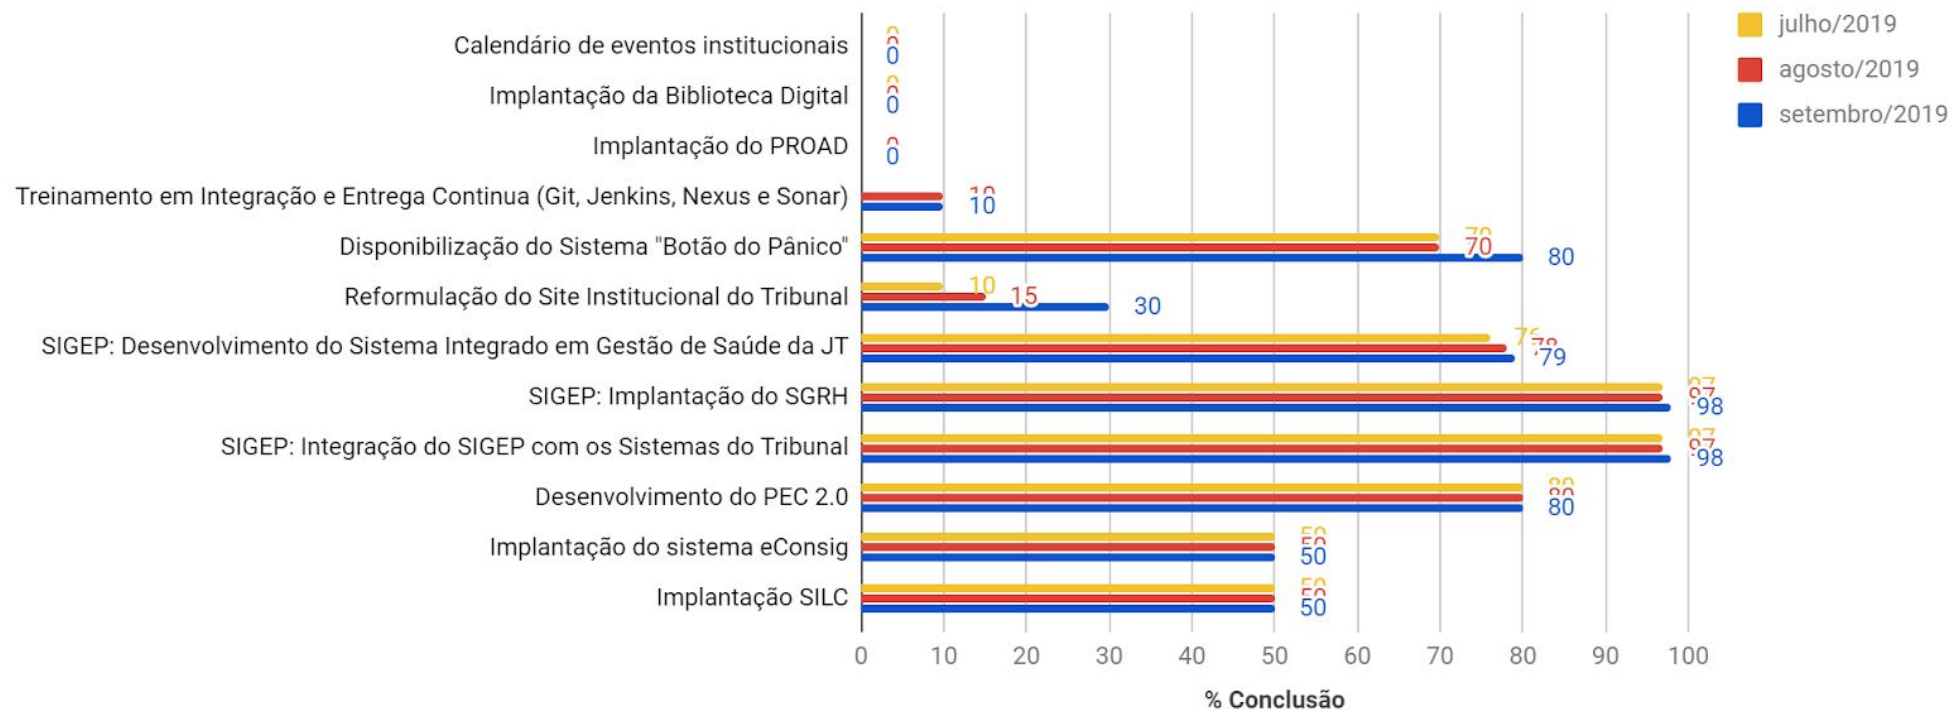

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	223	Calendário de eventos institucionais	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	06/12/2017	27/12/2019			0	Sem progressos no período. Pendência de recursos humanos para início do projeto.

Portfólio de Projetos de TIC - Setembro/2019

2	279	Implantação da Biblioteca Digital	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	01/01/2018	18/12/2020			0	Sem progressos no período. Projeto previsto para execução em 2020 de acordo com o PDTIC 2019/2020.
3	499	Implantação do PROAD	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	28/02/2019	30/06/2020			0	TAP Aprovado. Pendência da elaboração do PGP.
4	498	Treinamento em Integração e Entrega Contínua (Git, Jenkins, Nexus e Sonar)	Andre Pereira Nunes	Cancelado	Ação	19/08/2019	31/03/2019	20/08/2019	30/09/2019	10	Projeto cancelado. Durante a coleta de preços foi avaliado que o curso de DevOps a ser lançado pela Caelum em 2020 tem ementa mais completa e valor total menor que a melhor opção até agora encontrada, que era o curso da 4Linux. A questão foi levada ao CGESTIC e ficou acordado que os valores reservados para essa contratação podem ser utilizados para outra iniciativa ainda em 2019, restando adiada para 2020 essa contratação, que ficou pré-aprovada para o PAC 2020.
5	32	SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	24/05/2018	31/10/2019			98	Disponibilizado ambiente de homologação para que o Apoio ao PJE realize testes de adequação do eGestão. O projeto depende desses testes e da correção de eventuais erros encontrados durante para finalização.
6	187	SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	Diogo Duailibe da Silva	Em andamento	Projeto	25/08/2017	01/12/2020			79	- Desenvolvimento de novas funcionalidades do SBIS; - Desenvolvimento da funcionalidade de Prontuário Físico; - Correção de Defeitos.

Portfólio de Projetos de TIC - Setembro/2019


7	277	SIGEP: Implantação do SGRH	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	01/01/2018	31/10/2019			98	Folha de Setembro/2019 paga pela FolhaWeb em produção. Sistemas legados continuarão em paralelo por segurança até dezembro/2019; Sigep Online foi configurado e disponibilizado para exibição dos contracheques da FolhaWeb; Escala de Férias foi adequada na intranet para as regras do SGRH; Resolução de 33 chamados (via Assyst), 13 de SGRH e 20 de FolhaWebProdução de diversos relatórios para atender às necessidades da SOF e do NFP; Correções de erros diversos (detalhamento no Assyst);
8	280	Reformulação do Site Institucional do Tribunal	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	01/01/2018	27/12/2019	29/05/2019		30	Evolução nos entregáveis 3 e 4. - Entregável 1 - Mapeamento de Conteúdo e Configurações Iniciais: Fechada 100%; - Entregável 2 - Desenvolvimento do Template da Página Inicial: Fechada 100%; - Entregável 3 - Criação e configuração das áreas de publicação:Em andamento, de 70% para 90%; - Entregável 4 - Migração do conteúdo estático do site:Em andamento, de 0% para 90%; - Entregável 5 - Migração do conteúdo dinâmico do site: Nova 0%; - Entregável 6 - Definição dos setores responsáveis pela publicação dos conteúdos do site: Nova 0%; - Entregável 7 - Treinamento dos setores responsáveis pela publicação dos conteúdo do site: Nova 0%; - Entregável 8 - Homologação do Novo Portal Institucional: Nova 0%;

Portfólio de Projetos de TIC - Setembro/2019

9	446	Disponibilização do Sistema "Botão do Pânico"	Darlon José Coqueiro	Em andamento	Projeto	13/11/2018	31/10/2019			80	- Novos testes foram realizados após disponibilização de nova versão pelo TRT5. - Preparação de script de treinamento; - Preparação de scripts para deploy.
10	19	Implantação SILC	Andre Pereira Nunes	Suspensão	Projeto	06/02/2018	31/07/2020			50	Sem progressos no período. Projeto postergado para execução em 2020 conforme PDTIC.
11	224	Implantação do sistema eConsig	Andre Pereira Nunes	Suspensão	Projeto	06/12/2017	31/10/2019			50	Sem progresso no período. Pendência da utilização do Sistema FolhaWeb sanada. A ZetraSoft enviou solicitação do histórico de consignações para o Núcleo de Folha de Pagamento, após o envio dessa informação serão iniciados os testes do envio de arquivo de consignações pelo eConsig.
12	354	Desenvolvimento do PEC 2.0	Ronny Paterson Cruz da Silva	Suspensão	Projeto	03/07/2018	24/01/2020			80	Sem reporte do Gerente de Projeto. (EGP-TIC)

4. Setor de Governança de TI

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

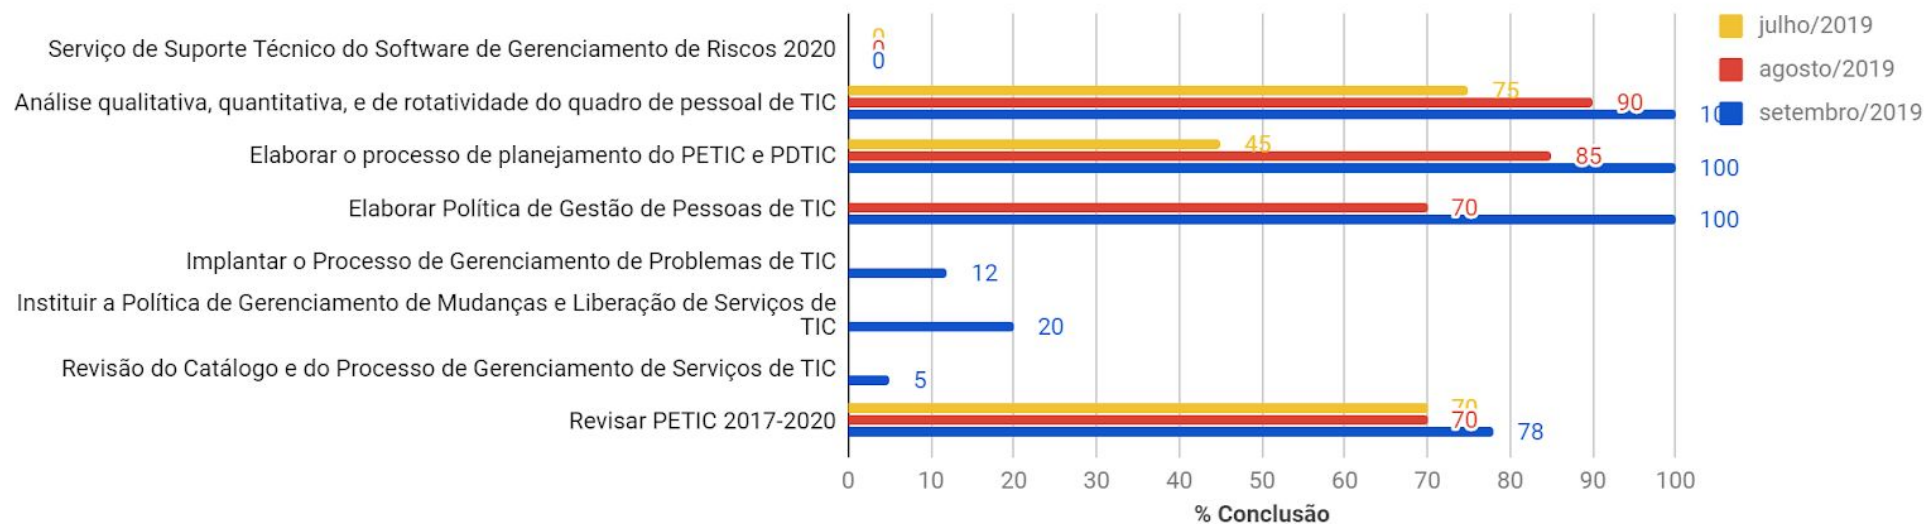

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	483	Serviço de Suporte Técnico do Software de Gerenciamento de Riscos 2020	Jose Augusto	A iniciar	Projeto	25/04/2019	31/12/2019			0	Sem progresso no período.

Portfólio de Projetos de TIC - Setembro/2019

2	372	Elaborar o processo de planejamento do PETIC e PDTIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	Concluído	Projeto	10/08/2018	20/09/2019	01/06/2019	25/09/2019	100	Projeto concluído com sucesso com as seguintes entregas: - Política do Planejamento Estratégico e Tático de TIC instituída (Ato Regulamentar GP Nº 12/2019) - Processo de Planejamento Estratégico e Tático de TIC publicado .
3	482	Análise qualitativa, quantitativa, e de rotatividade do quadro de pessoal de TIC	Jose Augusto	Concluído	Projeto	24/04/2019	27/09/2019	29/04/2019	27/09/2019	100	Revisão final do documento realizada; Publicado o documento final no portal de governança de TIC; Projeto concluído.
4	497	Elaborar Política de Gestão de Pessoas de TIC	Maickel Roberto Neitzke	Concluído	Ação	06/08/2019	30/09/2019	12/08/2019	24/09/2019	100	Projeto concluído com as seguintes entregas: 1. Minuta da Política de Gestão de Pessoas 2. Política apreciada pelo CGovTIC: 6ª Reunião do CGovTIC em 06/09/2019 3. Política publicada pela Presidência: Ato Regulamentar GP nº 11/2019
5	486	Revisar PETIC 2017-2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Ação	13/05/2019	01/11/2019	14/05/2019		78	- Minuta de revisão do PETIC apreciada e aprovada pelo CGovTIC em 06/09/2019, e encaminhada ao Núcleo de Assessoramento Jurídicos para análise do seu conteúdo. - Elaboração do relatório de análise dos indicadores referentes aos anos de 2017 e 2018. (40% concluído).

Portfólio de Projetos de TIC - Setembro/2019


6	502	Revisão do Catálogo e do Processo de Gerenciamento de Serviços de TIC	Jose Augusto	Em andamento	Ação	09/09/2019	29/11/2019	30/09/2019		5	<p>Evolução no entregável 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entregável 1. Elaboração da Minuta do Catálogo de Serviços de TIC; Em andamento 30%; <ul style="list-style-type: none"> Levantamento dos serviços ativos; Levantamento dos serviços que não estão sendo utilizados; Classificação e agrupamento dos serviços por setores; Elaboração e divulgação de formulários para cada setor; - Entregável 2. Elaboração da Minuta do Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC; Nova; 0% - Entregável 3. Portaria da Política de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC; Nova; 0% - Entregável 4. Deliberação pelo CGovTIC da Política, do Processo e do Catálogo; Nova; 0% - Entregável 5. Publicação pela Presidência da Política e do Catálogo; Nova; 0% - Entregável 6. Publicação pela CTIC da Política e Processo de gerenciamento do catálogo; Nova; 0%
---	-----	---	--------------	--------------	------	------------	------------	------------	--	---	---

Portfólio de Projetos de TIC - Setembro/2019

7	503	Instituir a Política de Gerenciamento de Mudanças e Liberação de Serviços de TIC	Maickel Roberto Neitzke	Em andamento	Ação	09/09/2019	13/12/2019	10/09/2019		20	<p>Evolução dos entregáveis do projeto</p> <ol style="list-style-type: none"> Fluxo do Gerenciamento de Mudança e Liberação de Serviços de TIC; Em andamento 60%; Implantação do Processo na ferramenta Assyst; Em andamento 30%; Processo de Gerenciamento de Mudança e Liberação de Serviços de TIC; Em andamento 10%; Política de Gerenciamento de Mudança e Liberação de Serviços de TIC; Nova 0%; Deliberação pelo CGovTIC da Política ; Nova 0%; Publicação pela Presidência da Política; Nova 0%; Política e Processo distribuído para a CTIC; Nova 0%;
8	505	Implantar o Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Ação	17/09/2019	20/12/2019	30/09/2019		12	<p>Aprovado o início da ação e elaborado o planejamento. Evolução dos entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> Entregável 1. Fluxo do Gerenciamento de Problemas de TIC; Em andamento 60%; Entregável 2. Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC Nova 0% Entregável 3. Política de Gerenciamento de Problemas de TIC; Nova 0%; Entregável 4. Implantação do Processo na ferramenta Assyst; Nova 0%; Entregável 5. Deliberação pelo CGovTIC da Política; Nova 0%; Entregável 6. Publicação pela Presidência da Política; Nova 0%; Entregável 7. Política e Processo distribuído para a CTIC; Nova 0%;

5. Setor de Infraestrutura Computacional

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

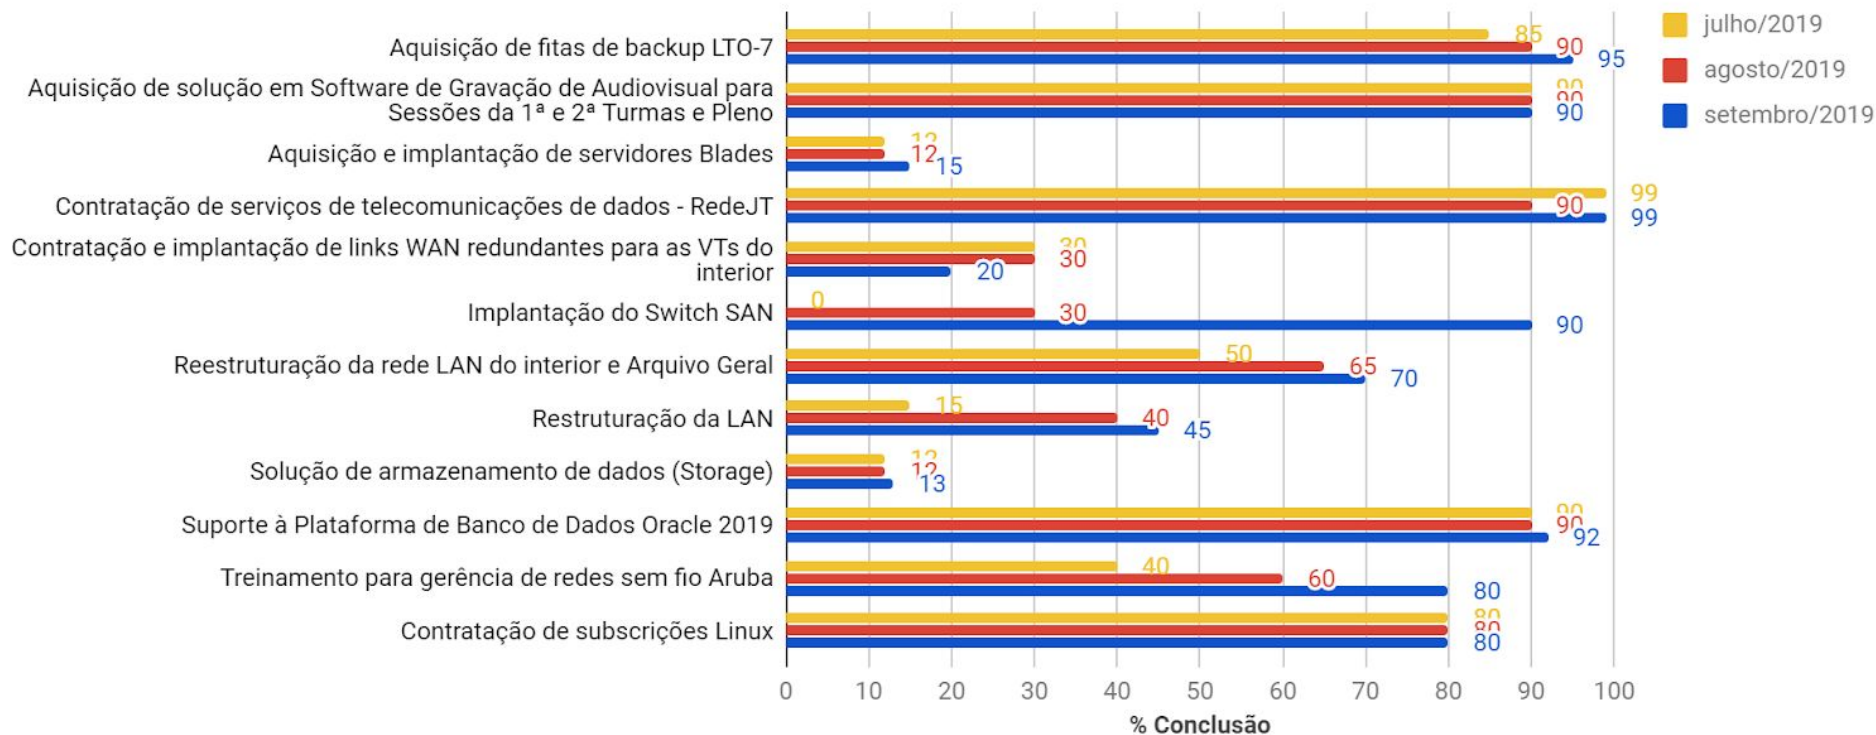

Portfólio de Projetos de TIC - Setembro/2019

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	233	Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT	Danilo Augusto Alves Leite	Em andamento	Projeto	12/01/2018	31/12/2020	19/01/2018		99	Documentos preparados para a emissão do termo de recebimento definitivo.
2	358	Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno	Pablo Teofilo Durans	Em andamento	Projeto	06/07/2018	16/12/2019	22/10/2018		90	Artefatos prontos. Aguardando a contratação conduzidas pelas unidades administrativas do Tribunal. Riscos: sobreposição de projetos e ações; Escassez de recursos humanos no Apoio de Infraestrutura Computacional.
3	442	Reestruturação da LAN	Danilo Augusto Alves Leite	Em andamento	Projeto	17/10/2018	31/12/2019			45	Realizado as tarefas para o agendamento da implantação nas VTs de Chapadinha e Estreito.
4	455	Aquisição e implantação de servidores Blades	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	Projeto	15/01/2019	31/12/2019	31/01/2019		15	- A Contratada solicitou uma nova prorrogação do prazo de entrega; - O integrante demandante elaborou o despacho CTIC 150/2019, solicitando o distrato com a Contratada por descumprimento para que seja possível buscar outra forma de aquisição; - Realizado a rescisão contratual amigável, por acordo entre as partes, não havendo a aplicação de penalidades administrativas, com as partes assinando o termo e extrato do termo de rescisão sendo publicado no DOU. - Anulação do empenho 2019NE000884 em favor da empresa ZOOM TECNOLOGIA LTDA, tendo em vista o termo de rescisão do contrato nº 20/2019; Risco:

Portfólio de Projetos de TIC - Setembro/2019

											<ul style="list-style-type: none"> - Uma nova aquisição foi iniciada por meio do PA 6051/2019, a Contratada pode atrasar a entrega do equipamento; - A migração do ambiente virtualizado deverá ser planejada a partir da entrega do equipamento, respeitando a disponibilidade dos recursos humanos;
5	460	Aquisição de fitas de backup LTO-7	Rodrigo Silveira Alexandre	Em andamento	Projeto	29/01/2019	30/10/2019	30/01/2019		95	As notas de empenho foram enviadas aos fornecedores e as etiquetas já foram recebidas. As fitas estão em trânsito e após o recebimento será encaminhado o pagamento.
6	476	Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo Geral	Antoniél Magalhaes de Carvalho	Em andamento	Projeto	01/04/2019	31/10/2019	16/04/2019		70	Reestruturação da rede LAN da VT de Pinheiro. Problemas: Wi-fi da VT não configurado devido à disponibilidade da equipe do SIC.
7	480	Contratação e implantação de links WAN redundantes para as VTs do interior	Danilo Augusto Alves Leite	Em andamento	Projeto	15/04/2019	31/12/2020	08/03/2019		20	TR e ETP elaborados e submetidos à DG. Reavaliado e ajustado o % de conclusão do projeto.
8	485	Suporte à Plataforma de Banco de Dados Oracle 2019	Leonel Pereira	Em andamento	Projeto	02/05/2019	27/10/2019	17/05/2019		92	Acompanhamento da Renovação/Contratação do serviço; Minuta de reajuste contratual elaborado pela administração e em processo de ajustes. Após, será elaborada a minuta do aditivo de prorrogação do contrato.

Portfólio de Projetos de TIC - Setembro/2019


9	490	Solução de armazenamento de dados (Storage)	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	Projeto	18/06/2019	31/12/2019	18/06/2019		13	<p>- Inclusão da ARP, edital e responsável pelo estudo técnico nacional incluído no PA.</p> <p>- Realizada a definição de aquisição em caráter de urgência, do item 1, sistema de armazenamento "All-Flash", Instalação e Treinamento, visto que, o lote com os storages híbridos solicitados no ETP e no TR do TRT16 estava em fase de recurso;</p> <p>- Dotação orçamentária informada pela SOF, com disponibilidade orçamentária suficiente para custeio da despesa;</p> <p>- Nota de empenho autorizada pela Diretoria Geral a emitida em favor da empresa COMPWIRE INFORMÁTICA S.A., no valor de R\$ 332.498,00, referente a aquisição dos quantitativos mínimos da solução de armazenamento de dados da Ata de Registro de Preços – PE 36/2019-A do TRT da 18ª Região;</p> <p>Riscos:</p> <p>- Devido à falta de recursos orçamentários, a ordem de fornecimento poderá não ser emitida, o que poderá ocasionar na renovação do contrato de suporte técnico vigente e manutenção de uma solução de armazenamento (storage) obsoleta;</p> <p>- Devido à falta de recursos de armazenamento, a prestação de novos serviços poderá ficar prejudicada;</p> <p>- A ausência futura do recurso de armazenamento (storage) poderá ocasionar em indisponibilidade dos serviços de TI no Tribunal.</p>
10	493	Implantação do Switch SAN	Danilo Augusto Alves Leite	Em andamento	Ação	02/07/2019	30/10/2019			90	<p>- Switchs SANs instalados e em operação; Treinamento realizado;</p>

Portfólio de Projetos de TIC - Setembro/2019

11	496	Treinamento para gerência de redes sem fio Aruba	Rodrigo Silveira Alexandre	Em andamento	Ação	25/07/2019	15/10/2019	26/07/2019		80	- Nova turma aberta para o período de 30/09 a 02/10. - Emitida nota de empenho e inscrição de dois servidores no treinamento: Fernando Rola e Vinicius Muniz.
12	461	Contratação de subscrições Linux	Fernando Rola Ferreira Filho	Suspenso	Projeto	29/01/2019	04/11/2019	30/01/2019		80	Sem progresso no período. Pendência: realização do pregão organizado pelo TRT5.

6. Seção de Apoio ao PJe

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

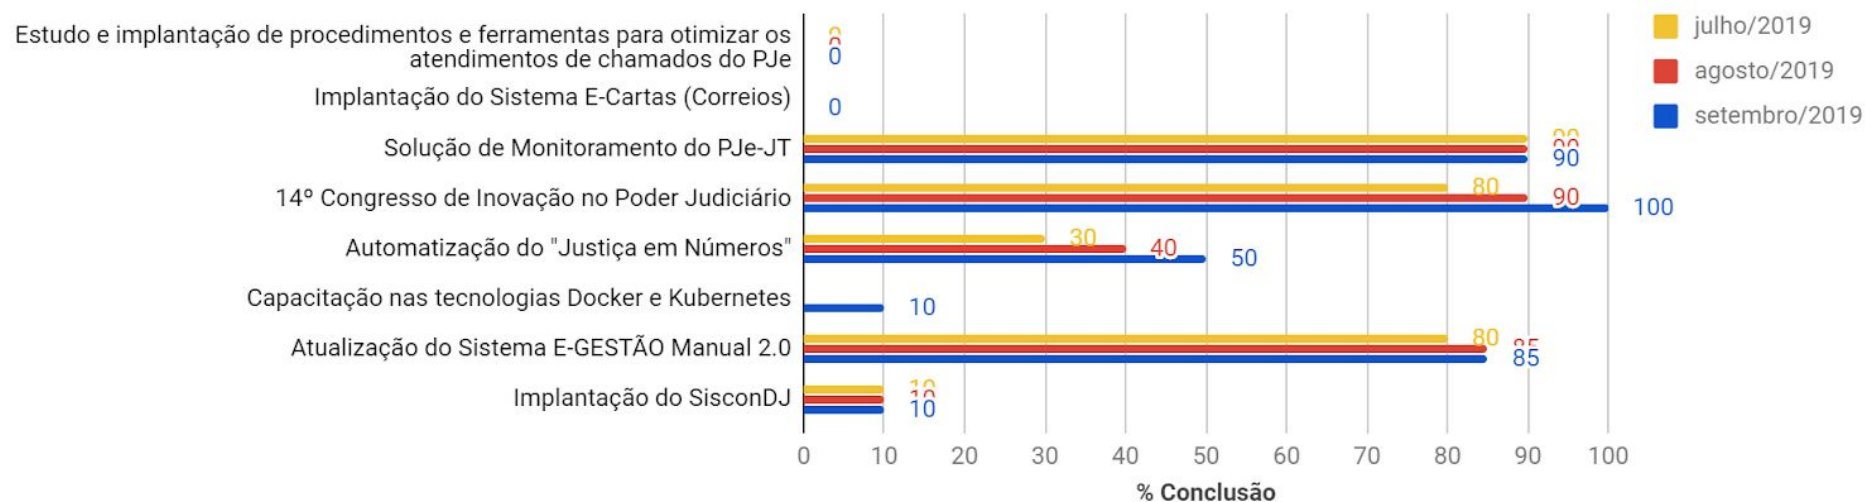


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	492	Estudo e implantação de procedimentos e ferramentas para otimizar os atendimentos de chamados do PJe	Gilberto Cunha Filho	A iniciar	Projeto	18/06/2019	30/11/2019			0	Sem progresso no período. Projeto não iniciado.
2	504	Implantação do Sistema E-Cartas (Correios)	Gutemberg Pereira Vidal Santos	A iniciar	Ação	10/09/2019	02/03/2020			0	Projeto não iniciado. Problema: acúmulo de funções de atividades no Apoio ao PJe.

Portfólio de Projetos de TIC - Setembro/2019

3	353	Solução de Monitoramento do PJe-JT	Romulo Moura	Cancelado	Projeto	21/06/2018	30/09/2019	03/07/2018	30/09/2019	90	Projeto cancelado. Cláudio Sampaio, após reunião dos diretores de TIC da Justiça do Trabalho, ocorrida no mês 08/2019, informou que a licitação da "Solução de Monitoramento do PJe - APM" foi cancelada pelo TST. Dessa forma, este projeto que tinha como premissa a realização da licitação por parte do TST, foi cancelado.
4	494	14º Congresso de Inovação no Poder Judiciário	Gilberto Cunha Filho	Concluído	Ação	05/07/2019	01/10/2019	05/07/2019	30/09/2019	100	- Congresso realizado. Participantes presentes. - Encerramento formal do projeto realizado.
5	481	Automatização do "Justiça em Números"	Djeison Rafael Neitzke	Em andamento	Ação	23/04/2019	19/12/2019	19/06/2019		50	- Gerado o XML pela nova plataforma, porém sem sucesso por erros inesperados. - Enviado os XMLx faltantes pela plataforma antiga. - Risco efetivado: plataforma nova de geração e envio não terminado antes do prazo final (10/09/2019).
6	501	Capacitação nas tecnologias Docker e Kubernetes	Gustavo Soares De Melo	Em andamento	Ação	03/09/2019	30/11/2019	05/09/2019		10	Ação iniciado e autorização para capacitação emitida.
7	56	Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0	Djeison Rafael Neitzke	Suspensão	Projeto	06/04/2018	19/12/2019			85	Sem progresso no período. Entretanto, foi liberada a versão 2.5 de Produção do extrator PJE. Foi solicitado o reprocessamento das remessas relativas ao ano de 2019 de acordo com a nova versão do Extrator do PJe, podendo fazê-lo até 1º de março de 2020.
8	477	Implantação do SisconDJ	Gilberto Cunha Filho	Suspensão	Ação	05/12/2018	29/11/2019			10	Sem progresso no período. Pendência de recursos humanos da SIC. Risco efetivado: perda do prazo de suporte com a equipe do BB;

7. Setor de Relacionamento com o Cliente

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

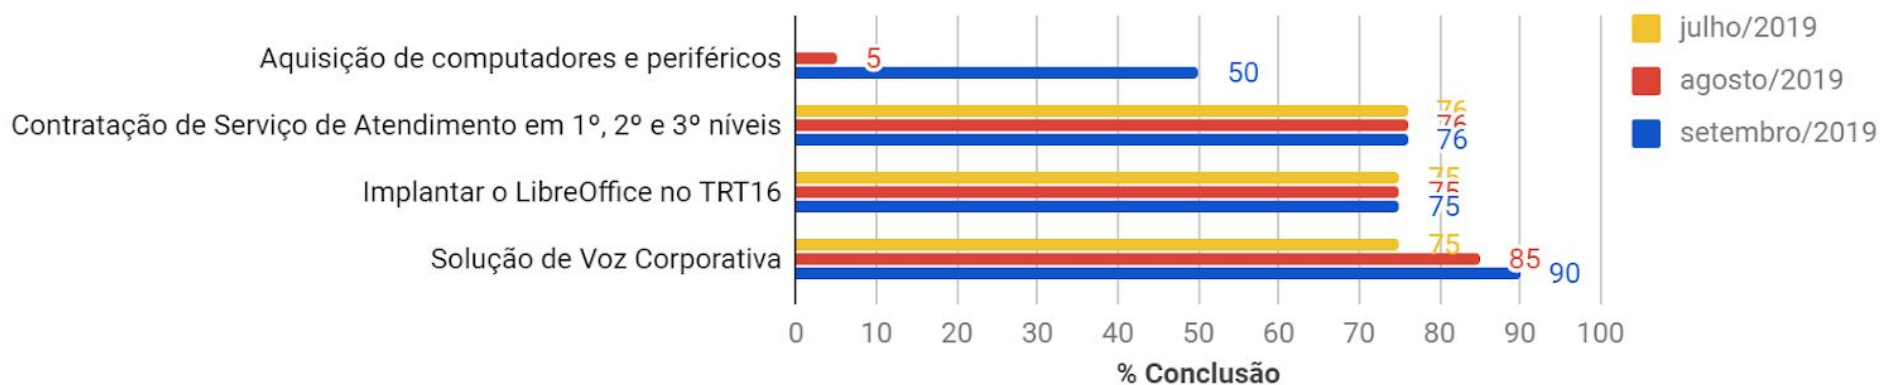

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	351	Implantar o LibreOffice no TRT16	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	25/06/2018	31/10/2019			75	<ul style="list-style-type: none"> - Retomada a instalação do LibreOffice no interior; - Criado novas GPOs e correção de antigas após a reestruturação da rede em algumas varas; - Risco efetivado: problemas para executar plenamente as GPOs. Evolução das instalações. - VT de Imperatriz 5,00% - VT de Imperatriz 0,00% - Distribuicao do FMAMR 0,00% - VT de Acailandia 80,00% - VT de Bacabal 0,00% - VT de Balsas 50,00% - VT de Barra do Corda 5,56% - VT de Barreirinhas 41,18%

Portfólio de Projetos de TIC - Setembro/2019


												<ul style="list-style-type: none"> - VT de Caxias 80,00% - VT de Chapadinha 56,25% - VT de Estreito 76,47% - VT de Pedreiras 0,00% - VT de Pinheiro 76,47% - VT de Presidente Dutra 43,75% - VT de Santa Ines 31,25% - VT de Sao Joao dos Patos 0,00% - VT de Timon 81,25%
2	381	Solução de Voz Corporativa	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	27/08/2018	31/10/2019				90	<ul style="list-style-type: none"> - A licitação foi realizada com sucesso, apresentando 7 empresas classificadas. A proposta da vencedora está sendo avaliada em função do recurso da segunda colocada. - Risco: atraso na homologação devido a recursos; impugnação da licitação; pagamento não ser realizado em 2019, gerando restos a pagar para 2020.
3	391	Contratação de Serviço de Atendimento em 1º, 2º e 3º níveis	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	19/09/2018	20/12/2019				76	<ul style="list-style-type: none"> - Dado prosseguimento à revisão do ETP, TR e anexos, após análise e proposições da integrante administrativa nos documentos; - Realizada reunião com um fornecedor para checagem da aderência do termo de referência ao mercado de TIC. Novas alterações e análises foram adicionadas ao escopo do projeto. - % de conclusão se mantém em 76% por não haver novas entregas, apenas alterações nas ações realizadas anteriormente.

Portfólio de Projetos de TIC - Setembro/2019

4	500	Aquisição de computadores e periféricos	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	05/08/2019	15/11/2019	05/08/2019		50	<ul style="list-style-type: none"> - Licitação foi realizada pelo TR13, tendo a Lenovo como vencedora do lote de microcomputadores de tipo I. - ETP, TR e Minuta de contrato do TR16 foram confeccionados. - Aguardando definição orçamentária e de oportunidade para a aquisição dos microcomputadores. - Risco: falta de recursos financeiros para a aquisição.
---	-----	---	--------------------------------	---------------------	---------	------------	------------	------------	--	----	---

8. Seção de Segurança da Informação

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

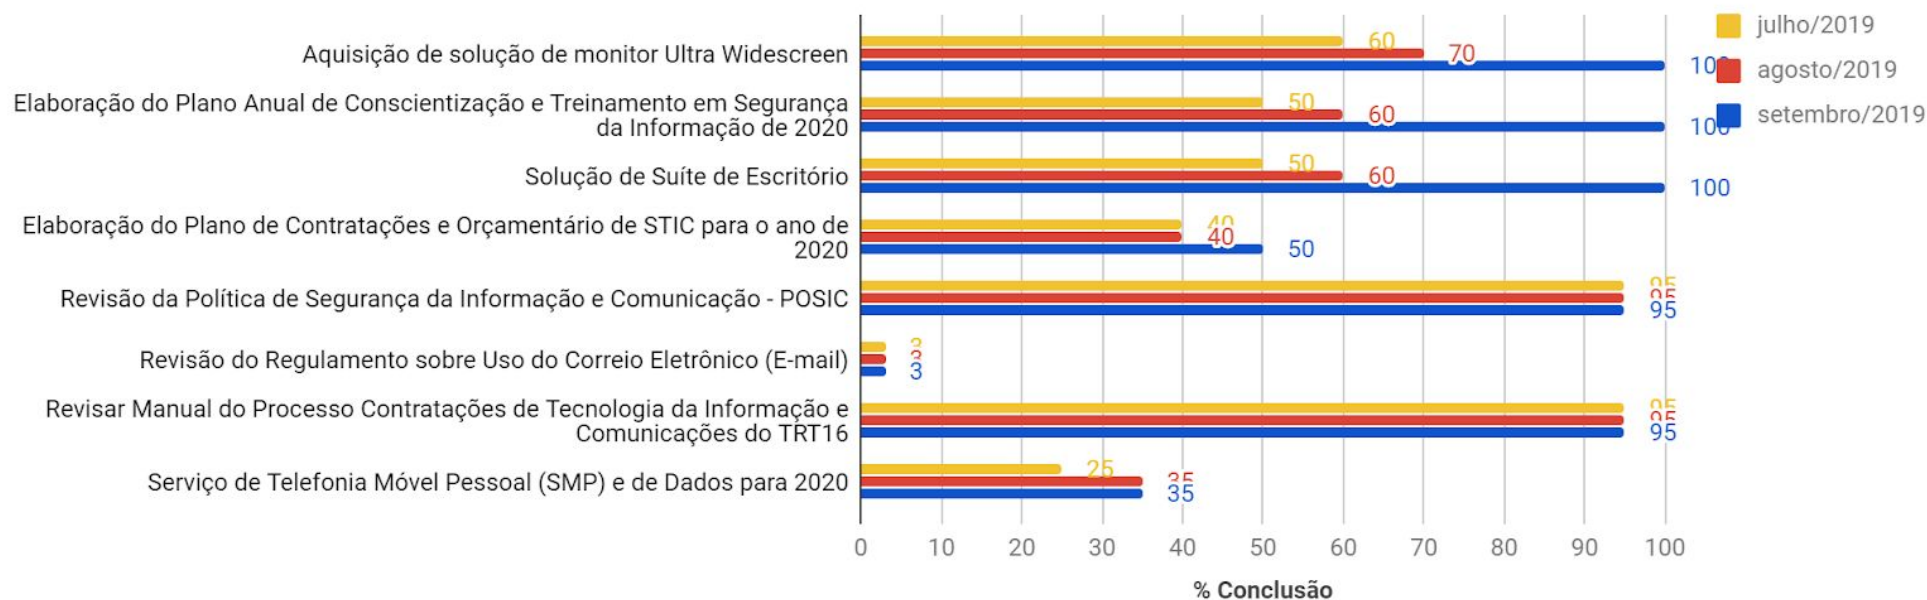

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	375	Aquisição de solução de monitor Ultra Widescreen	Stanley Araujo de Sousa	Concluído	Projeto	27/08/2018	01/10/2019	28/08/2018	30/09/2019	100	Projeto concluído com a assinatura da ata de registro de preço.

Portfólio de Projetos de TIC - Setembro/2019

2	450	Solução de Suíte de Escritório	Stanley Araujo de Sousa	Concluído	Projeto	21/11/2018	01/10/2019	17/01/2019	20/09/2019	100	Projeto concluído com as entregas: - Homologação do certame; - Assinatura e publicação das atas 74.2019 e 75.2019; - PORTARIA D.G. Nº 597/2019 de designação dos fiscais;
3	473	Elaboração do Plano Anual de Conscientização e Treinamento em Segurança da Informação de 2020	Stanley Araujo de Sousa	Concluído	Projeto	01/04/2019	01/10/2019	08/04/2019	30/09/2019	100	Projeto concluído com as entregas: - Plano aprovado em Reunião do Comitê de Segurança; - Portaria GP 712/2019 publicada;
4	454	Elaboração do Plano de Contratações e Orçamentário de STIC para o ano de 2020	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	04/01/2019	12/11/2019	04/01/2019		50	Realizada a revisão do Plano Orçamentário pelo Coordenador da CTIC. Risco: ocorrerá a mudança de gestão administrativa.
5	147	Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	09/05/2017	10/12/2019			95	Sem progresso no período. Pedido de vista regimental pela Desembargadora Ilka Esdra Silva Araújo.
6	168	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	28/06/2017	18/12/2019			95	Sem progresso no período. Pedido de vista regimental pelos Desembargadores James Magno Araújo Farias e Ilka Esdra Silva Araújo.
7	457	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2020	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	22/01/2019	16/03/2020	15/03/2019		35	Sem progresso no período. Problema: alocação de recursos humanos em outros projetos.
8	475	Revisão do Regulamento sobre Uso do Correio Eletrônico (E-mail)	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	05/04/2019	29/11/2019			3	Sem progresso no período. Problema: Alocação dos recursos humanos para outras demandas mais prioritárias.
