



TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

PORTFÓLIO DE PROJETOS DE TIC

AGOSTO/2020


EGP-TIC

SUMÁRIO


1.	RESUMO DOS PROJETOS	3
1.1.	PROJETOS INCLUÍDOS NO PORTFÓLIO	4
1.2.	PROJETOS INICIADOS	4
1.3.	PROJETOS CONCLUÍDOS	4
1.4.	PROJETOS CANCELADOS	4
2.	COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES	5
3.	SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	6
4.	SETOR DE GOVERNANÇA DE TI	8
5.	SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL	11
6.	SEÇÃO DE APOIO AO PJE	15
7.	SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE	17
8.	SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	18

1. RESUMO DOS PROJETOS


Quantidade de projetos nas unidades

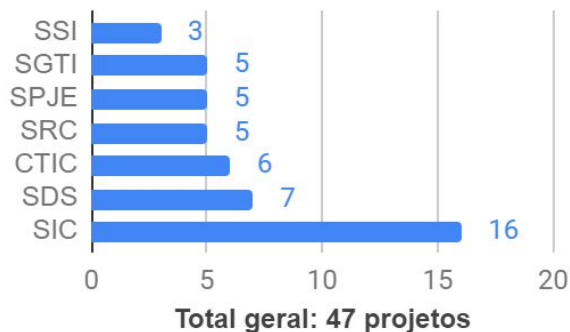


Complexidade dos projetos

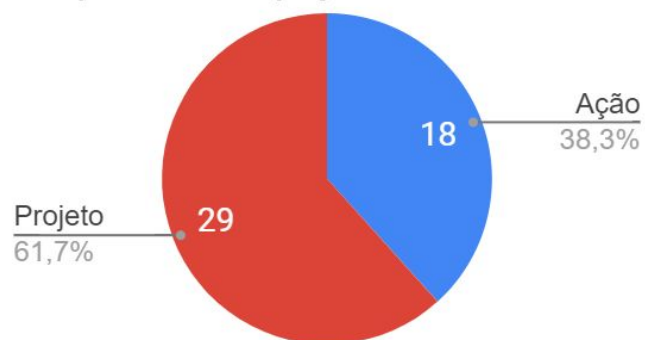

Situação dos projetos

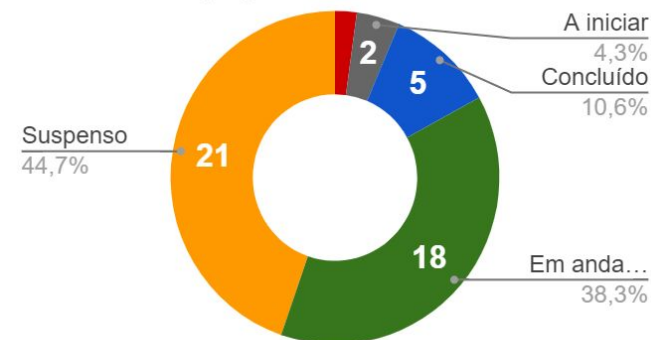

Situação dos projetos nas unidades

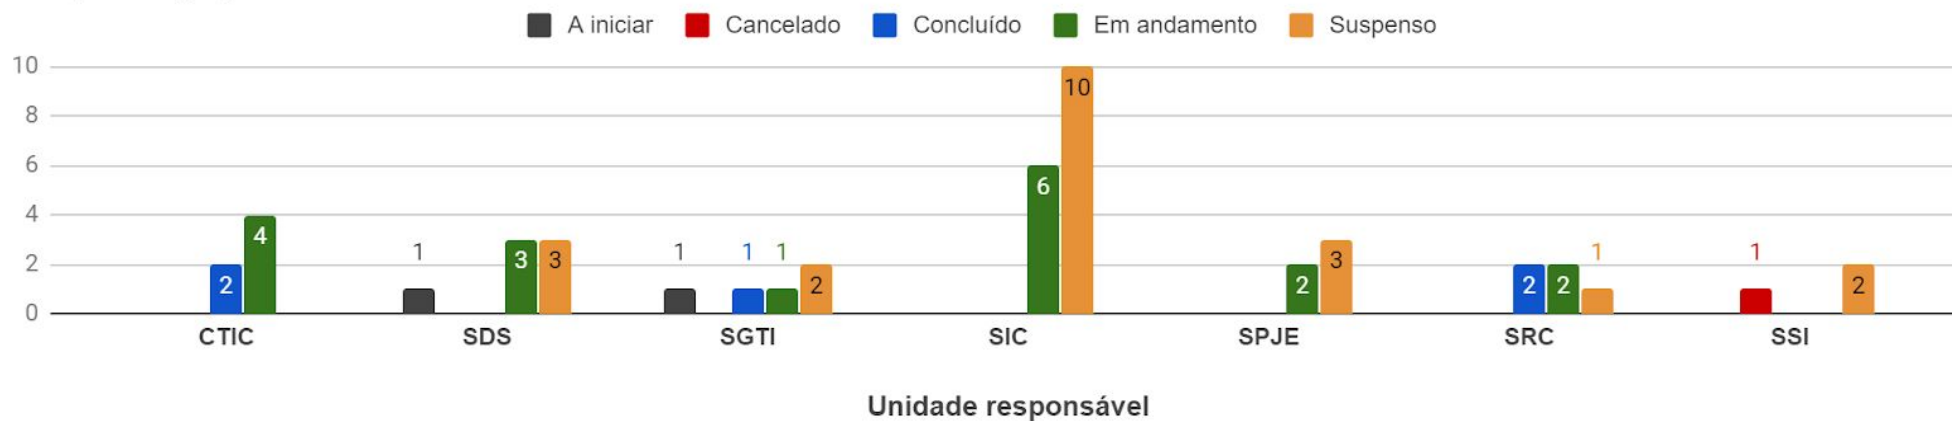

1.1. PROJETOS INCLUÍDOS NO PORTFÓLIO

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
545	Contratação de treinamento para VMware vSphere: Install, Configure, Manage	João Diego Rocha Lima	SIC	Ação	29/07/2020	01/08/2020		Em andamento

1.2. PROJETOS INICIADOS

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
545	Contratação de treinamento para VMware vSphere: Install, Configure, Manage	João Diego Rocha Lima	SIC	Ação	29/07/2020	01/08/2020		Em andamento

1.3. PROJETOS CONCLUÍDOS


<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
530	Contratação de capacitação gerencial de gerência de Central de Atendimento de TIC	Carlos Eduardo Ferreira Marins	SRC	Ação	23/04/2020	26/04/2020	28/08/2020	Concluído
532	Implantação de Videoconferência nas audiências e nas sessões	Stanley Araujo de Sousa	CTIC	Projeto	27/04/2020	28/04/2020	31/08/2020	Concluído
534	Implantação do PJe Mídias	Rafael Robinson de Sousa Neto	SGTI	Ação	06/05/2020	07/05/2020	17/08/2020	Concluído
535	Solução de Manutenção de Centrais PABX e Rede de Ramais	Carlos Eduardo Ferreira Marins	SRC	Ação	05/05/2020	05/05/2020	31/08/2020	Concluído
544	Publicação de ATA para Licenças Windows 2019 RDS	Stanley Araujo de Sousa	CTIC	Ação	07/07/2020	07/07/2020	28/08/2020	Concluído

1.4. PROJETOS CANCELADOS

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>	<i>Justificativa</i>
168	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC	Stanley Araujo de Sousa	SSI	Projeto	28/06/2017	28/06/2017	31/08/2020	Cancelado	Projeto cancelado. Motivo: Mudanças no cenário nacional em virtude da LPGD.

2. COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES


Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

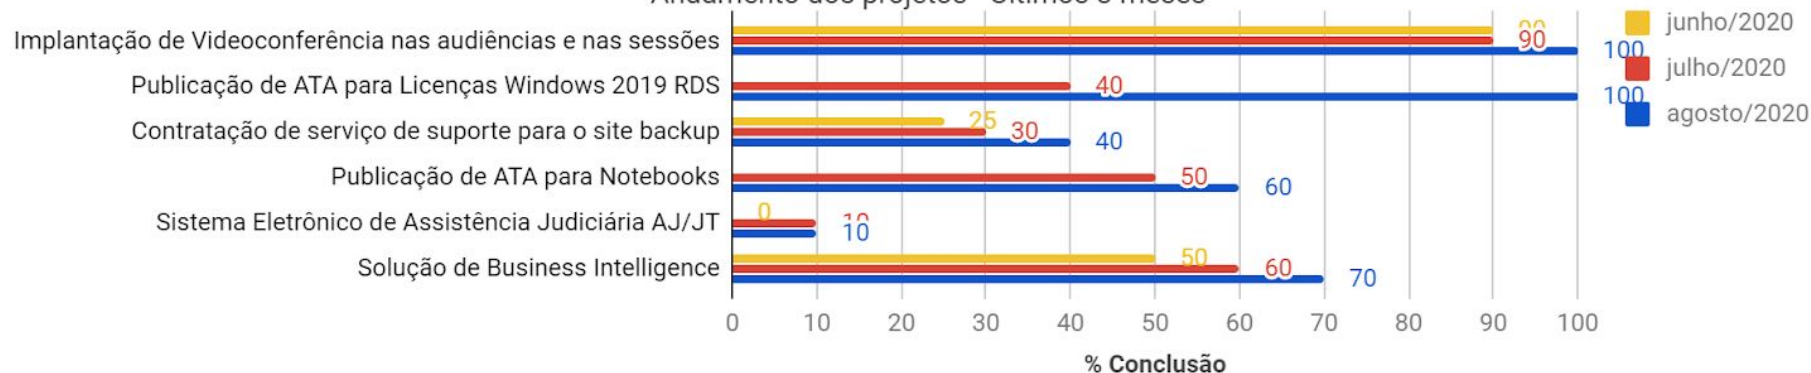

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	532	Implantação de Videoconferência nas audiências e nas sessões	Stanley Araujo de Sousa	Concluído	Projeto	27/04/2020	31/08/2020	28/04/2020	31/08/2020	100	Entrega do projeto realizada e projeto concluído. Entregas do projeto: - https://www.trt16.jus.br/servicos/para-o-cidadao-e-advogado/sessoes-ao-vivo - Ato Conjunto GP e GVP/CR N° 005/2020 - Documento Ferramenta de videoconferência do TRT16 em https://www.trt16.jus.br/teletrabalho - Manual das Sessões Telepresenciais - Advogados -TRT16 em https://www.trt16.jus.br/servicos/para-o-cidadao-e-advogado
2	544	Publicação de ATA para Licenças Windows 2019 RDS	Stanley Araujo de Sousa	Concluído	Ação	07/07/2020	28/08/2020	07/07/2020	28/08/2020	100	ARP 30 2020 publicada. Projeto finalizado.
3	519	Contratação de serviço de suporte para o site backup	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	15/01/2020	30/11/2020	19/05/2020		40	Pesquisa de Preço realizada e atualizações do ETP.

4	524	Solução de Business Intelligence	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Ação	12/02/2020	30/10/2020	12/02/2020		70	Elaboração da minuta do Edital e do contrato.
5	527	Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária AJ/JT	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Ação	27/02/2020	30/09/2020	01/07/2020		10	Participação no curso Cadastro e Validação dos Auxiliares da Justiça do Trabalho e o Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária AJ/JT;
6	543	Publicação de ATA para Notebooks	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Ação	17/06/2020	30/09/2020	07/07/2020		60	O Secretário de TIC do TRT8 informou que a DG autorizou a abertura da licitação.


3. SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

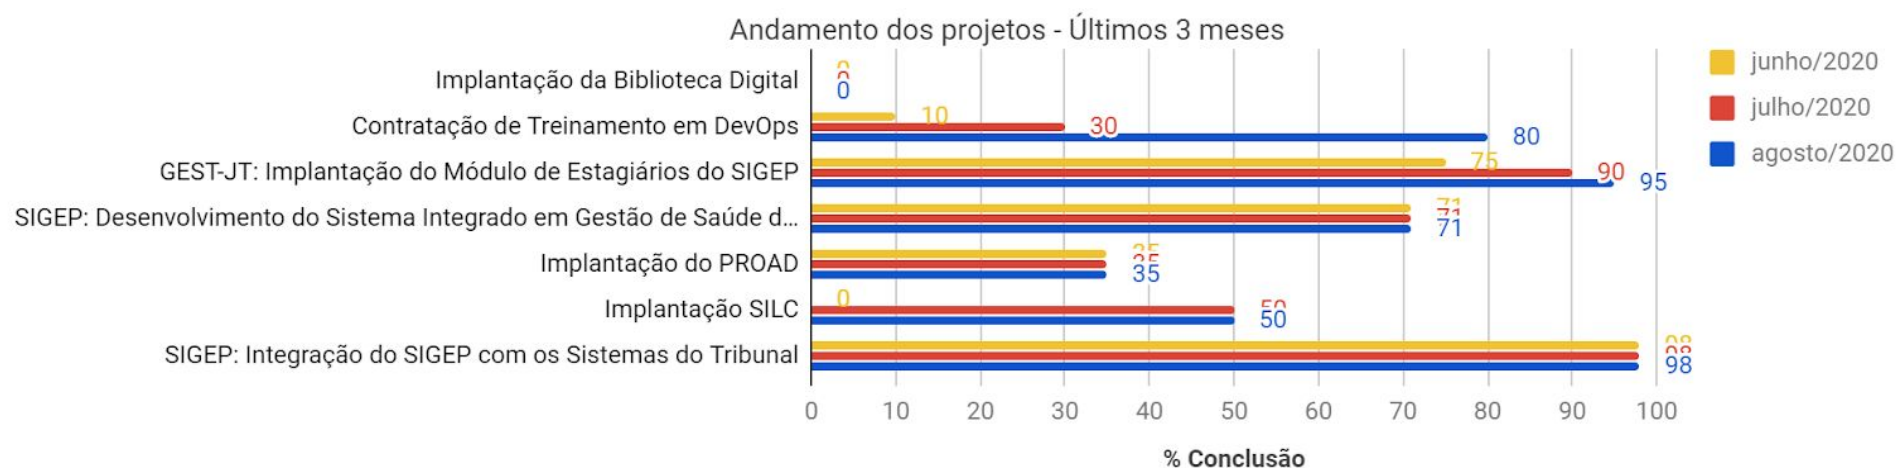

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	279	Implantação da Biblioteca Digital	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	01/01/2018	18/12/2020			0	Sem progressos no período. Projeto ainda não iniciado.
2	187	SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	Diogo Duailibe da Silva	Em andamento	Projeto	25/08/2017	19/12/2022	29/08/2017		71	- Desenvolvimento de tarefas de correção para a versão 1.15.0.1. - Planejamento e Início da Sprint 22, para desenvolvimento de funcionalidades para versão 1.16.0.0.

											- Testes de todas as funcionalidades em ambiente com Oracle atualizado para versão 19.
3	526	Contratação de Treinamento em DevOps	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Ação	12/03/2020	21/08/2020	18/03/2020		80	Contratação realizada. Nota de empenho emitida. Treinamento em andamento.
4	533	GEST-JT: Implantação do Módulo de Estagiários do SIGEP	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Ação	06/05/2020	30/09/2020	07/05/2020		95	ENTREGA 1: Preparação da Infra estrutura (100% Concluída) ENTREGA 2: Migração de Dados (100% Concluída) ENTREGA 3: Integração com outros sistemas do tribunal (100% Concluída) ENTREGA 4: Disponibilização em produção, com Manual de Operações (Em andamento: 80%) Aguardando SIC disponibilizar ambiente de PRODUÇÃO
5	19	Implantação SILC	Andre Pereira Nunes	Suspensão	Projeto	06/02/2018	18/12/2020	23/04/2018		50	Sem progressos no período. Projeto ainda não retomado.
6	32	SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	Andre Pereira Nunes	Suspensão	Projeto	24/05/2018	01/01/2021	04/06/2018		98	Sem progressos no período. Projeto suspenso até a efetivação da data de transição, atualmente em 01/01/2021. Está marcada uma reunião com o chefe da folha após o retorno de férias deste para negociar uma data mais próxima.
7	499	Implantação do PROAD	Andre Pereira Nunes	Suspensão	Projeto	28/02/2019	18/12/2020	28/08/2019		35	Sem progressos no período. Aguardando Avaliação do SIC para disponibilização do sistema em Homologação. ENTREGA 1: Preparação da Infraestrutura Em andamento 90% ENTREGA 2: Acordo de Cooperação Técnica com o TRT12 (Em andamento: 25%) ENTREGA 3: Configuração do Sistema Nova ENTREGA 4: Adequação do SUAP e SISPAE Nova ENTREGA 5: Visita Técnica e Treinamento Nova ENTREGA 6: PROAD e PROAD-OUV em Produção Nova

4. SETOR DE GOVERNANÇA DE TI

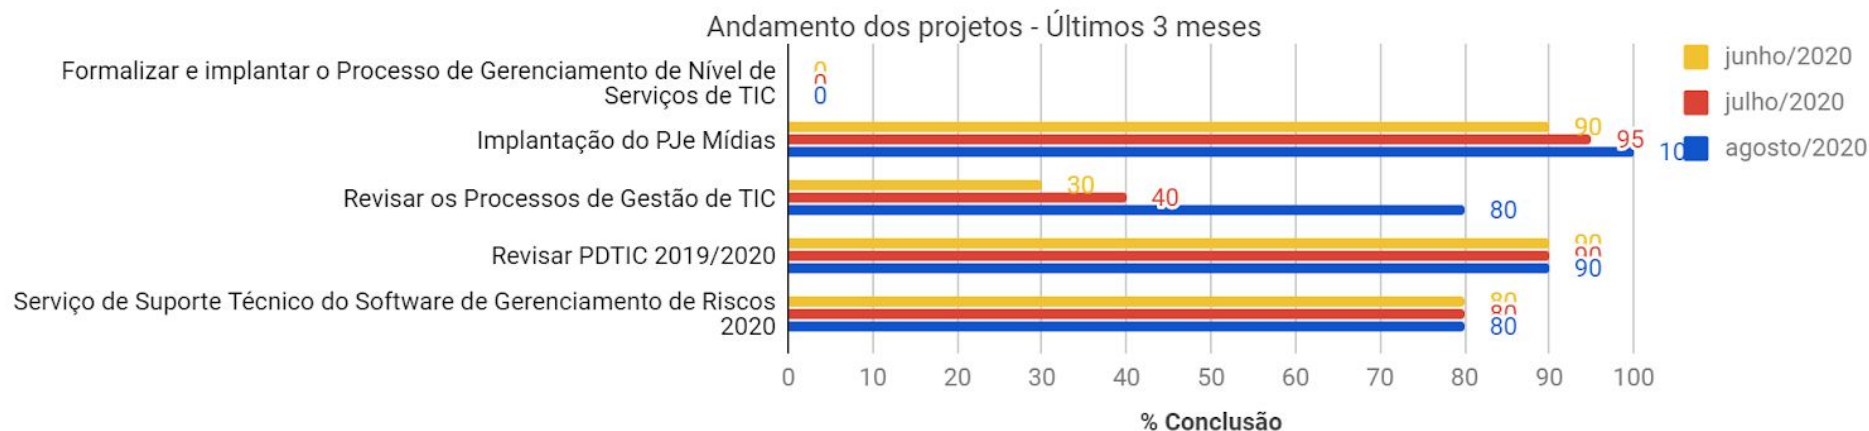


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	528	Formalizar e implantar o Processo de Gerenciamento de Nível de Serviços de TIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	A iniciar	Ação	01/04/2020	30/11/2020			0	Sem progresso no período. Postergado o início de execução do projeto devido a priorização de outras atividades/projetos.
2	534	Implantação do PJe Mídias	Rafael Robinson de Sousa Neto	Concluído	Ação	06/05/2020	31/08/2020	07/05/2020	17/08/2020	100	Projeto encerrado com sucesso com o aceite formal da Diretoria-Geral e da Presidência (doc. 014 e 015 do PA. 3296/2020). As principais entregas realizadas pelo projeto foram: - Sistema validado e testado (Portal do PJe Mídias e Audiência Digital); - Criação da documentação do sistema e disponibilização de atendimento para o serviço através da Central de Atendimento de TI; - Ferramenta disponibilizada, suporte inicial aos usuário fornecido e treinamento realizado.
3	531	Revisar os Processos de Gestão de TIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Projeto	24/04/2020	30/09/2020	27/04/2020		80	Evolução dos entregáveis: - Planejamento e Gerenciamento das

											<ul style="list-style-type: none"> Capacitações de TIC atualizado - Em andamento 90% - Gerenciamento de Portfólio de TIC atualizado - Concluído 100% - Gerenciamento de Demandas atualizado - Concluído 100% - Gerenciamento de Projetos de TIC atualizado - Em andamento 80% - Gerenciamento de Incidentes atualizado - Em andamento 90% - Gerenciamento de Requisição atualizado - Em andamento 90% - Gerenciamento da Central de Atendimento de TIC atualizado Em andamento 90% - Gerenciamento de Contratações de Soluções de TIC atualizado - Em andamento 20% - Gerenciamento de Problemas atualizado - Concluído 100% - Gerenciamento de Mudança e Liberação atualizado - Concluído 100% - Gerenciamento de Software atualizado - Concluído 100% - Planejamento Estratégico e Tático de TIC atualizado - Concluído 100% - Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC atualizado - Em andamento 90%
4	483	Serviço de Suporte Técnico do Software de Gerenciamento de Riscos 2020	Jose Augusto	Suspensão	Ação	25/04/2019	18/12/2020	16/01/2020		80	Sem progresso no período. O P.A está parado na presidência desde 16/06/2020 aguardando deliberação.
5	509	Revisar PDTIC 2019/2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	Suspensão	Ação	04/11/2019	30/09/2020	14/11/2019		90	<ul style="list-style-type: none"> - Realizada um reunião com o Presidente para explicar a revisão do PDTIC. A minuta da revisão do PDTIC continua aguardando apreciação e publicação da matéria pela Presidência. <p>Evolução dos entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avaliação do resultado das metas e ações previstas para 2019 - Concluída 100% - Necessidades mapeadas e priorizadas para 2020 - Concluída 100%

																							<ul style="list-style-type: none">- Minuta da nova versão do PDTIC elaborada - Concluída 100%- Nova versão do PDTIC apreciada pelo CGovTIC - Em andamento 100%- Nova versão do PDTIC publicada pela Presidência - Em andamento 50%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

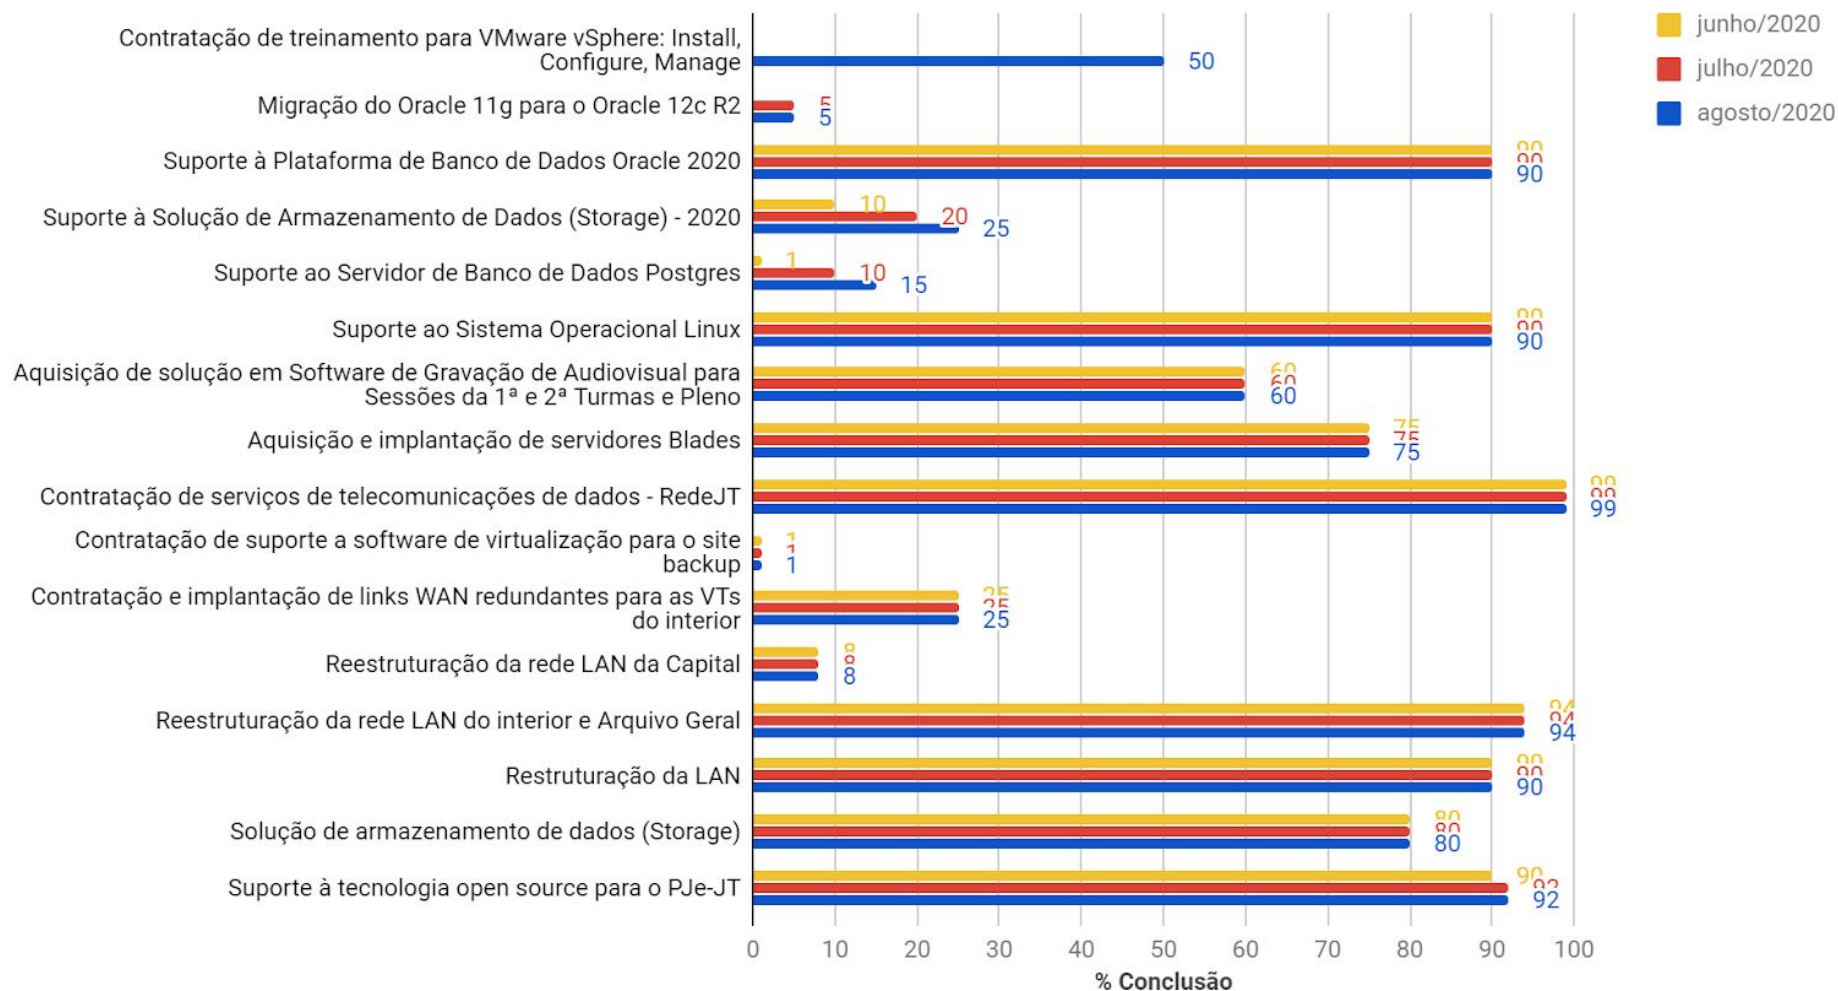


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	461	Suporte ao Sistema Operacional Linux	Fernando Rola Ferreira Filho	Em andamento	Projeto	29/01/2019	02/10/2020	30/01/2019		90	Incluído os seguinte documentos no PA 685/2019: - EDITAL PE TRT5 - ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO
2	536	Suporte à Plataforma de Banco de Dados Oracle 2020	Leonel Pereira	Em andamento	Projeto	13/05/2020	27/10/2020	13/05/2020		90	Acompanhamento da Renovação/Contratação do serviço: - Houve o reconhecimento da inexigibilidade; - Foi emitida nota de empenho correspondente ao período de 28/10/2020 a 31/10/2020; - A nota de empenho foi encaminhada ao fornecedor; - O PA 2539/2020 foi encaminhado à SADM para elaboração da minuta do contrato.
3	538	Suporte à Solução de Armazenamento de Dados (Storage) - 2020	João Diego Rocha Lima	Em andamento	Projeto	04/06/2020	31/08/2020	24/06/2020		25	ETP concluído e encaminhado à DG.
4	540	Suporte ao Servidor de Banco de Dados Postgres	Romulo Moura	Em andamento	Projeto	15/06/2020	31/12/2020	22/06/2020		15	Preenchimento de pesquisa encaminhado pelo TRT23 que está coordenando o processo de contratação nacional.
5	542	Migração do Oracle 11g para o Oracle 12c R2	Leonel Pereira	Em andamento	Projeto	06/07/2020	30/11/2020	07/07/2020		5	- Tendo em vista que o suporte à versão 12cR2 findará em 30/11/2020 e que a versão 12cR1 é menos estável e só terá suporte até julho de 2022 (https://www.oracle.com/us/assets/lifetime-support-technology-069183.pdf), a migração será feita para a versão 19c. Deve-se ressaltar que a versão 19c é a versão de longo prazo, contando com suporte premier até abril de 2024 e com suporte estendido até abril de 2027. - Foi realizada uma reunião com o pessoal do TRT5 e foram feitas consultas a outros regionais acerca da versão do banco e da versão do SO. Então, levando em conta a mudança da versão do Oracle Database e

											também considerando a experiência que já temos no uso do Oracle Linux, o fato de quase todos os TRTs consultados usarem o Database sobre o Oracle Linux, as máquinas serão refeitas usando a versão do Oracle Linux compatível com as máquinas, ou seja a 7.4.
6	545	Contratação de treinamento para VMware vSphere: Install, Configure, Manage	João Diego Rocha Lima	Em andamento	Ação	29/07/2020	31/08/2020	01/08/2020		50	ETP concluído e encaminhado para o setor de Governança.
7	233	Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspensão	Projeto	12/01/2018	31/08/2020	19/01/2018		99	Sem reporte do gerente.
8	358	Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno	Pablo Teofilo Durans	Suspensão	Projeto	06/07/2018	21/12/2020	22/10/2018		60	Sem progresso no período. Riscos e Problemas: A administração tem cobrado mais agilidade na entrega das demandas de aplicação, o que ocupará o único integrante da equipe do projeto em outras demandas
9	442	Reestruturação da LAN	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspensão	Projeto	17/10/2018	30/09/2020	01/11/2018		90	Sem reporte do gerente.
10	455	Aquisição e implantação de servidores Blades	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Suspensão	Projeto	15/01/2019	02/10/2020	31/01/2019		75	- Sem progresso no período. A Administração foi informada sobre o Recebimento Definitivo pelo integrante da Comissão de Recebimento (doc.089), a liberação do valor retido foi solicitado no dia 26/05/2020. A Contratada aguarda o pagamento do valor. Riscos e Problemas: - Setor com tarefas e demandas em excesso, sobretudo, devido a escassez de recursos humanos, ocasionando interrupção no projeto e atraso nas atividades/projetos desenvolvidos.
11	476	Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo Geral	Antoniell Magalhaes de Carvalho	Suspensão	Projeto	01/04/2019	31/12/2020	16/04/2019		94	Sem reporte do gerente.
12	480	Contratação e implantação de links WAN	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspensão	Projeto	15/04/2019	30/09/2020	08/03/2019		25	Sem reporte do gerente.

		redundantes para as VTs do interior									
13	490	Solução de armazenamento de dados (Storage)	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Suspensão	Projeto	18/06/2019	01/10/2020	18/06/2019		80	Sem progresso no período. Riscos: - Devido a falta de recursos de armazenamento, a prestação de novos serviços poderá ficar prejudicada. É necessário a aquisição de novos storages e gavetas para o PJe e os sistemas administrativos, conforme sinalizado para a CTIC. - A ausência futura do recurso de armazenamento (storage) poderá ocasionar em indisponibilidade dos serviços de TI nos Tribunais.
14	517	Suporte à tecnologia open source para o PJe-JT	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspensão	Projeto	09/12/2019	31/08/2020	09/12/2019		92	Sem reporte do gerente.
15	518	Reestruturação da rede LAN da Capital	Antoniél Magalhaes de Carvalho	Suspensão	Projeto	13/01/2020	31/12/2020	27/01/2020		8	Sem reporte do gerente. Situação dos entregáveis: - Switches do Bloco C Em andamento 50% - Switches do Bloco B Nova 0% - Switches do Bloco A Nova 0% - Switches do Forum Astolfo Serra Nova 0% - Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e Storages do FAS Nova 0% - Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e Storages Sede Nova 0% - Alteração dos IPs de Servidores Sede Nova 0%
16	541	Contratação de suporte a software de virtualização para o site backup	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Suspensão	Projeto	17/06/2020	16/12/2020	22/06/2020		1	Sem progresso no período. Riscos e problemas: - Falta de orçamento para concluir a contratação; - Manutenção do serviço solução de virtualização do site backup sem suporte técnico especializado frente à crescente demanda de serviços internos;

6. SEÇÃO DE APOIO AO PJE

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

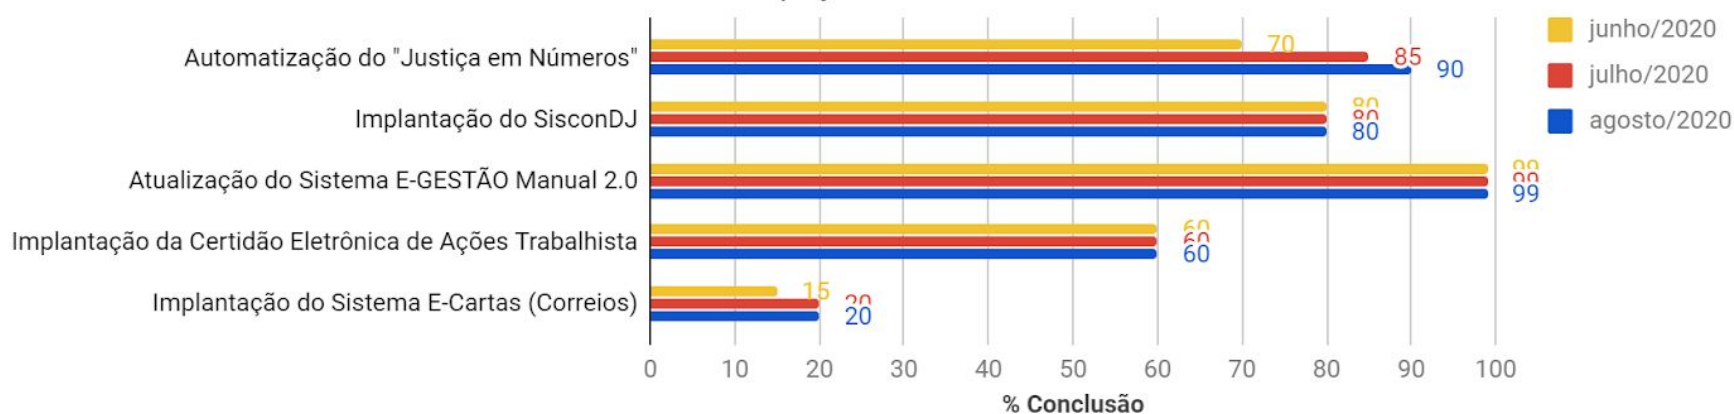


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	477	Implantação do SisconDJ	Gilberto Cunha Filho	Em andamento	Ação	05/12/2018	30/09/2020	01/04/2019		80	- Sistema em homologação; - Encontrado erros de acesso com o token epass2003 - Testes básicos com outros tokens homologados - Início de de homologação negocial pelo servidor Gutemberg;
2	481	Automatização do "Justiça em Números"	Djeison Rafael Neitzke	Em andamento	Ação	23/04/2019	30/09/2020	19/06/2019		90	- Diante da prorrogação do prazo de envio dos xmls para 28/08, foram realizadas correções e melhorias no gerador de xml e no transmissor dos arquivos, e todos os processos do PJe 1º e 2º graus foram reenviados ao CNJ com essas modificações. - Em resumo: implementados 5 novos campos que não haviam sido implementados a tempo da primeira carga completa enviada antes do prazo final original (31/07/2020). São eles: orgaoJulgador, magistradoProlator, tipoDecisao, responsavelMovimento e

											tipoResponsavelMovimento (todos internos à tag "movimento"). - Após as melhorias no gerador, uma nova carga completa de xmls para todos os processos do PJe foi gerada durante os dias 14 e 20/08, totalizando 364.035 processos. - A transmissão da carga completa ao CNJ foi realizada no dia 26/08.
3	56	Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0	Djeison Rafael Neitzke	Suspenso	Projeto	06/04/2018	30/11/2020	06/04/2018		99	Sem progresso no período. Aguarda-se a reunião do demandante (Comitê Gestor Regional do E-Gestão) para o aceite formal da entrega do projeto.
4	504	Implantação do Sistema E-Cartas (Correios)	Gutemberg Pereira Vidal Santos	Suspenso	Ação	10/09/2019	10/12/2020	01/11/2019		20	Sem progresso no período. O Setor de Infraestrutura pediu o prazo de 90 dias para implantar a estrutura de "containers", indispensável para prosseguimento do projeto.
5	506	Implantação da Certidão Eletrônica de Ações Trabalhista	Gutemberg Pereira Vidal Santos	Suspenso	Ação	27/09/2018	04/10/2020	14/10/2019		60	Sem progresso no período. Sugestão de cancelamento do projeto considerando que: - A versão 2.5 do PJe veio com a funcionalidade OBJETO deste sistema no que diz respeito aos processos eletrônicos; - O TRT 16 recebeu o selo de 100% PJe;

7. SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

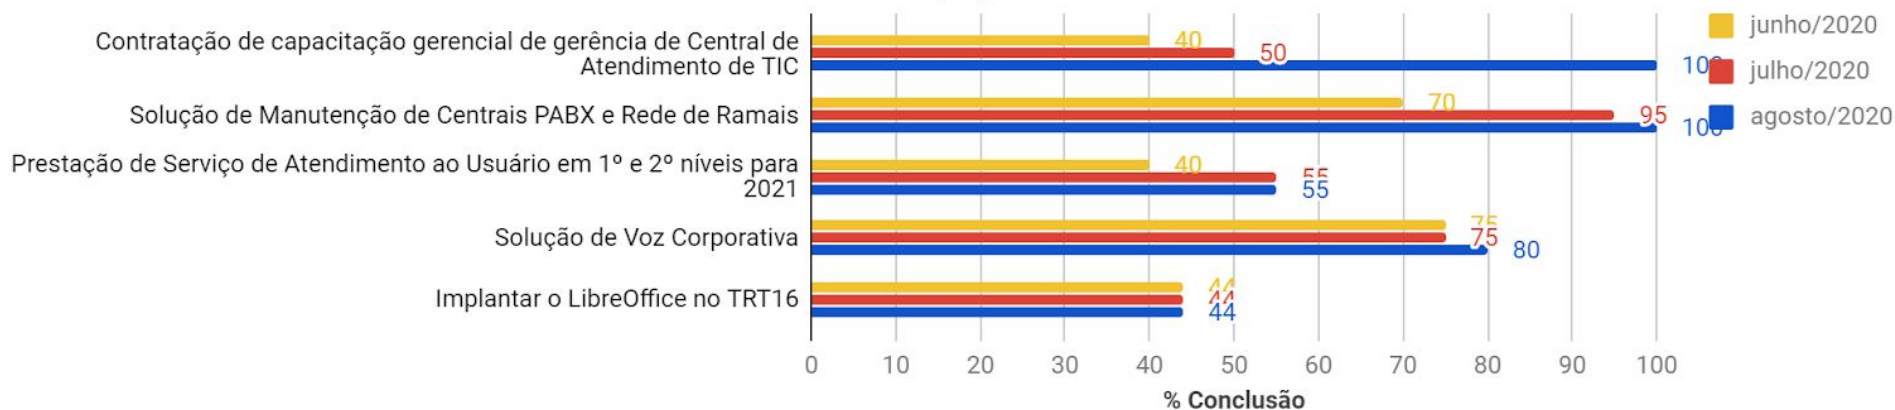


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	530	Contratação de capacitação gerencial de gerência de Central de Atendimento de TIC	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Concluído	Ação	23/04/2020	28/08/2020	26/04/2020	28/08/2020	100	- O curso foi realizado no período de 19 a 21 de agosto. - Ação concluída.
2	535	Solução de Manutenção de Centrais PABX e Rede de Ramais	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Concluído	Ação	05/05/2020	28/08/2020	05/05/2020	31/08/2020	100	- Foi assinado o aditivo contratual com a empresa Bacone por um período de 06 meses, com vigência até 01/01/2021. - O projeto foi concluído, conforme TEF e TEP preenchidos.
3	381	Solução de Voz Corporativa	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	27/08/2018	30/09/2020	31/08/2018		80	- As pendências de infraestrutura, de ambiente físico e de informações de competência do TRT16 foram entregues. - A empresa já iniciou a configuração remota para implantação da central e realizou visita técnica nas dependências físicas do TRT16. - Aguardamos o agendamento para o início dos serviços presenciais e o cronograma final

											para finalização da implantação e treinamentos.
4	537	Prestação de Serviço de Atendimento ao Usuário em 1º e 2º níveis para 2021	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	18/05/2020	18/12/2020	18/05/2020		55	O PA foi enviado para a Presidência para a aprovação, mas o TR foi alvo de vários questionamentos e recomendações de alterações, às quais foram realizadas; Riscos: - O PA está há bastante tempo em análise no Gabinete da Presidência, o que pode atrasar o processo licitatório. - Por conta disso e de alguns pontos relacionados a orçamento é muito provável que o contrato atual precise ser renovado em caráter emergencial.
5	351	Implantar o LibreOffice no TRT16	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Suspensão	Projeto	25/06/2018	18/12/2020	25/06/2018		44	Sem progresso no período. Não está sendo possível realizar ações nos computadores dos usuários ou verificar a instalação nesse cenário de pandemia.

8. SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

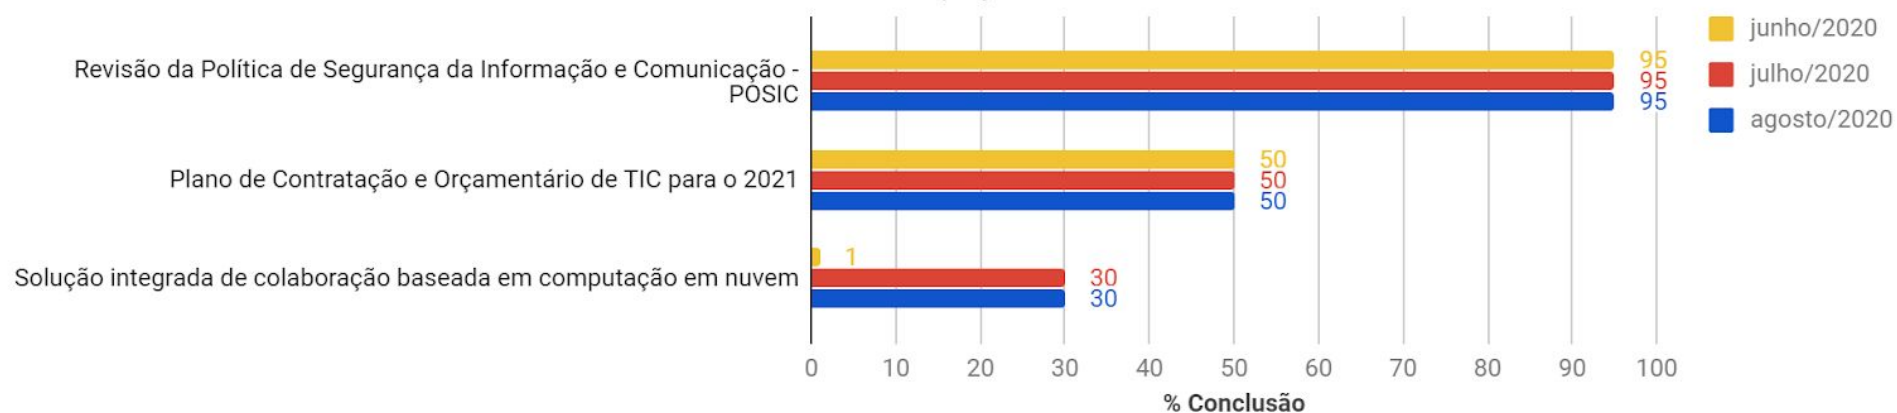

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	168	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC	Stanley Araujo de Sousa	Cancelado	Projeto	28/06/2017	02/09/2020	28/06/2017	31/08/2020	95	Projeto cancelado. Motivo: Mudanças no cenário nacional em virtude da LPGD.
2	525	Plano de Contratação e Orçamentário de TIC para o 2021	Stanley Araujo de Sousa	Suspenso	Ação	18/02/2020	30/10/2020	18/02/2020		50	Sem progresso no período. Riscos e Problemas: Pandemia e priorização de outros projetos.
3	539	Solução integrada de colaboração baseada em computação em nuvem	Jose Augusto	Suspenso	Projeto	17/06/2020	31/12/2020	19/06/2020		30	Sem progresso no período. Servidor alocado na contratação extra das licenças gsuite enterprise.
