



TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

PORTFÓLIO DE PROJETOS DE TIC

JUNHO/2020

EGP-TIC

SUMÁRIO


1.	RESUMO DOS PROJETOS	3
1.1.	PROJETOS INCLUÍDOS NO PORTFÓLIO	4
1.2.	PROJETOS INICIADOS	4
1.3.	PROJETOS CONCLUÍDOS	4
1.4.	PROJETOS CANCELADOS	5
2.	COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES	5
3.	SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	7
4.	SETOR DE GOVERNANÇA DE TI	9
5.	SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL	12
6.	SEÇÃO DE APOIO AO PJE	15
7.	SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE	17
8.	SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	19

1. RESUMO DOS PROJETOS


Quantidade de projetos nas unidades




Complexidade dos projetos

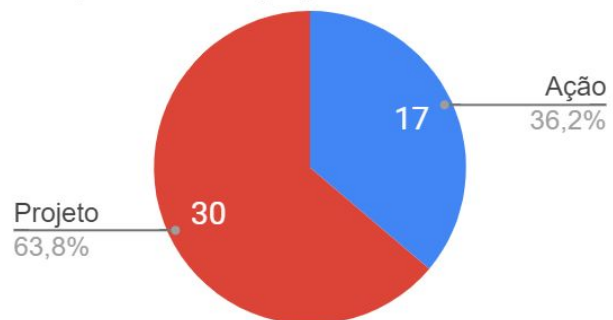

Situação dos projetos

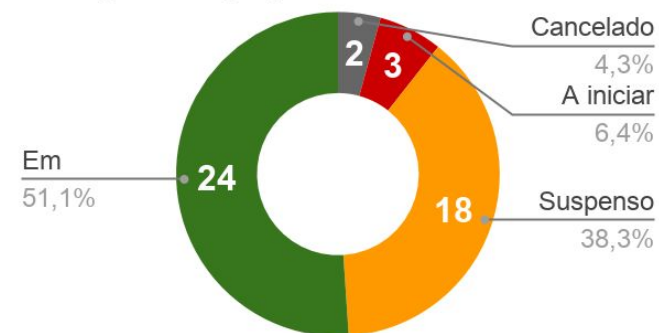

Situação dos projetos nas unidades

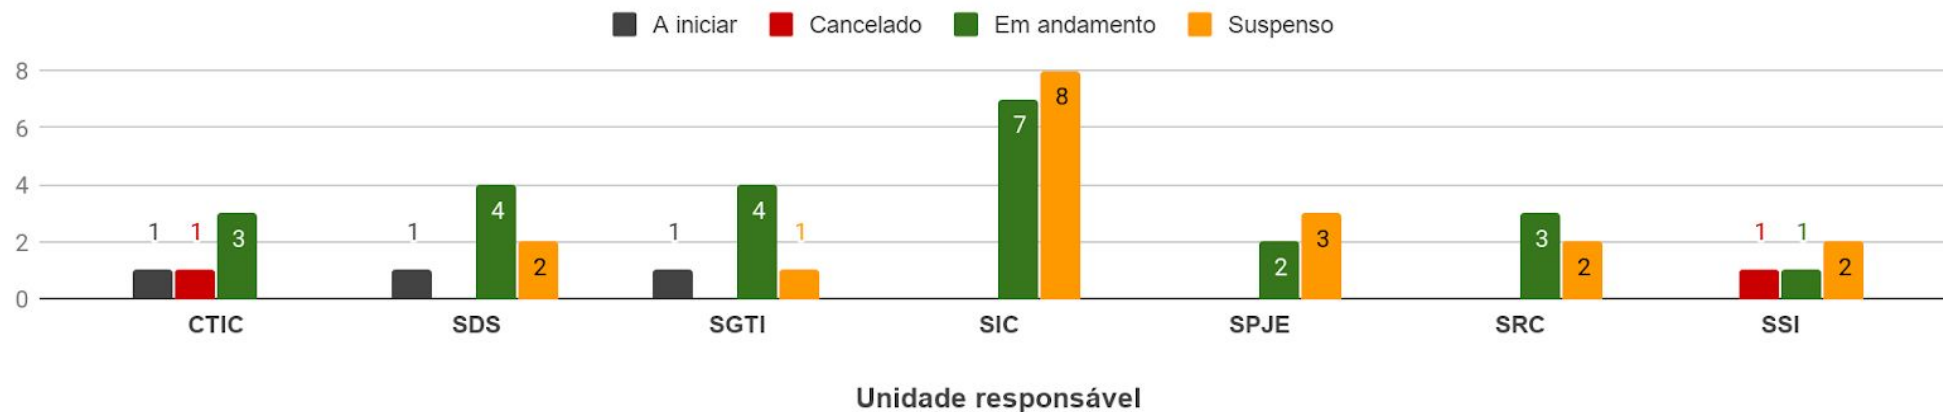

1.1. PROJETOS INCLUÍDOS NO PORTFÓLIO

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
538	Suporte à Solução de Armazenamento de Dados (Storage) - 2020	João Diego Rocha Lima	SIC	Projeto	04/06/2020	24/06/2020		Em andamento
539	Solução integrada de colaboração baseada em computação em nuvem	Romulo Moura	SSI	Projeto	17/06/2020	19/06/2020		Em andamento
540	Suporte ao Servidor de Banco de Dados Postgres	Romulo Moura	SIC	Projeto	15/06/2020	22/06/2020		Em andamento
541	Contratação de suporte a software de virtualização para o site backup	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	SIC	Projeto	17/06/2020	22/06/2020		Em andamento

1.2. PROJETOS INICIADOS


<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
538	Suporte à Solução de Armazenamento de Dados (Storage) - 2020	João Diego Rocha Lima	SIC	Projeto	04/06/2020	24/06/2020		Em andamento
539	Solução integrada de colaboração baseada em computação em nuvem	Romulo Moura	SSI	Projeto	17/06/2020	19/06/2020		Em andamento
540	Suporte ao Servidor de Banco de Dados Postgres	Romulo Moura	SIC	Projeto	15/06/2020	22/06/2020		Em andamento
541	Contratação de suporte a software de virtualização para o site backup	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	SIC	Projeto	17/06/2020	22/06/2020		Em andamento

1.3. PROJETOS CONCLUÍDOS

1.4. PROJETOS CANCELADOS

Id	Nome	Gerente do projeto	Unidade responsável	Tipo	Data da demanda	Início realizado	Fim realizado	Status	Justificativa
147	Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16	Stanley Araujo de Sousa	SSI	Projeto	09/05/2017	09/05/2019	30/06/2020	Cancelado	Projeto cancelado. Motivo: Atualização de atos normativos que compõe o manual. Novo projeto de revisão será aberto.
521	Interligação dos datacenters do TRT16 por Fibra Óptica	Stanley Araujo de Sousa	CTIC	Projeto	15/01/2020	21/01/2020	30/06/2020	Cancelado	Projeto cancelado. Motivo: ausência de Engenheiro Eletricista. Não há no quadro de TI servidores especializado nessa área de conhecimento. Assim, servidores serão capacitados e o projeto será transferido para 2021.


2. COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

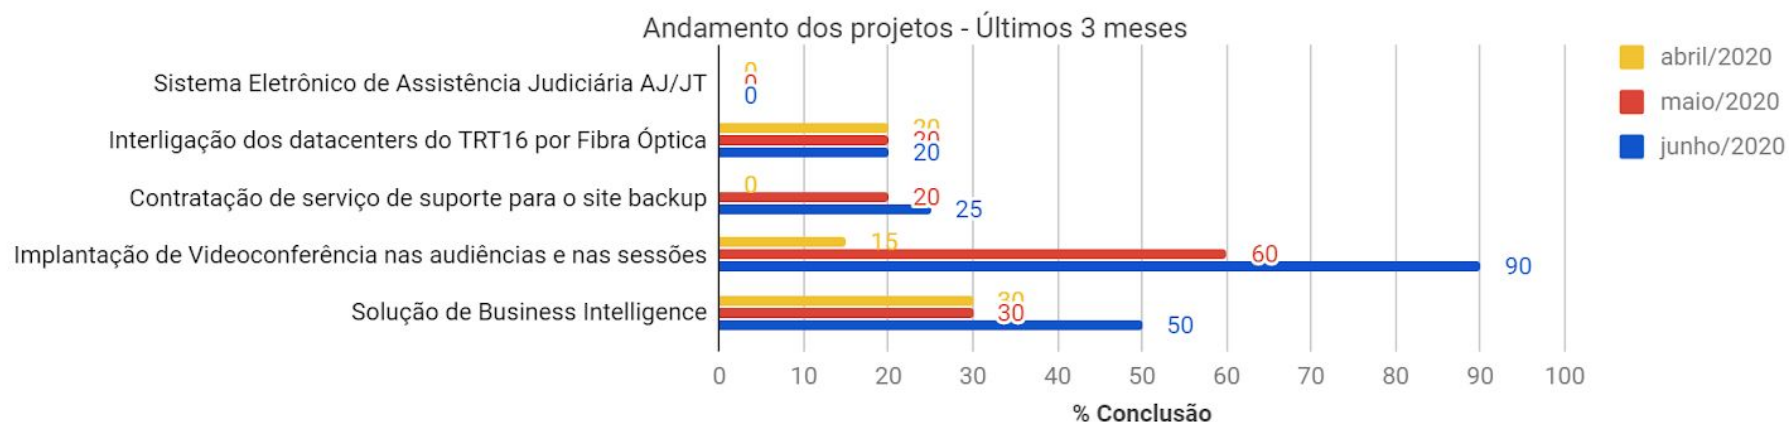

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	527	Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária AJ/JT	Stanley Araujo de Sousa	A iniciar	Ação	27/02/2020	30/09/2020			0	Sem progresso no período. O projeto é coordenado e centralizado pelo TST, assim, não temos muita influência sobre o andamento. Estamos a espera do treinamento das unidades a ser ministrado pelo TST.

2	521	Interligação dos datacenters do TRT16 por Fibra Óptica	Stanley Araujo de Sousa	Cancelado	Projeto	15/01/2020	06/07/2020	21/01/2020	30/06/2020	20	Projeto cancelado. Motivo: ausência de Engenheiro Eletricista. Não há no quadro de TI servidores especializado nessa área de conhecimento. Assim, servidores serão capacitados e o projeto será transferido para 2021.
3	519	Contratação de serviço de suporte para o site backup	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	15/01/2020	28/08/2020	19/05/2020		25	<ul style="list-style-type: none"> - Tratativas para realizar aditivo no contrato do nobreak de 40 kva da sede a fim de cobrir os 2 nobreaks de 40 kva do FAS; - Solicitação a DG para designação de integrantes técnicos da engenharia e da eletricidade. <p>Riscos e problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausência de engenheiro eletricista; - Dificuldade em realizar o aditivo; - Há risco de haver dois contratos de manutenção de nobreaks de 40kva com 2 objetos idênticos com preços diferentes.
4	524	Solução de Business Intelligence	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Ação	12/02/2020	31/08/2020	12/02/2020		50	<ul style="list-style-type: none"> - ETP concluído; - Elaboração do TR com participação de outros regionais.
5	532	Implantação de Videoconferência nas audiências e nas sessões	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	27/04/2020	15/07/2020	28/04/2020		90	<ul style="list-style-type: none"> - Sessões de julgamento da 1ª Turma realizada com sucesso; - Treinamento do funcionário da empresa (Iury) sobre a transmissão finalizado; - Alinhamento com a Secretaria do Pleno sobre o procedimento de transmissão finalizado; - Fornecimento de número de celular para atendimento urgente dos desembargadores da sessão;

3. SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

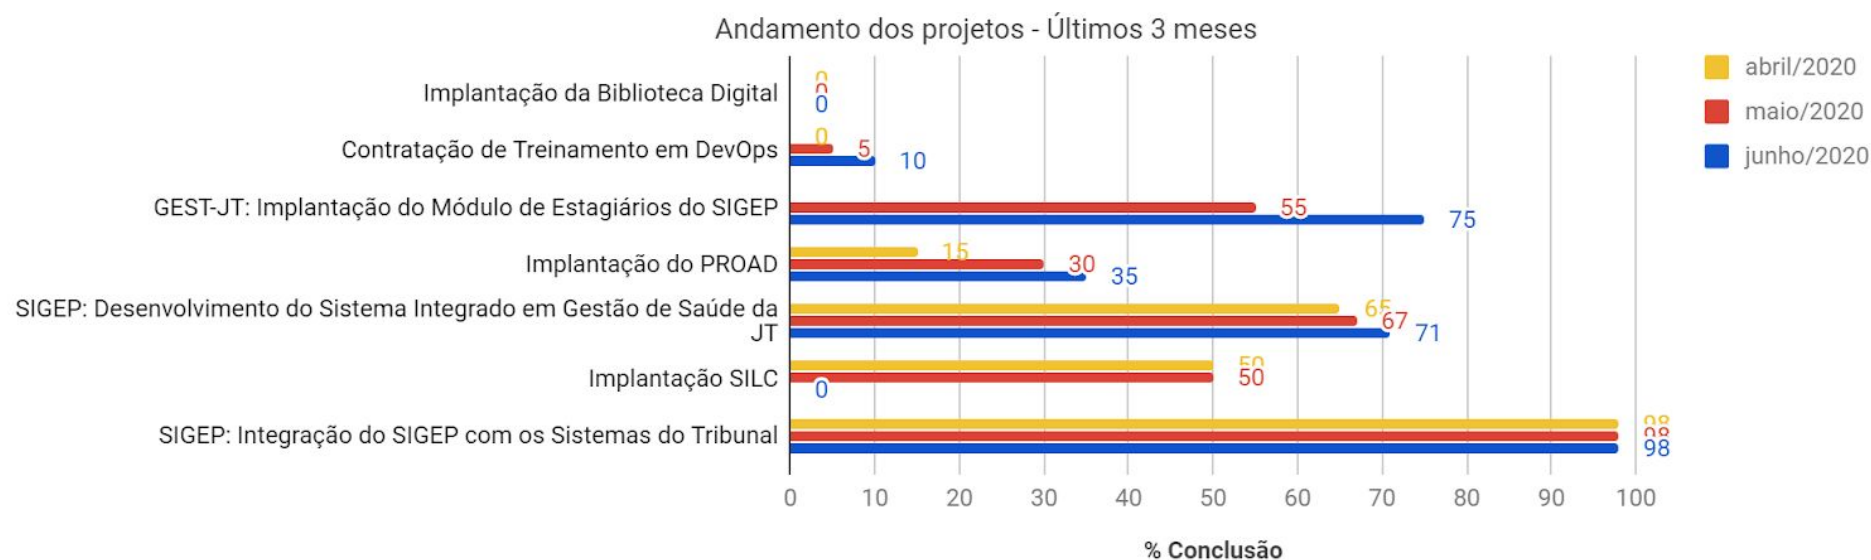


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	279	Implantação da Biblioteca Digital	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	01/01/2018	18/12/2020			0	Sem progressos no período. Projeto previsto para execução no segundo semestre de 2020.
2	187	SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	Diogo Duailibe da Silva	Em andamento	Projeto	25/08/2017	19/12/2022	29/08/2017		71	<ul style="list-style-type: none"> - Refatoração de parte da fase 1 dos Programas de Saúde Ocupacional - Conclusão da fase 2 dos Programas de Saúde Ocupacional - Correções de Bugs detectados no Redmine Nacional - Fechamento das versão 1.14.0.2 e 1.14.0.3 de correções de erro - Geração da Release Candidate 1 da versão 1.15.0.0 para homologação do Grupo de Negócio.

3	499	Implantação do PROAD	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	28/02/2019	30/09/2020	28/08/2019		35	Evolução dos entregáveis: ENTREGA 1: Preparação da Infraestrutura Em andamento 90%: 3 tarefas realizadas ENTREGA 2: Acordo de Cooperação Técnica com o TRT12 (Em andamento: 25%) ENTREGA 3: Configuração do Sistema Nova ENTREGA 4: Adequação do SUAP e SISPAE Nova ENTREGA 5: Visita Técnica e Treinamento Nova ENTREGA 6: PROAD e PROAD-OUV em Produção Nova
4	526	Contratação de Treinamento em DevOps	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Ação	12/03/2020	30/09/2020	18/03/2020		10	Coleta de proposta da 4linux;
5	533	GEST-JT: Implantação do Módulo de Estagiários do SIGEP	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Ação	06/05/2020	31/07/2020	07/05/2020		75	ENTREGA 1: Preparação da Infra estrutura (Em andamento: 80%) ENTREGA 2: Migração de Dados (100% Concluída) ENTREGA 3: Integração com outros sistemas do tribunal (Em andamento: 80%): 3 tarefas realizadas; ENTREGA 4: Disponibilização em produção, com Manual de Operações (Em andamento: 50%): 3 tarefas realizadas;
6	19	Implantação SILC	Andre Pereira Nunes	Suspenso	Projeto	06/02/2018	18/12/2020	23/04/2018		0	Sem progressos no período. Projeto previsto para execução no segundo semestre de 2020.
7	32	SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	Andre Pereira Nunes	Suspenso	Projeto	24/05/2018	30/08/2020	04/06/2018		98	Sem progressos no período. Projeto suspenso até a efetivação da data de transição, adiada para 01/08/2020, mediante solicitação do setor de folha de pagamento via chamado Assyst 33213.

4. SETOR DE GOVERNANÇA DE TI

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

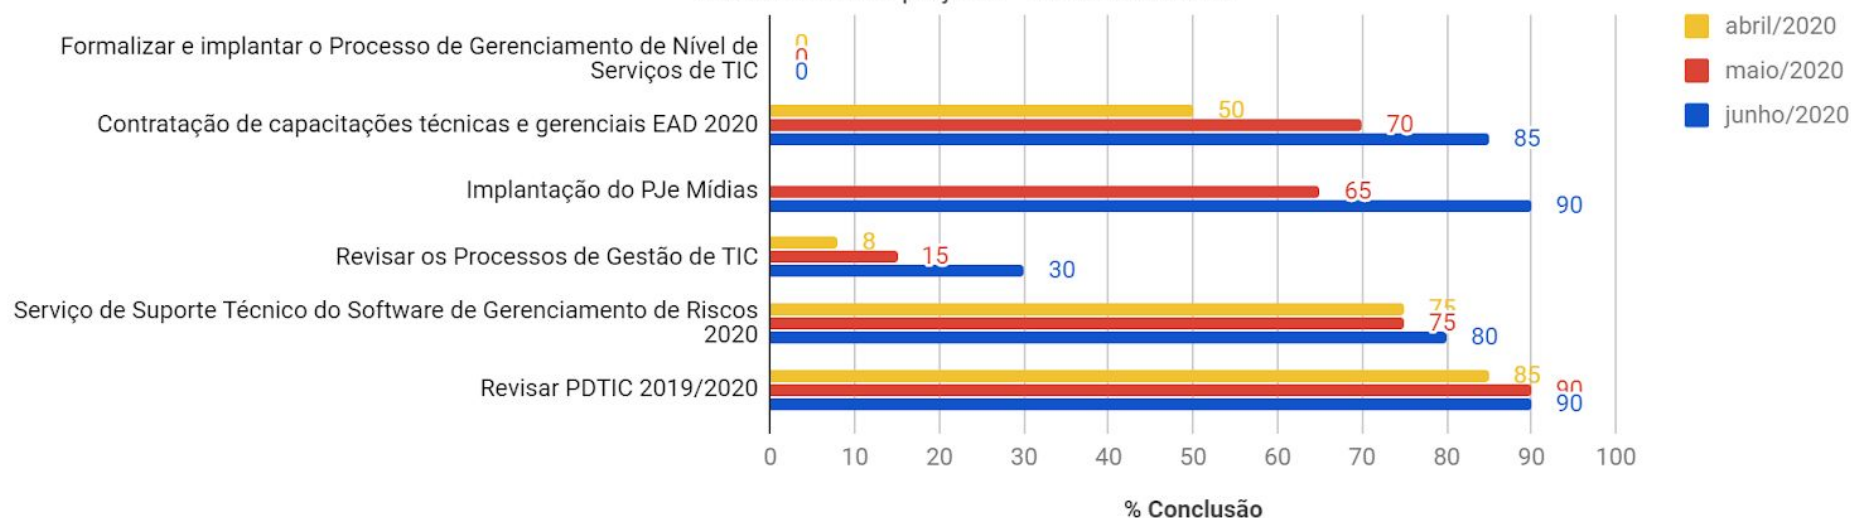


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	528	Formalizar e implantar o Processo de Gerenciamento de Nível de Serviços de TIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	A iniciar	Ação	01/04/2020	30/09/2020			0	Sem progresso no período. Postergado o início de execução do projeto devido a priorização de outras atividades/projetos.
2	483	Serviço de Suporte Técnico do Software de Gerenciamento de Riscos 2020	Jose Augusto	Em andamento	Ação	25/04/2019	31/08/2020	16/01/2020		80	Contratação autorizada pela DG e minuta do contrato enviada a presidência. Entregáveis: 1 Preparação Fechada 100% 2 Estudo Técnico Preliminar Fechado 100% 3 Termo de Referência Fechado 100% 4 Contratação Em andamento 70%
3	529	Contratação de	Rafael Robinson de	Em	Ação	06/04/2020	10/07/2020	14/04/20		85	- Procedimento para a contratação por

		capacitações técnicas e gerenciais EAD 2020	Sousa Neto	andamento				20			inexigibilidade realizado. - Nota de Empenho da contratação emitida. Evolução dos entregáveis: - Estudo da Contratação - Concluído 100% - Contrato Assinado - Em andamento 90% - Acesso à Plataforma Liberado - A iniciar 0%
4	531	Revisar os Processos de Gestão de TIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Projeto	24/04/2020	04/09/2020	27/04/2020		30	Evolução do entregáveis: - Planejamento e Gerenciamento das Capacitações de TIC atualizado - Em andamento 80% - Gerenciamento de Portfólio de TIC atualizado - Em andamento 80% - Gerenciamento de Demandas atualizado - Em andamento 80% - Gerenciamento de Projetos de TIC atualizado - Em andamento 80% - Gerenciamento de Contratações de Soluções de TIC atualizado - Em andamento 20% - Gerenciamento de Problemas atualizado - A iniciar 0% - Gerenciamento de Mudança e Liberação atualizado - A iniciar 0% - Gerenciamento de Software atualizado - A iniciar 0% - Planejamento Estratégico e Tático de TIC atualizado - A iniciar 0% - Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC atualizado - A iniciar 0% - Gerenciamento de Incidentes atualizado - A iniciar 0% - Gerenciamento de Requisição atualizado - A iniciar 0% - Gerenciamento da Central de Atendimento de TIC atualizado - A iniciar 0%
5	534	Implantação do PJe Mídias	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Ação	06/05/2020	31/07/2020	07/05/2020		90	- Foi realizado um treinamento sobre o PJe Mídias no dia 10/06/2020, através do Google Meet, pela Escola Judicial. - Realizado cadastramento no PJe Mídias de 106 usuários do Tribunal, sendo 42 magistrados e 64 servidores.

											<p>Evolução dos entregáveis planejados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ferramenta testada e validada - Concluída 100% - Documentação criada - Em andamento 90% - Ferramenta disponibilizada e suporte inicial fornecido - Em andamento 90%
6	509	Revisar PDTIC 2019/2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	Suspensão	Ação	04/11/2019	31/07/2020	14/11/2019		90	<p>- Sem evolução no período. A minuta da revisão do PDTIC segue aguardando apreciação e publicação da matéria pela Presidência.</p> <p>Evolução dos entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avaliação do resultado das metas e ações previstas para 2019 - Concluída 100% - Necessidades mapeadas e priorizadas para 2020 - Concluída 100% - Minuta da nova versão do PDTIC elaborada - Concluída 100% - Nova versão do PDTIC apreciada pelo CGovTIC - Em andamento 100% - Nova versão do PDTIC publicada pela Presidência - Em andamento 50%

5. SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL


Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

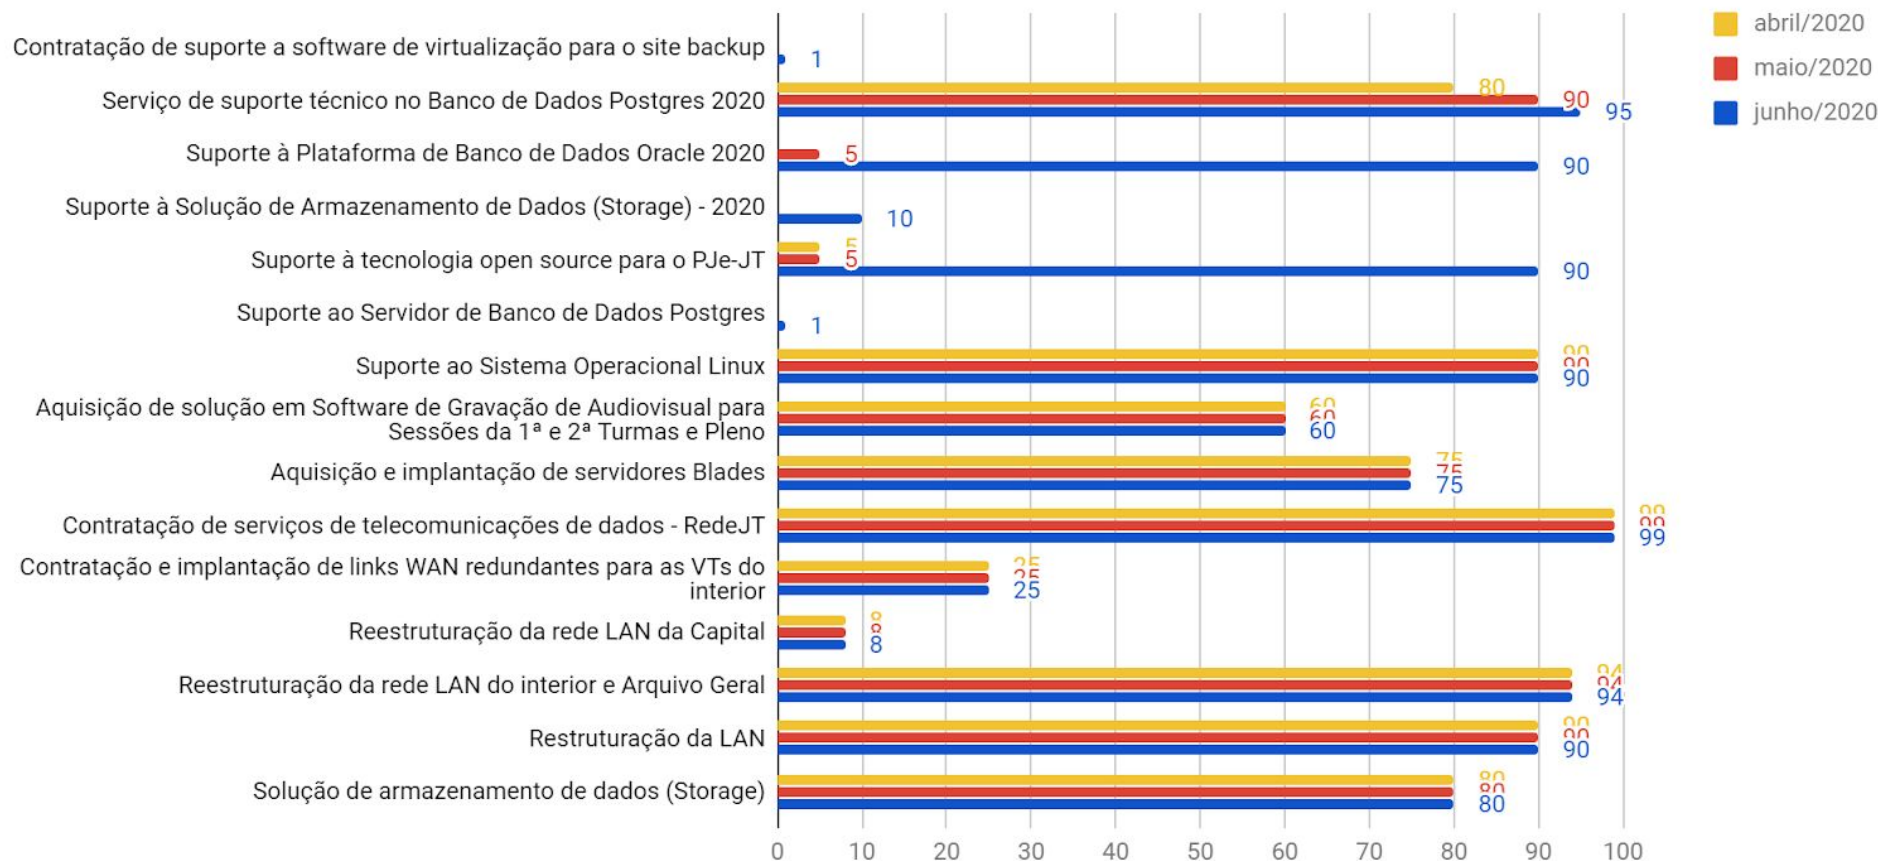

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	461	Suporte ao Sistema Operacional Linux	Fernando Rola Ferreira Filho	Em andamento	Projeto	29/01/2019	07/08/2020	30/01/2019		90	Sem progresso no período. Solicitação respondida pelo TRT5 a respeito de impedimento de contratação em relação ao pregão. Há um recurso judicial, porém sem óbice para contratação.
2	517	Suporte à tecnologia open source para o PJe-JT	Rodrigo Silveira Alexandre	Em andamento	Projeto	09/12/2019	30/07/2020	09/12/2019		90	Processo já tramitado com quantitativos a serem contratados, esperando elaboração e assinatura do contrato por parte da administração.
3	523	Serviço de suporte técnico no Banco de Dados Postgres 2020	Fernando Rola Ferreira Filho	Em andamento	Ação	06/02/2020	10/07/2020	06/02/2020		95	5º Termo de Aditivo assinado pelas partes.
4	536	Suporte à Plataforma de Banco de Dados Oracle 2020	Leonel Pereira	Em andamento	Projeto	13/05/2020	27/10/2020	13/05/2020		90	O Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência foram elaborados e encaminhados à CTIC.
5	538	Suporte à Solução de Armazenamento de Dados (Storage) - 2020	João Diego Rocha Lima	Em andamento	Projeto	04/06/2020	25/08/2020	24/06/2020		10	- Formalização do início do projeto; - Versão inicial do ETP elaborado.
6	540	Suporte ao Servidor de Banco de Dados Postgres	Romulo Moura	Em andamento	Projeto	15/06/2020	26/02/2021	22/06/2020		1	Formalização do início do projeto.
7	541	Contratação de suporte a software de virtualização para o site backup	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	Projeto	17/06/2020	16/12/2020	22/06/2020		1	- Formalização do projeto; - Equipe de planejamento para contratação do suporte técnico da solução de virtualização do site backup, DESPACHO CTIC 059/2020 (PA 3269/2020, DOC.003)
8	233	Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspensão	Projeto	12/01/2018	30/07/2020	19/01/2018		99	Sem progresso no período.
9	358	Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno	Pablo Teofilo Durans	Suspensão	Projeto	06/07/2018	31/10/2020	22/10/2018		60	Sem progresso no período. Atrasos no projeto de Infraestrutura Ágil pode comprometer este projeto.

10	442	Reestruturação da LAN	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspensão	Projeto	17/10/2018	31/07/2020	01/11/2018		90	Sem progresso no período.
11	455	Aquisição e implantação de servidores Blades	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Suspensão	Projeto	15/01/2019	15/12/2020	31/01/2019		75	- Sem progresso no período. A Administração foi informada sobre o Recebimento Definitivo pelo integrante da Comissão de Recebimento (doc.089), a liberação do valor retido foi solicitado no dia 26/05/2020. A Contratada aguarda o pagamento do valor. Riscos e Problemas: - Setor com tarefas e demandas em excesso, sobretudo, devido a escassez de recursos humanos, ocasionando interrupção no projeto e atraso nas atividades/projetos desenvolvidos.
12	476	Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo Geral	Antoniell Magalhaes de Carvalho	Suspensão	Projeto	01/04/2019	31/12/2020	16/04/2019		94	Sem progresso no período. Inviável dar prosseguimento devido à quarentena.
13	480	Contratação e implantação de links WAN redundantes para as VTs do interior	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspensão	Projeto	15/04/2019	30/08/2020	08/03/2019		25	Sem progresso no período.
14	490	Solução de armazenamento de dados (Storage)	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Suspensão	Projeto	18/06/2019	01/10/2020	18/06/2019		80	Sem progresso no período.
15	518	Reestruturação da rede LAN da Capital	Antoniell Magalhaes de Carvalho	Suspensão	Projeto	13/01/2020	31/12/2020	27/01/2020		8	Sem progresso no período. Situação dos entregáveis: - Switches do Bloco C Em andamento 50% - Switches do Bloco B Nova 0% - Switches do Bloco A Nova 0% - Switches do Forum Astolfo Serra Nova 0% - Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e Storages do FAS Nova 0% - Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e Storages Sede Nova 0% - Alteração dos IPs de Servidores Sede Nova 0%


6. SEÇÃO DE APOIO AO PJE

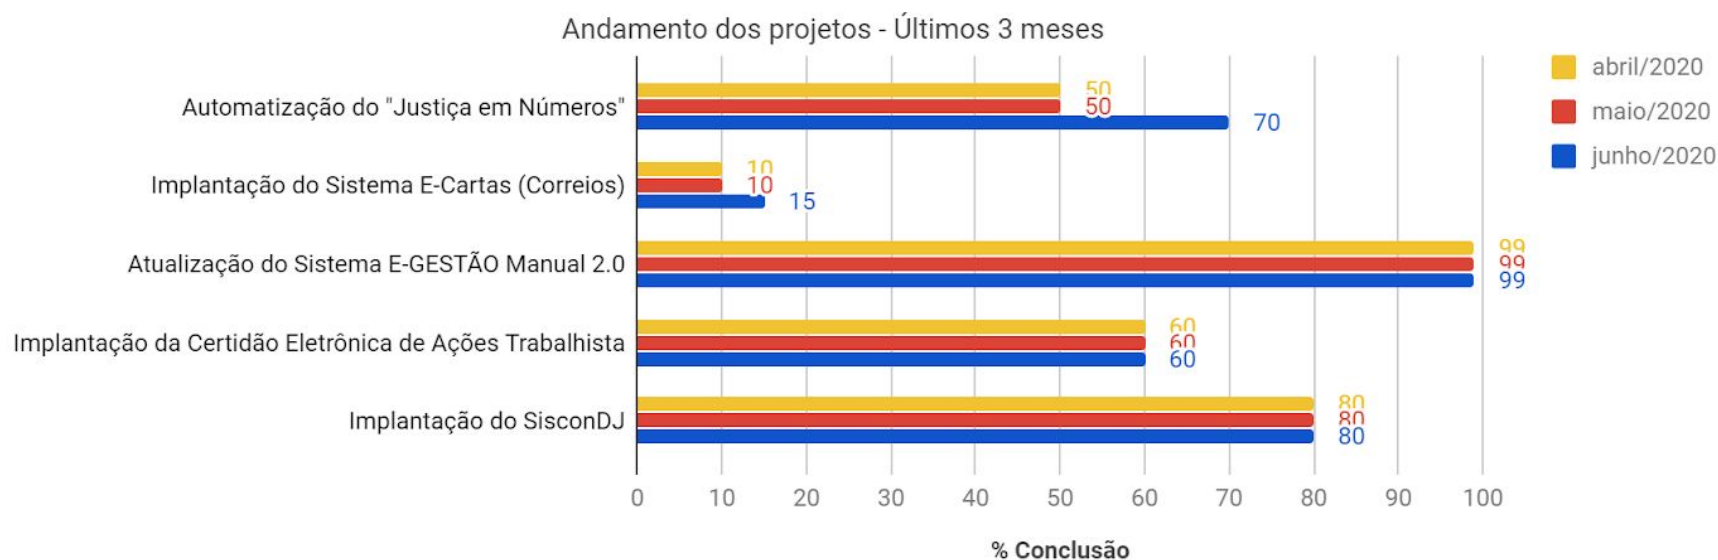

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	481	Automatização do "Justiça em Números"	Djeison Rafael Neitzke	Em andamento	Ação	23/04/2019	31/07/2020	19/06/2019		70	<p>Resumo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No período houve significativo progresso após diversas reuniões de alinhamento interno e de passagem de requisitos pelo CNJ. - O planejamento do projeto foi revisado, ocasionando inclusão, exclusão e fechamento de tarefas no redmine. <p>Entregas realizadas no período:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atividades de planejamento derivado das Reuniões de 25/06/2020 - Corrigir preenchimento de complementos dos movimentos 60, 106, 36 - Corrigir preenchimento de complementos dos movimentos 26, 123, 85, 51 e 970 - Incluir os 4 primeiros campos básicos

2	504	Implantação do Sistema E-Cartas (Correios)	Gutemberg Pereira Vidal Santos	Em andamento	Ação	10/09/2019	30/09/2020	01/11/2019		15	- Colhida a autorização para projeto, conforme P.A. 3252/2020 , onde DG solicita e autoriza a implantação do mesmo. - A autorização se fazia necessária tendo em vista tratar-se de projeto que não é de cunho nacional.
3	56	Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0	Djeison Rafael Neitzke	Suspensão	Projeto	06/04/2018	31/07/2020	06/04/2018		99	Sem progresso no período. Aguarda-se a reunião do demandante (Comitê Gestor Regional do E-Gestão) para o aceite formal da entrega do projeto.
4	477	Implantação do SisconDJ	Gilberto Cunha Filho	Suspensão	Ação	05/12/2018	31/07/2020	01/04/2019		80	Sem progresso no período. Sistema em homologação.
5	506	Implantação da Certidão Eletrônica de Ações Trabalhista	Gutemberg Pereira Vidal Santos	Suspensão	Ação	27/09/2018	30/07/2020	14/10/2019		60	Sem progresso no período. Sugestão de cancelamento do projeto considerando que: - A versão 2.5 do PJe veio com a funcionalidade objetiva deste sistema no que diz respeito aos processos eletrônicos; - O TRT 16 recebeu o selo de 100% PJe;


7. SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

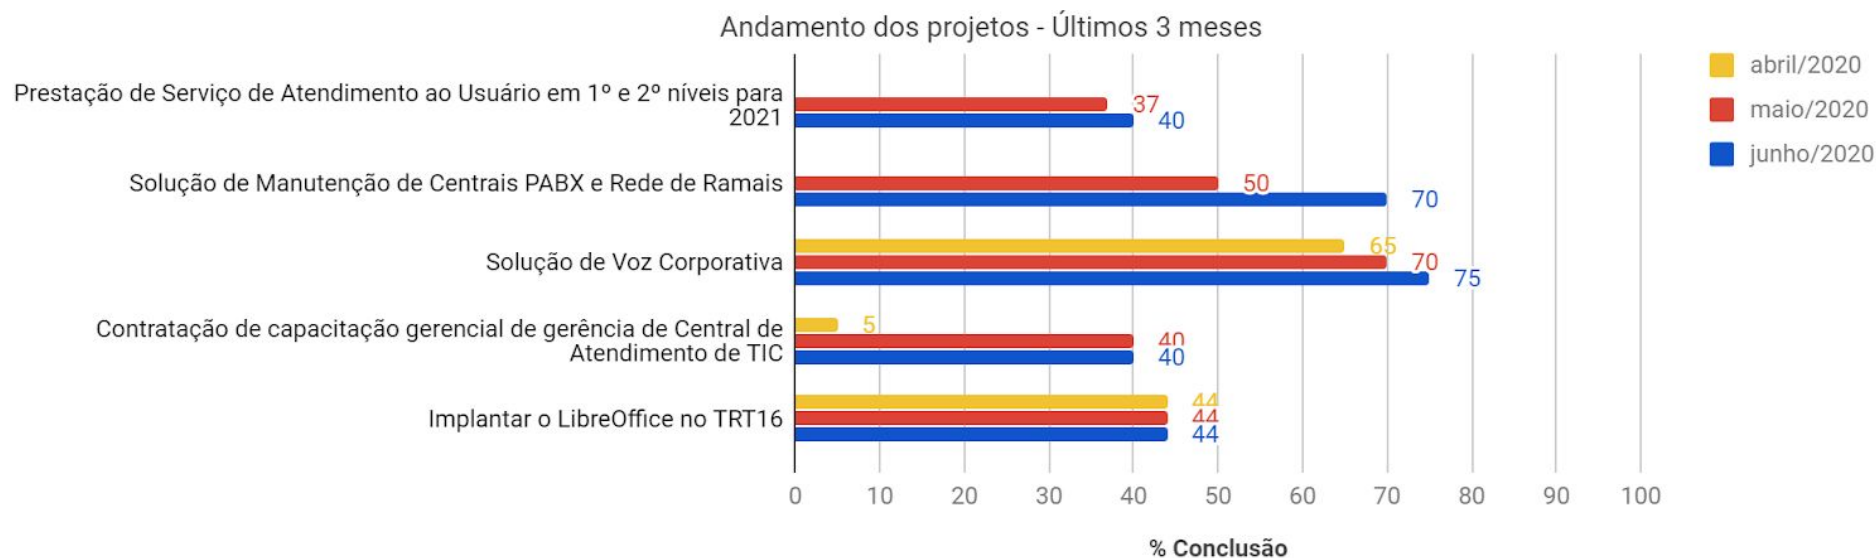

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	381	Solução de Voz Corporativa	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	27/08/2018	30/08/2020	31/08/2018		75	- A preparação da sala que receberá os novos equipamentos foi concluída. - As faixas de endereçamento IP foram criadas e todas as máquinas virtuais foram entregues, exceto uma. O setor de infraestrutura está em contato com a lettel para resolver essa pendência.
2	535	Solução de Manutenção de Centrais PABX e Rede de Ramais	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Ação	05/05/2020	10/07/2020	05/05/2020		70	- O aditivo foi preparado pela secretaria de administração e enviado ao presidente para assinatura no último dia do mês de junho; - O último passo, após a assinatura do presidente é a assinatura do representante da empresa, momento no qual este projeto será

											encerrado.
3	537	Prestação de Serviço de Atendimento ao Usuário em 1º e 2º níveis para 2021	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	18/05/2020	18/12/2020	18/05/2020		40	<ul style="list-style-type: none"> - ETP aprovado pelo NAJ, e esclarecimentos devidamente prestados para a DG; - Aguarda-se avaliação da DG para conclusão do TR e continuidade do processo licitatório; - Paralelamente o TR vem sendo desenvolvido estando em sua fase final.
4	351	Implantar o LibreOffice no TRT16	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Suspenso	Projeto	25/06/2018	18/12/2020	25/06/2018		44	Sem progresso no período. Não está sendo possível realizar ações nos computadores dos usuários ou verificar a instalação nesse cenário de pandemia.
5	530	Contratação de capacitação gerencial de gerência de Central de Atendimento de TIC	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Suspenso	Ação	23/04/2020	31/08/2020	26/04/2020		40	<p>Sem progresso no período. O curso se realizaria a partir do mês de junho de 2020, mas a empresa não forneceu um atestado de capacidade técnica que é essencial para a contratação do curso.</p> <p>Deste modo, uma nova turma para o mesmo curso, nos mesmos moldes, está prevista no mês de agosto.</p>

8. SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

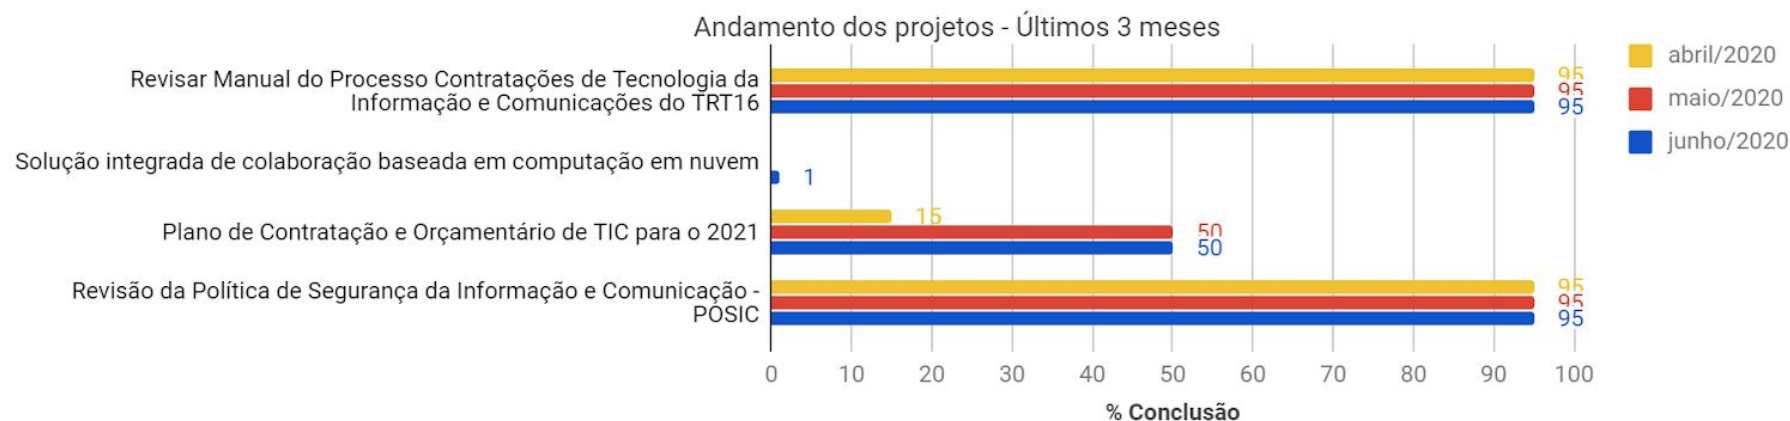

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	147	Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16	Stanley Araujo de Sousa	Cancelado	Projeto	09/05/2017	30/06/2020	09/05/2019	30/06/2020	95	Projeto cancelado. Motivo: Atualização de atos normativos que compõe o manual e novo projeto de revisão será aberto.
2	539	Solução integrada de colaboração baseada em computação em nuvem	Romulo Moura	Em andamento	Projeto	17/06/2020	31/12/2020	19/06/2020		1	Formalização do início do projeto.
3	168	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	28/06/2017	30/09/2020	28/06/2017		95	Sem progresso no período. Pedido de vista regimental pelos Desembargadores James Magno Araújo Farias e Ilka Esdra Silva Araújo.
4	525	Plano de Contratação e Orçamentário de TIC para o 2021	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Ação	18/02/2020	30/09/2020	18/02/2020		50	Sem progresso no período. Servidores foram priorizados para analisar as mudanças nas contratações do ano de 2020. Assim, os recursos humanos foram transferidos para essa atividade.
