



TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

PORTFÓLIO DE PROJETOS DE TIC


NOVEMBRO/2020

EGP-TIC


SUMÁRIO

1.	RESUMO DOS PROJETOS	3
1.1.	PROJETOS INCLUÍDOS NO PORTFÓLIO	4
1.2.	PROJETOS INICIADOS	4
1.3.	PROJETOS CONCLUÍDOS	4
1.4.	PROJETOS CANCELADOS	4
2.	COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES	5
3.	SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	7
4.	SETOR DE GOVERNANÇA DE TI	10
5.	SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL	12
6.	SEÇÃO DE APOIO AO PJE	16
7.	SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE	17
8.	SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	19

1. RESUMO DOS PROJETOS

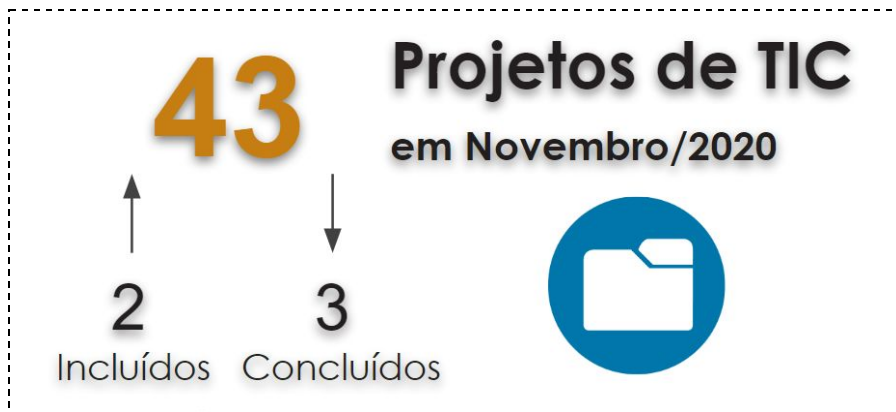


Temas

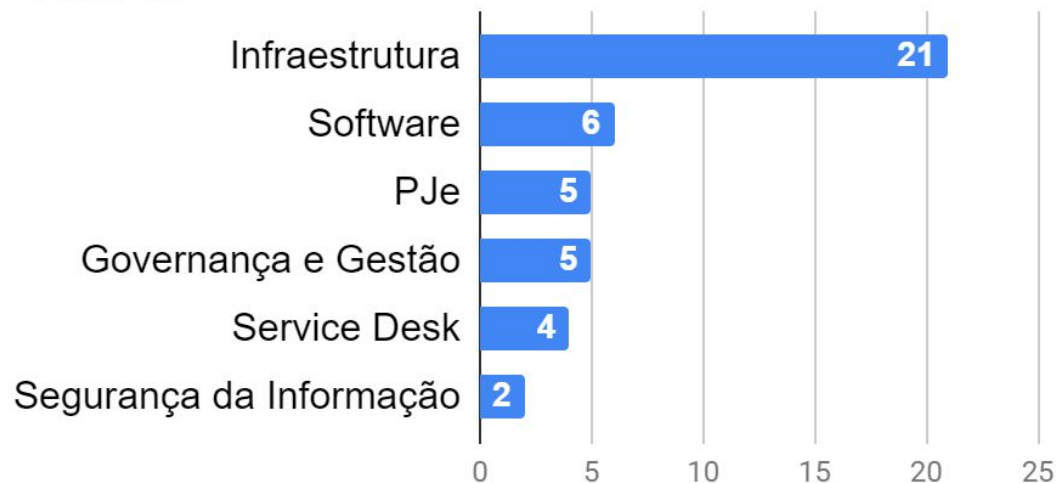

Projetos nas unidades



Situaçao

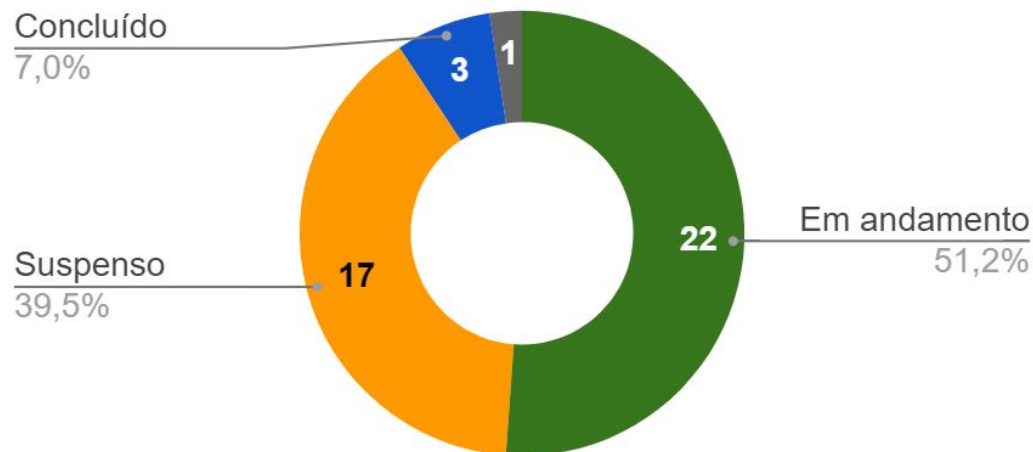

1.1. PROJETOS INCLUÍDOS NO PORTFÓLIO

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
553	Suporte à Solução de Gabinete Virtual	Antoniél Magalhaes de Carvalho	SIC	03/11/2020	03/11/2020		Em andamento
554	Solução de SMS Corporativo 2021	Andre Pereira Nunes	SDS	17/11/2020	18/11/2020		Em andamento

1.2. PROJETOS INICIADOS


<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
553	Suporte à Solução de Gabinete Virtual	Antoniél Magalhaes de Carvalho	SIC	03/11/2020	03/11/2020		Em andamento
554	Solução de SMS Corporativo 2021	Andre Pereira Nunes	SDS	17/11/2020	18/11/2020		Em andamento

1.3. PROJETOS CONCLUÍDOS

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
509	Revisar PDTIC 2019/2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	SGTI	04/11/2019	14/11/2019	30/11/2020	Concluído
531	Revisar os Processos de Gestão de TIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	SGTI	24/04/2020	27/04/2020	30/11/2020	Concluído
545	Contratação de treinamento para VMware vSphere: Install, Configure, Manage	João Diego Rocha Lima	SIC	29/07/2020	01/08/2020	30/11/2020	Concluído

1.4. PROJETOS CANCELADOS

2.COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

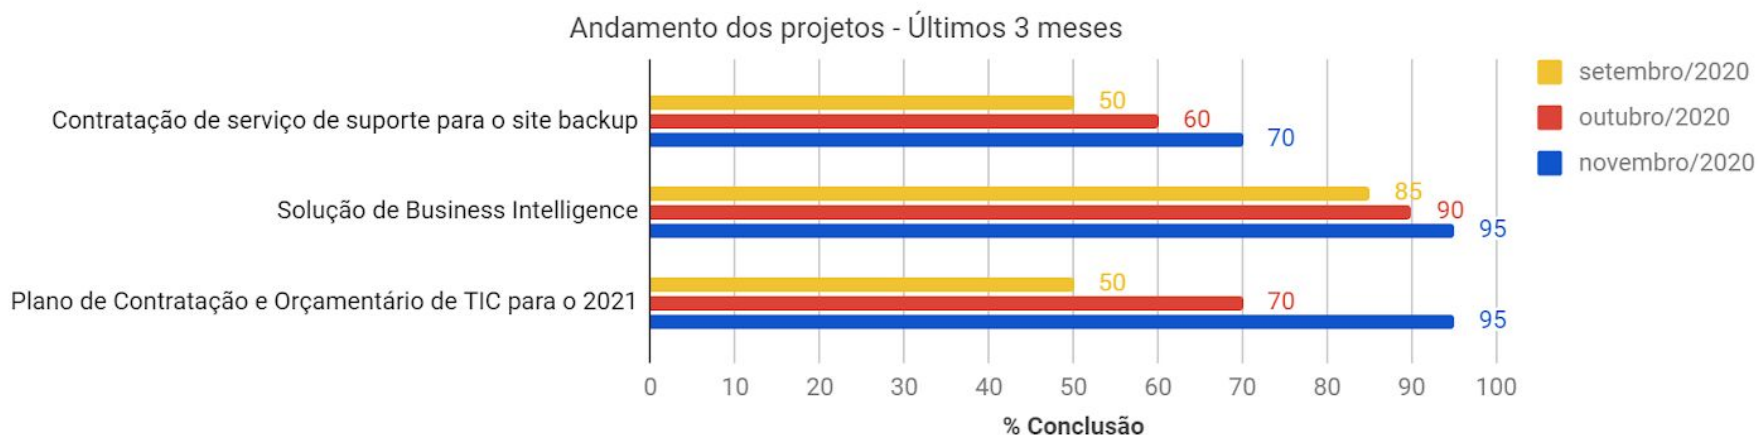


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	519	Contratação de serviço de suporte para o site backup	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	15/01/2020	15/01/2021	19/05/2020		70	Atividades efetuadas nos entregáveis 3, 4, 5 e 6. Entregáveis: Entrega 1: ETP(doc.018, P.A. 332/2020) Entrega 2: Dotação Orçamentária(doc.034, P.A. 332/2020); Entrega 3: Manifestação sobre a qualificação técnica(doc.036, P.A. 332/2020); Entrega 4: Termo de Referência V1.0(doc.037, P.A. 332/2020); Entrega 5: Parecer SAJ(doc.039, P.A. 332/2020); Entrega 6: Minuta Edital(doc.042, P.A. 332/2020);
2	524	Solução de Business Intelligence	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	12/02/2020	15/12/2020	12/02/2020		95	Evolução nos entregáveis 8, 9, 10 e 11. Entregáveis: Entrega 1: ETP(doc.018, P.A.2605/2020) Entrega 2: TR (doc.031, P.A. 2605/2020) Entrega 3: Minuta do Contrato(doc.049, P.A. 2605/2020) Entrega 4: Edital da Licitação (doc.054, P.A. 2605/2020)

										<p>Entrega 5: ATA do Pregão(doc.59, P.A. 2605/2020)</p> <p>Entrega 6: Proposta Comercial Vencedora(doc.061, P.A. 2605/2020)</p> <p>Entrega 7: PARECER NAJ N° 498/2020(doc.064, P.A. 2605/2020)</p> <p>Entrega 8: Homologação do Certamente(doc.066, P.A. 2605/2020)</p> <p>Entrega 9: ARP 10/2020 (doc.068, P.A. 2605/2020)</p> <p>Entrega 10: DOU ARP (doc.069, P.A. 2605/2020)</p> <p>Entrega 11: Pedido Inicial(doc.071, P.A. 2605/2020)</p>
3	525	Plano de Contratação e Orçamentário de TIC para o 2021	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	18/02/2020	16/12/2020	18/02/2020		95	<p>Reunião com o Comitê de Governança para aprovação da Minuta do Plano de Contratação.</p> <p>Entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrega 1: Coleta das necessidades externas a TIC - Entrega 2: Coleta das necessidades internas a TIC - Entrega 3: Consolidação das necessidades - Entrega 4: Ata de Reunião do Comitê de Governança(doc.005, P.A. 1210/2020)

3. SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

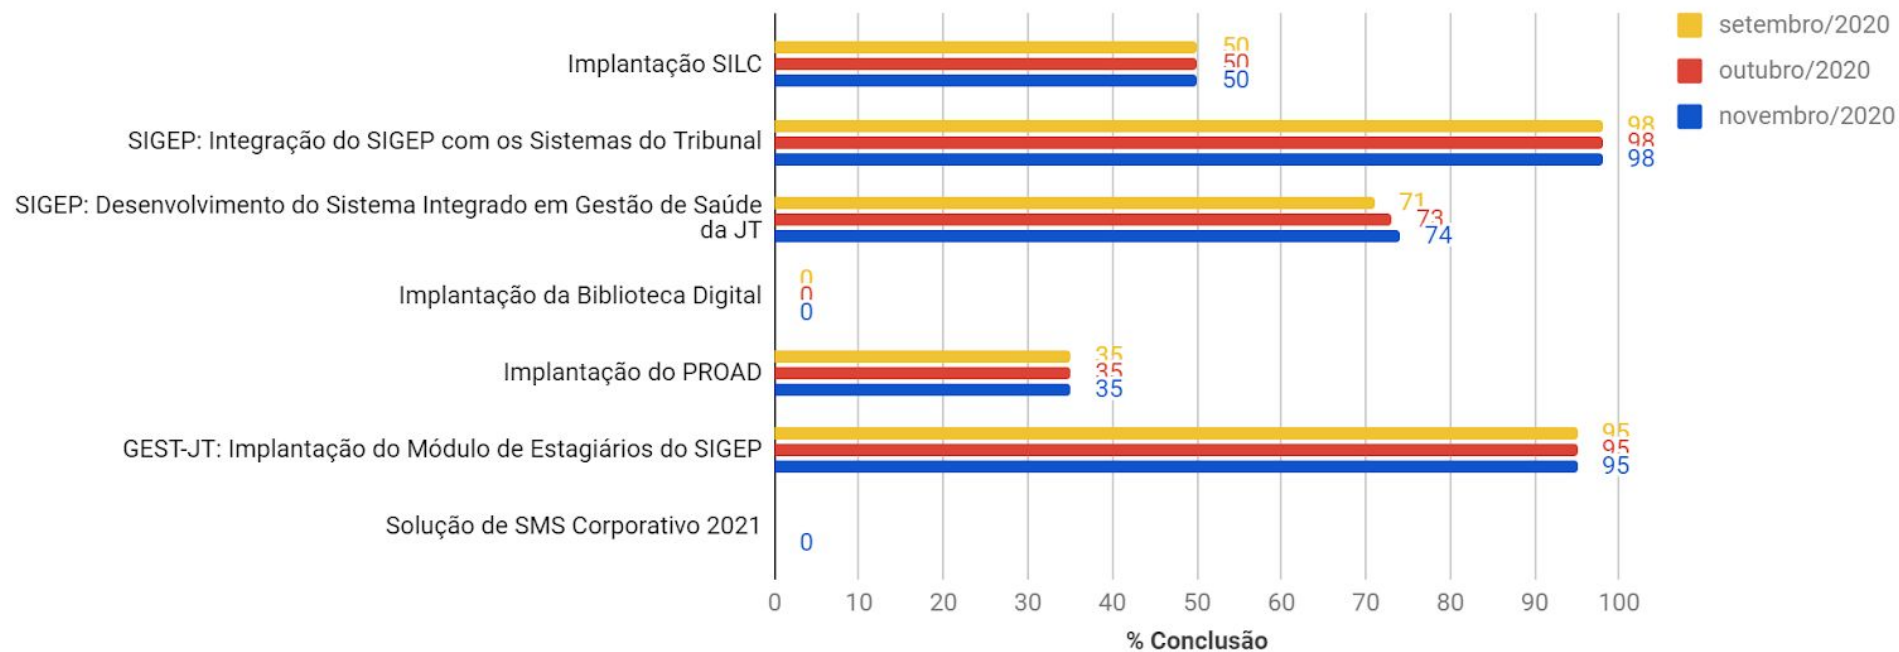


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	19	Implantação SILC	Andre Pereira Nunes	Suspensão	06/02/2018	17/12/2021	23/04/2018		50	Sem progressos no período. Projeto ainda não retomado. Pendência: Verificar com a nova administração (Dr. Evandro) junto ao setor de licitação se o projeto é necessário e desejado ainda.
2	32	SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	Andre Pereira Nunes	Em andamento	24/05/2018	28/02/2021	04/06/2018		98	Foi avaliado que o conjunto de relatórios e funcionalidades necessárias apontado pela CGP no mês anterior, somado aos novos pedidos de relatórios ocorridos neste mês, não podem ser concluídos até

									01/01/2021 por seu volume e complexidade. Sendo assim a descontinuidade do sistema de rh legado resta mais uma vez adiada, desta vez para 01/02/2021, caso se consiga desenvolver o que foi priorizado até lá. Mudança: prazo e escopo, com a solicitação de novas funcionalidades e relatórios disponíveis no legado e que não existem no SIGEP.
3	187	SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	Diogo Duailibe da Silva	Em andamento	25/08/2017	19/12/2022	29/08/2017	74	Geração das releases 1.16.0.0-rc3, 1.16.0.0-rc4, 1.16.0.0-rc5 e 1.16.0.0-final; Publicação das releases 1.16.0.0-rc3, 1.16.0.0-rc4, 1.16.0.0-rc5 e 1.16.0.0-final no servidor de Homologação; Tarefas Redmine Nacional: 38108, 39830, 39922, 38108, 38620; Tarefas Redmine Local 8055; Estudo e início de integração do Assinador do PROAD (TRT-12) no SIGS; Reuniões gerenciais e técnicas para definição de escopo e decisões de tecnologia; Entregáveis: - Entrega 1: Estruturação da arquitetura proposta (88%) - Entrega 2: Módulo de Agenda e Tabelas Básicas (95%) - Entrega 3: Módulo Ocupacional (91%) - Entrega 4: Módulo Pericial (97%) - Entrega 5: Módulo de Segurança do Trabalho (30%) - Entrega 6: Módulo Assistencial (90%) - Entrega 7: Módulo de segurança da NGS1 (67%) - Entrega 8: Módulo de Relatórios Gerenciais (40%)
4	279	Implantação da Biblioteca Digital	Andre Pereira Nunes	A iniciar	01/01/2018	18/12/2020		0	Projeto não iniciado.
5	499	Implantação do PROAD	Andre Pereira Nunes	Suspenso	28/02/2019	17/12/2021	28/08/2019	35	Sem progressos no período. Entregáveis: (90%) ENTREGA 1: Preparação da Infraestrutura (20%) ENTREGA 2: Acordo de Cooperação Técnica com o TRT12 (0%) ENTREGA 3: Configuração do Sistema (0%) ENTREGA 4: Adequação do SUAP e SISPAE

										<p> (0%) ENTREGA 5: Visita Técnica e Treinamento (0%) ENTREGA 6: PROAD e PROAD-OUV em Produção Pendência: unidade infraestrutura concluir as prioridades atuais para realizar a implantação do PROAD em infraestrutura ágil em Homologação;</p>
6	533	GEST-JT: Implantação do Módulo de Estagiários do SIGEP	Andre Pereira Nunes	Suspenso	06/05/2020	26/02/2021	07/05/2020		95	<p>Sem progresso no período. Entregáveis: (100%) ENTREGA 1: Preparação da Infra estrutura (100%) ENTREGA 3: Integração com outros sistemas do tribunal (100%) ENTREGA 2: Migração de Dados (80%) ENTREGA 4: Disponibilização em produção, com Manual de Operações Pendências: Pendente de infraestrutura de produção, prevista para fevereiro de 2021. Priorizado junto ao setor de infraestrutura as ações relativas ao PJE, Módulo de Passivos e PROAD. Mudança: Alterado a data de conclusão para fevereiro de 2021.</p>
7	554	Solução de SMS Corporativo 2021	Andre Pereira Nunes	Em andamento	17/11/2020	12/03/2021	18/11/2020		0	<p>Projeto formalizado com a elaboração do TAP; Entregáveis: 0% Entregável 1 - Pré-requisitos da Contratação 0% Entregável 2 - Quarto Aditivo do Contrato Assinado; 0% Entregável 3 - Empenho emitido pela SOF; 0% Entregável 4 - Encerramento da Contratação;</p>

4. SETOR DE GOVERNANÇA DE TI

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

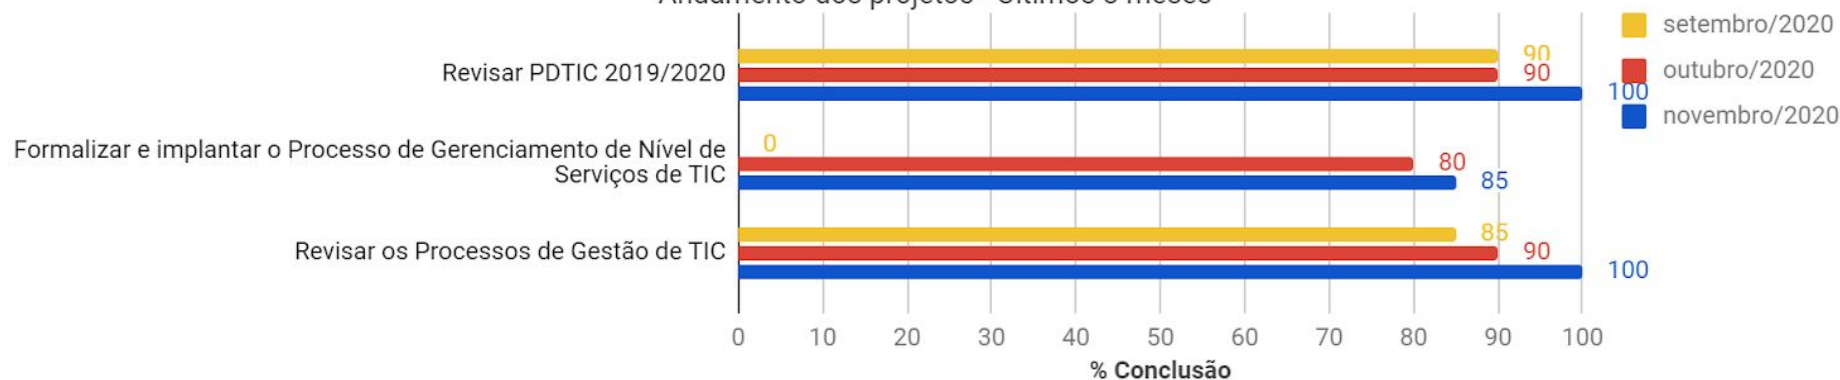


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	509	Revisar PDTIC 2019/2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	Concluído	04/11/2019	30/11/2020	14/11/2019	30/11/2020	100	Projeto finalizado com sucesso no período. A revisão do PDTIC 2019/2020 publicada pela Presidência através da Portaria GP Nº 250/2020. Entregáveis: (100%) Avaliação do resultado das metas e ações previstas para 2019 (100%) Necessidades mapeadas e priorizadas para 2020 (100%) Minuta da nova versão do PDTIC elaborada (100%) Nova versão do PDTIC apreciada pelo CGovTIC (100%) Nova versão do PDTIC publicada pela Presidência.
2	528	Formalizar e implantar o Processo de Gerenciamento de Nível de Serviços de TIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	01/04/2020	18/12/2020	19/10/2020		85	A Política de gerenciamento do processo de acordo de nível de serviço foi publicada (ATO REGULAMENTAR N 04/2020) e incluída no portal de governança. Entregáveis: (100%) Política de gerenciamento do processo de acordo de nível de serviço elaborada e publicada (90%) Processo de gerenciamento do acordo do nível de serviço definido e publicado

										(80%) Acordos de níveis de serviços definidos (90%) Acordos de níveis de serviços configurados no assyst
3	531	Revisar os Processos de Gestão de TIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	Concluído	24/04/2020	30/11/2020	27/04/2020	30/11/2020	100	<p>Projeto finalizado com sucesso. As seguinte normas relacionadas ao projeto foram formalizadas pela Presidência:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Política de Gerenciamento da Central de Serviços de TIC: ATO REGULAMENTAR GP N° 01/2020; - Política de Gerenciamento de Requisições de Serviços de TIC: ATO REGULAMENTAR GP N° 02/2020; - Política de Gerenciamento de Incidentes de TIC: ATO REGULAMENTAR GP N° 03/2020; - Catálogo de Serviços de TIC: PORTARIA GP N° 375/2020; <p>Entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> (100%) Planejamento e Gerenciamento das Capacitações de TIC atualizado (100%) Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC atualizado (100%) Revisão da Política de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC (100%) Gerenciamento de Demandas atualizado (100%) Planejamento Estratégico e Tático de TIC atualizado (100%) Gerenciamento de Portfólio de TIC atualizado (100%) Gerenciamento de Software atualizado (100%) Gerenciamento de Problemas atualizado (100%) Gerenciamento da Central de Serviços de TIC atualizado (20%) Gerenciamento de Contratações de Soluções de TIC atualizado (100%) Gerenciamento de Projetos de TIC atualizado (100%) Gerenciamento de Incidentes atualizado (100%) Gerenciamento de Requisição atualizado (100%) Gerenciamento de Mudança e Liberação atualizado (100%) Normativos dos Processos de Gestão de TIC Publicados

5. SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

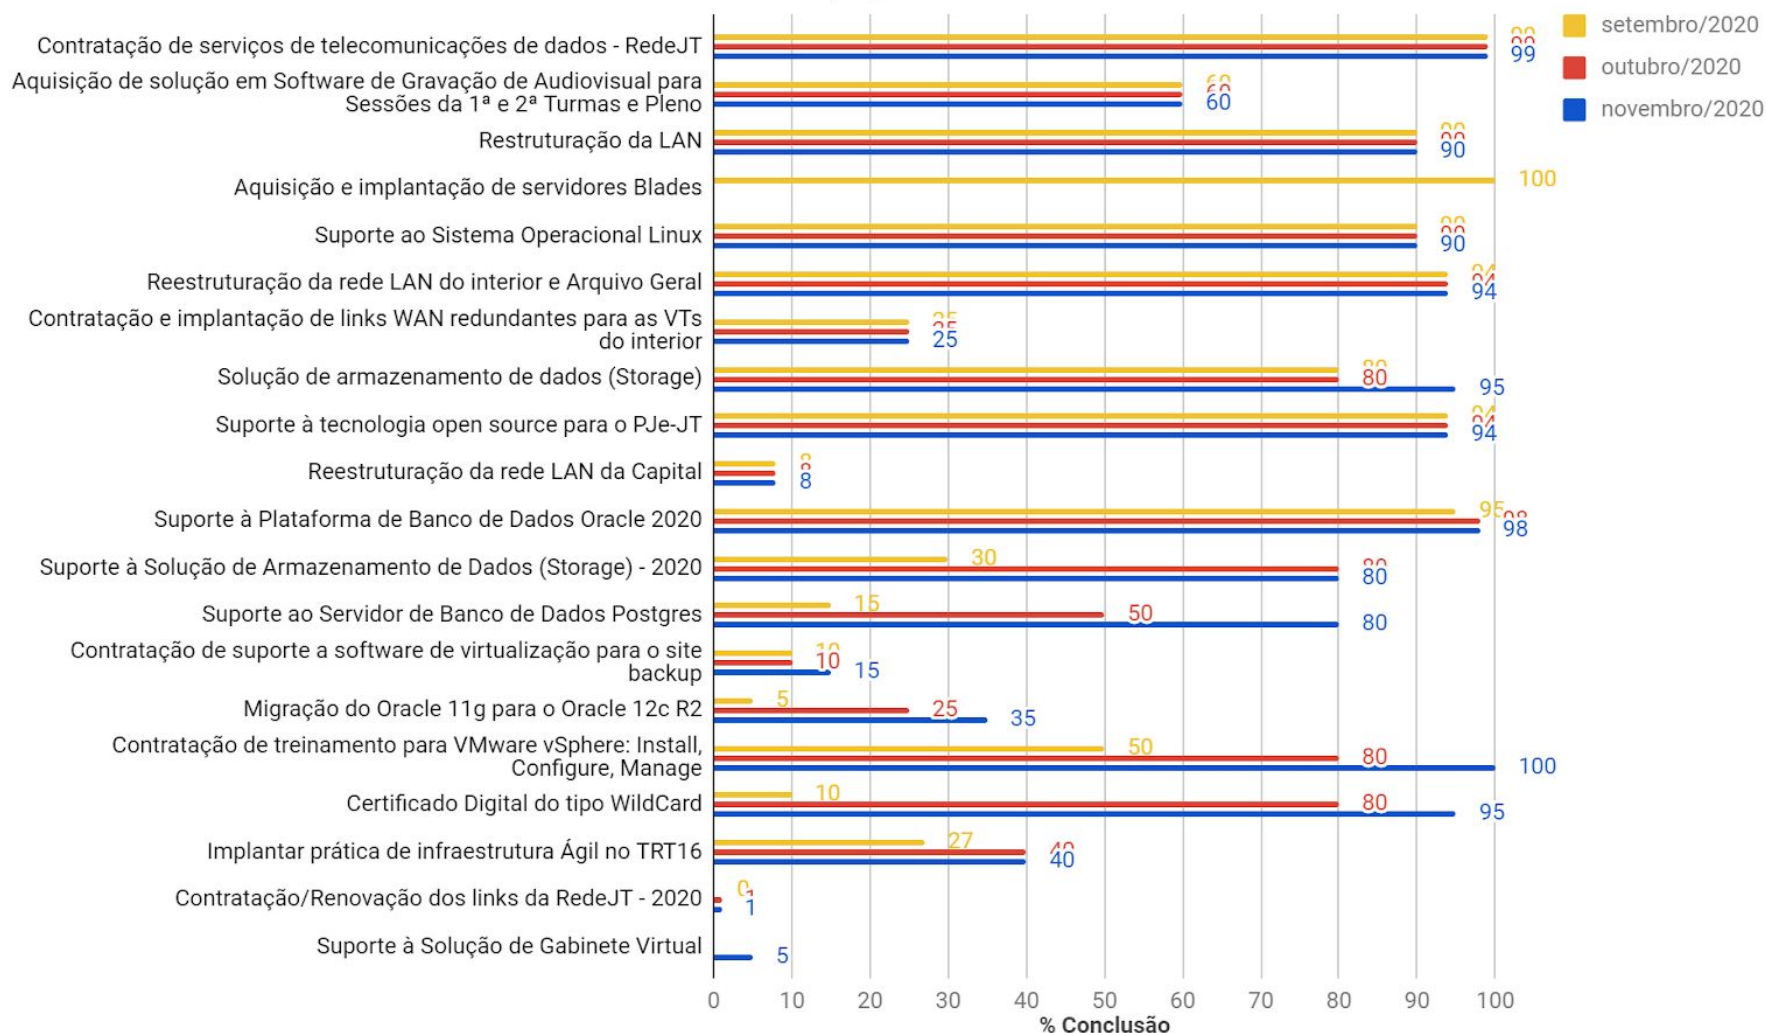

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	233	Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspenso	12/01/2018	06/11/2020	19/01/2018		99	Sem reporte do Gerente de Projeto. (EGP-TIC)
2	358	Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno	Pablo Teofilo Durans	Suspenso	06/07/2018	30/06/2021	22/10/2018		60	Sem reporte do Gerente de Projeto. (EGP-TIC)
3	442	Restruturação da LAN	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspenso	17/10/2018	30/11/2020	01/11/2018		90	Sem reporte do Gerente de Projeto. (EGP-TIC)
4	461	Suporte ao Sistema Operacional Linux	Fernando Rola Ferreira Filho	Em andamento	29/01/2019	31/12/2020	30/01/2019		90	PA enviado à Diretoria Geral para análise da minuta do contrato Entregáveis: - Entrega 1: ETP (100%) Mudança: alteração da previsão de fim do projeto para 31/12/2020.
5	476	Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo Geral	Antoniell Magalhaes de Carvalho	Suspenso	01/04/2019	31/03/2021	16/04/2019		94	Sem progresso no período. Entregáveis restantes: - Implantação do WiFi (75%)
6	480	Contratação e implantação de links WAN redundantes para as VTs do interior	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspenso	15/04/2019	31/12/2020	08/03/2019		25	Sem reporte do Gerente de Projeto. (EGP-TIC)
7	490	Solução de armazenamento de dados (Storage)	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	18/06/2019	19/12/2020	18/06/2019		95	Recebimento provisório, PA 4380/2019, doc.132. Entregáveis: - Entrega 1: Storage do Site Principal (100%) - Entrega 2: Storage do Site Secundário (100%) Riscos: Atraso no processo de recebimento definitivo do material e de liquidação da despesa. Pendências: Recebimento Definitivo dos equipamentos e serviços; Liquidação da despesa.
8	517	Suporte à tecnologia open source para o PJe-JT	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspenso	09/12/2019	30/11/2020	09/12/2019		94	Sem reporte do Gerente de Projeto. (EGP-TIC)
9	518	Reestruturação da rede LAN da Capital	Antoniell Magalhaes de Carvalho	Suspenso	13/01/2020	30/06/2021	27/01/2020		8	Sem progresso no período. Entregáveis (50%) Switches do Bloco C (0%) Switches do Bloco B (0%) Switches do Bloco A (0%) Switches do Forum Astolfo Serra (0%) Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e Storages Sede (0%) Alteração dos IPs de Servidores Sede


										(0%) Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e Storages do FAS
10	536	Suporte à Plataforma de Banco de Dados Oracle 2020	Leonel Pereira	Em andamento	13/05/2020	31/12/2020	13/05/2020		98	Entrega do contato assinado pelo Presidente do Tribunal e do Termo de Referência para a empresa Oracle. Foi apresentado por parte desta uma minuta com sugestões de mudanças, que foi encaminhado pela DG ao Setor de Assessoramento Jurídico para análise. Entregáveis: - Entrega 1: contrato assinado pelo contratante pela contratada (100%) Mudança: Alteração da previsão de encerramento do projeto para 31/12/2020
11	538	Suporte à Solução de Armazenamento de Dados (Storage) - 2020	João Diego Rocha Lima	Suspensão	04/06/2020	31/12/2020	24/06/2020		80	Sem progresso no período. Entregáveis: - Entrega: Minuta do contrato (100%)
12	540	Suporte ao Servidor de Banco de Dados Postgres	Romulo Moura	Em andamento	15/06/2020	31/01/2021	22/06/2020		80	Envio do ofício comunicando a INTENÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO REGISTRO DE PREÇO ao TRT23. Entregáveis: Entregáveis: - Entrega 1: DOD e TAP (100%) - Entrega 2: Portaria de Planejamento (100%) - Entrega 3: Elaboração de ETP e TR (50%); - Entrega 4: Acompanhamento da contratação e registro da ARP (50%); - Entrega 5: Registro de preços publicado (0%);
13	541	Contratação de suporte a software de virtualização para o site backup	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	17/06/2020	18/12/2020	22/06/2020		15	Análise de Riscos entregue conforme solicitado pela Administração. Análise Complementar - Orçamento Estimado - Estudo Técnico Preliminar, entregue. Termo de Referência entregue ao Integrante Administrativo. Entregáveis: - Entrega 1: (100%) ETP - aprovado pela Administração no dia 27/08/2020 - Entrega 2: (100%) TR - entregue no dia 16/11/2020 ao Integrante Administrativo. - Entrega 3: (100%) Análise de Riscos - encaminhado para o Gestor do Contrato e Integrante Demandante no dia 24/09/2020 - Entrega 4: (0%) Serviço de Suporte Técnico renovado Riscos: Falta de orçamento para concluir a contratação; Manutenção do serviço solução de virtualização do site backup sem suporte técnico

										especializado frente à crescente demanda de serviços internos; Pendências: Decisão administrativa sobre a escolha do processo de aquisição mais adequado para a situação econômico-financeira do Tribunal.
14	542	Migração do Oracle 11g para o Oracle 12c R2	Leonel Pereira	Em andamento	06/07/2020	31/01/2021	07/07/2020		35	As máquinas foram refeitas, as LUNs foram entregues e os sistemas operacionais customizados. Foram realizadas tarefas de instalação e configuração de pré-requisitos necessários à instalação do Grid Infrastructure e do Oracle Database; O grid foi instalado, o software do database também foi instalado, o banco de dados foi criado. Entregáveis: - Entrega 1: Oracle RAC instalado, banco de dados de produção importado para o novo ambiente - Entrega 2: Novo servidor rman instalado e configurado pronto para a geração dos backups do novo ambiente - Entrega 3: Bancos de desenvolvimento, homologação, bugfix e teste atualizados para a versão 19c
15	545	Contratação de treinamento para VMware vSphere: Install, Configure, Manage	João Diego Rocha Lima	Concluído	29/07/2020	20/11/2020	01/08/2020	30/11/2020	100	Projeto concluído. Treinamento realizado e certificado encaminhado para EJUD.
16	548	Certificado Digital do tipo WildCard	Yuri Sousa Oliveira	Em andamento	18/09/2020	04/12/2020	30/09/2020		95	Realizado dotação orçamentária para a aquisição do certificado digital do tipo Wildcard; Nota de empenho emitida e enviada para a empresa vencedora. Entregáveis: - Entrega 1: Cotação de preços para a solução de certificado digital SSL do tipo Wildcard (100%); - Entrega 2: ETP - Estudo Técnico Preliminar (100%); - Entrega 3: TR - Termo de referencia (100%); - Entrega 4: Aquisição
17	549	Implantar prática de infraestrutura Ágil no TRT16	Pablo Teofilo Durans	Suspensão	03/08/2020	18/12/2020	03/08/2020		40	Sem reporte do Gerente de Projeto. (EGP-TIC)
18	550	Contratação/Renovação dos links da RedeJT - 2020	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspensão	29/09/2020	21/01/2020	08/10/2020		1	Sem reporte do Gerente de Projeto. (EGP-TIC)
19	553	Suporte à Solução de Gabinete Virtual	Antoniél Magalhaes de Carvalho	Em andamento	03/11/2020	31/03/2021	03/11/2020		5	Levantamento de informações junto ao TRT-8 e empresas sobre renovação Citrix. Início do ETP. Entregáveis: - ETP: 60% - TR: 0% - Aquisição: 0%

6. SEÇÃO DE APOIO AO PJE

- Recebimento: 0%
- Implantação: 0%

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

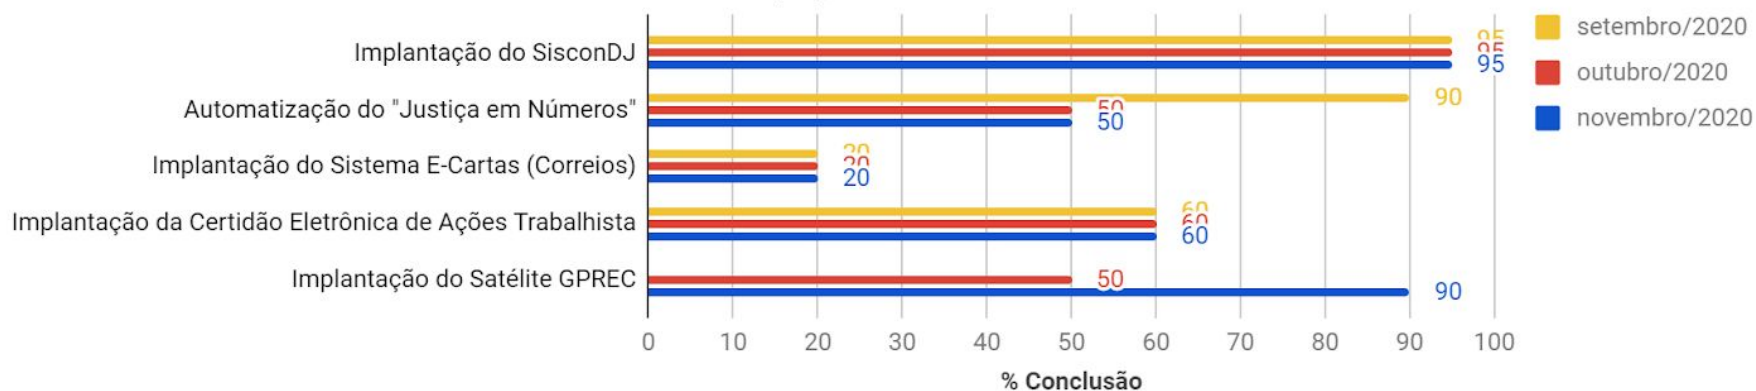


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	477	Implantação do SisconDJ	Gilberto Cunha Filho	Em andamento	05/12/2018	18/12/2020	01/04/2019		95	Atualizada versão em ambiente de homologação. Entregáveis: - Entrega 1: Validado ambiente de homologação - Entrega 2: Implementação de cadastros em ambiente de produção
2	481	Automatização do "Justiça em Números"	Djeison Rafael Neitzke	Suspensão	23/04/2019	31/07/2021	19/06/2019		50	Sem progresso no período. Entregáveis: - Entrega 1: SQL Gerador de XML versão 2020 (100 %) - Entrega 2: App java Transmissor de XML (100%) - Entrega 3: Envio de cargas completas para atendimento do Prêmio CNJ 2020 (100%) - Entrega 4: Automatização mensal da geração e transmissão de XML (40%) - Entrega 5: Implementação do pacote de novos requisitos definidos na Portaria CNJ N° 160 de 09/09/2020 para 2021 (20%) - Entrega 6: Painel BI para acompanhamento da

										geração e transmissão automatizada (0%)
3	504	Implantação do Sistema E-Cartas (Correios)	Gutemberg Pereira Vidal Santos	Suspensão	10/09/2019	31/03/2021	01/11/2019		20	Sem progresso no período. O Setor de Infraestrutura pediu o prazo de 90 dias para implantar a estrutura de "containers", indispensável para prosseguimento do projeto.
4	506	Implantação da Certidão Eletrônica de Ações Trabalhista	Gutemberg Pereira Vidal Santos	Suspensão	27/09/2018	28/02/2021	14/10/2019		60	Houve reunião com a demandante que requereu o prosseguimento do projeto, alegando sua imprescindibilidade ; Após a reunião o Chefe do Setor concordou em atender ao pedido no que tange ao sistema legado SAPT 1; Pendência: O servidor que tratará tecnicamente a matéria estava de férias e aguardando o retorno para discutir prazos.
5	552	Implantação do Satélite GPREC	Gilberto Cunha Filho	Em andamento	01/06/2020	18/12/2020	27/10/2020		90	Entrega do sistema em produção

7. SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

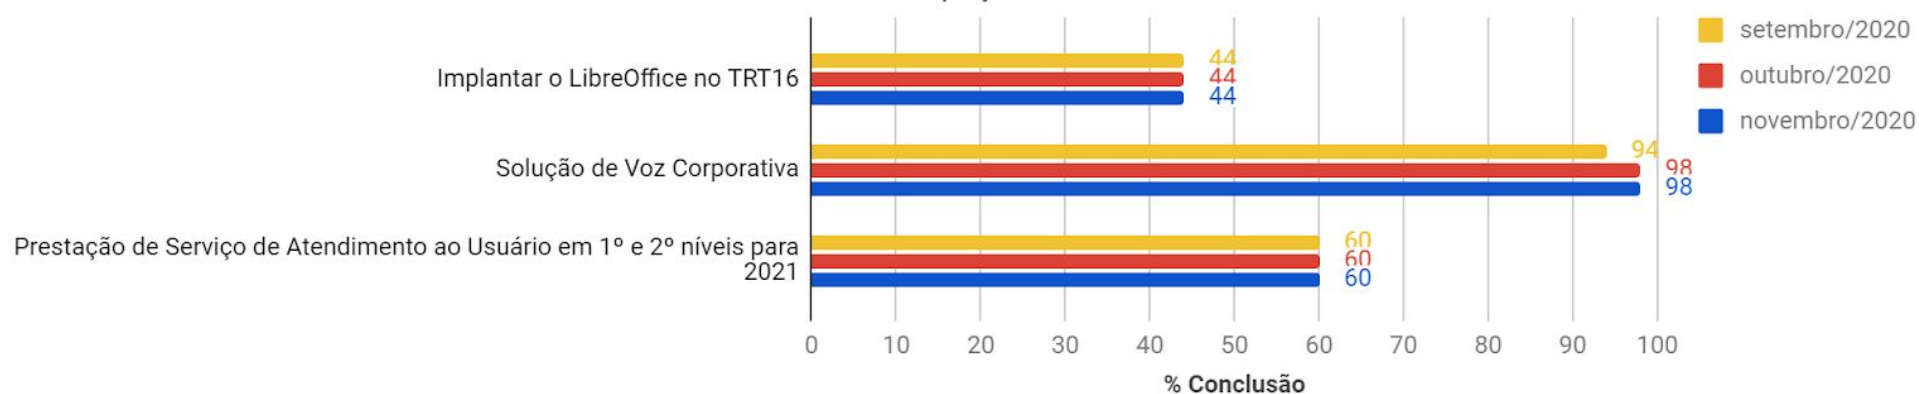


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	351	Implantar o LibreOffice no TRT16	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Suspensão	25/06/2018	30/06/2021	25/06/2018		44	Sem progresso no período. Entregáveis:

										<ul style="list-style-type: none"> - (40%) Instalação do LibreOffice - (0%) Desinstalação do Microsoft Office <p>Mudança: Considerando a pandemia e as dificuldades inerentes ao projeto, adiamento do prazo de conclusão para 30/06/2021.</p>
2	381	Solução de Voz Corporativa	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	27/08/2018	04/12/2020	31/08/2018		98	<p>A solução foi implantada e o PA foi encaminhado para pagamento.</p> <p>Entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> (100%) Adequação da Infraestrutura Física (100%) Recebimento dos equipamentos (100%) Preparação da infraestrutura lógica (100%) Fase presencial de implantação (100%) Fase remota de implantação (100%) Contrato Assinado <p>Pendência: encerramento formal do projeto.</p>
3	537	Prestação de Serviço de Atendimento ao Usuário em 1º e 2º níveis para 2021	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	18/05/2020	06/05/2021	18/05/2020		60	<p>O PA foi enviado para o setor de Assessoramento Contábil para revisão das planilhas de custo.</p> <p>O Termo de Referência foi adequado conforme as recomendações da CPL e encontra-se em análise por aquele setor.</p> <p>Entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (100%) Portaria da Equipe de Planejamento - (100%) Estudo Técnico Preliminar - (90%) Termo de Referência - (0%) Acompanhamento da Licitação - (0%) Contrato Assinado - (0%) Assyst Configurado - (0%) Treinamento Realizado - (0%) Serviço Implantado

8. SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

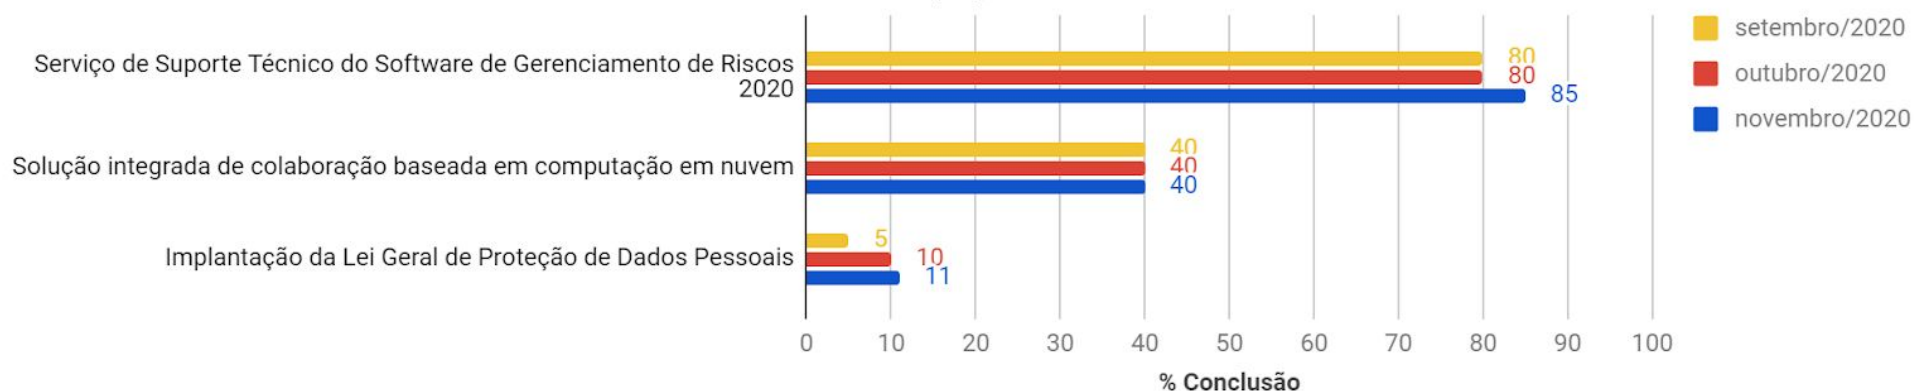

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	483	Serviço de Suporte Técnico do Software de Gerenciamento de Riscos 2020	Jose Augusto	Em andamento	25/04/2019	31/12/2020	16/01/2020		85	Solicitada nova proposta ao fornecedor; Minuta do contrato atualizada conforme solicitado pela administração. Entregáveis: - (100%) 1 Preparação - (100%) 2 Estudo Técnico Preliminar - (100%) 3 Termo de Referência - (25%) 4 Contratação
2	539	Solução integrada de colaboração baseada em computação em nuvem	Jose Augusto	Em andamento	17/06/2020	05/02/2021	19/06/2020		40	Verificado dotação orçamentária para execução da contratação; PA encaminhado a secretaria administrativa para elaboração da minuta do contrato. Entregáveis: - (100%) Equipe de planejamento - (100%) ETP - Estudo Técnico Preliminar - (0%) TR - Termo de Referência - (0%) Acompanhamento da licitação - (0%) Gerenciamento da implantação

3	551	Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	Jose Augusto	Em andamento	29/09/2020	29/01/2021	01/09/2020		11	<p>Realizada a 3ª reunião do grupo de trabalho da LGPD; Aprovação da aplicação do questionário pela presidência;</p> <p>Início da aplicação do questionário de mapeamento de dados pessoais.</p> <p>Entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (10%) Entrega 1: Capacitação inicial (básica) de servidores e magistrados na lei geral de proteção de dados pessoais - (20%) Entrega 2: Mapeamento inicial de dados pessoais tratados na justiça do trabalho no Maranhão - (100%) Entrega 3: Criação de área no site destinado para Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - (0%) Entrega 4: Criação de uma política de privacidade de dados.
---	-----	--------------------------------------------------------	--------------	---------------------	------------	------------	------------	--	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
