



TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

PORTFÓLIO DE PROJETOS DE TIC


OUTUBRO/2020

EGP-TIC


SUMÁRIO

1.	RESUMO DOS PROJETOS	3
1.1.	PROJETOS INCLUÍDOS NO PORTFÓLIO	4
1.2.	PROJETOS INICIADOS	4
1.3.	PROJETOS CONCLUÍDOS	4
1.4.	PROJETOS CANCELADOS	4
2.	COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES	5
3.	SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	7
4.	SETOR DE GOVERNANÇA DE TI	9
5.	SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL	11
6.	SEÇÃO DE APOIO AO PJE	16
7.	SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE	17
8.	SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	19


1. RESUMO DOS PROJETOS




Temas

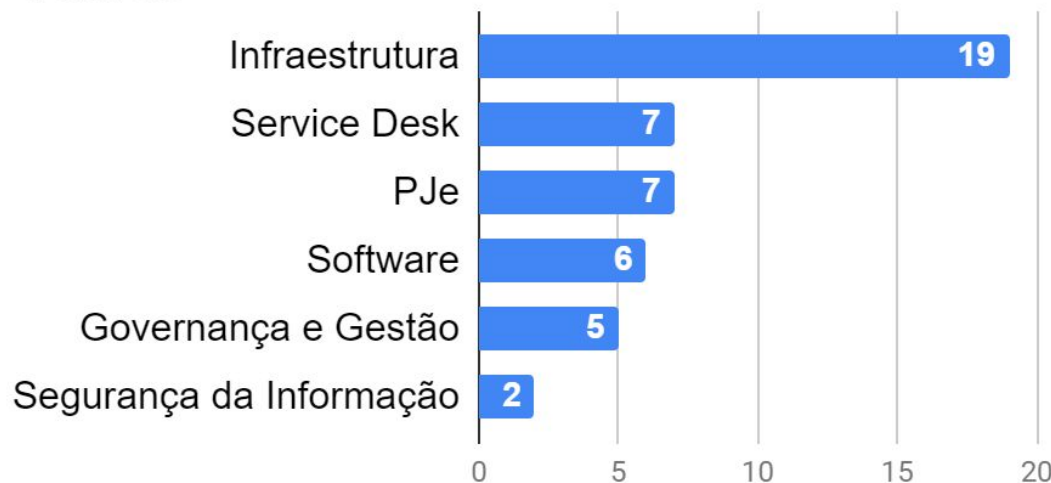

Projetos nas unidades

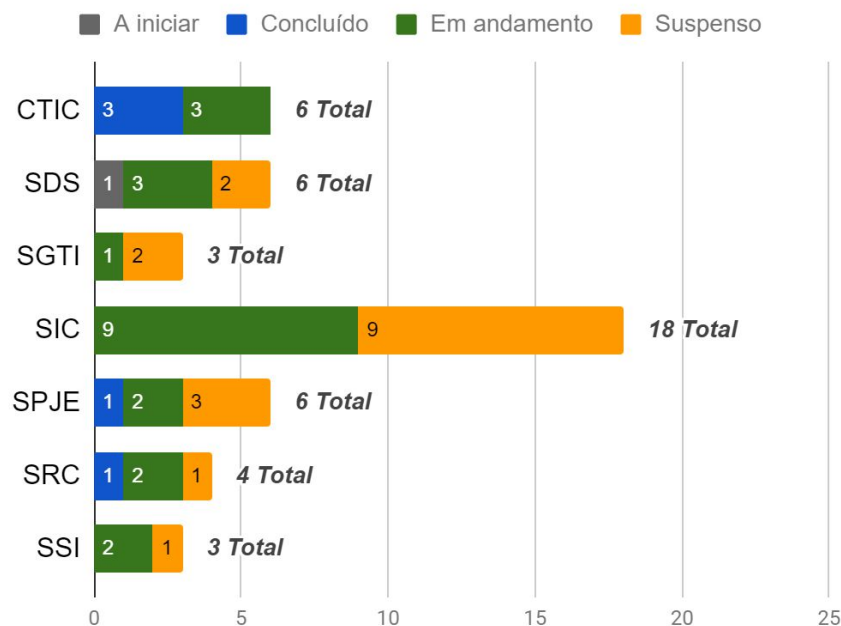

Situação

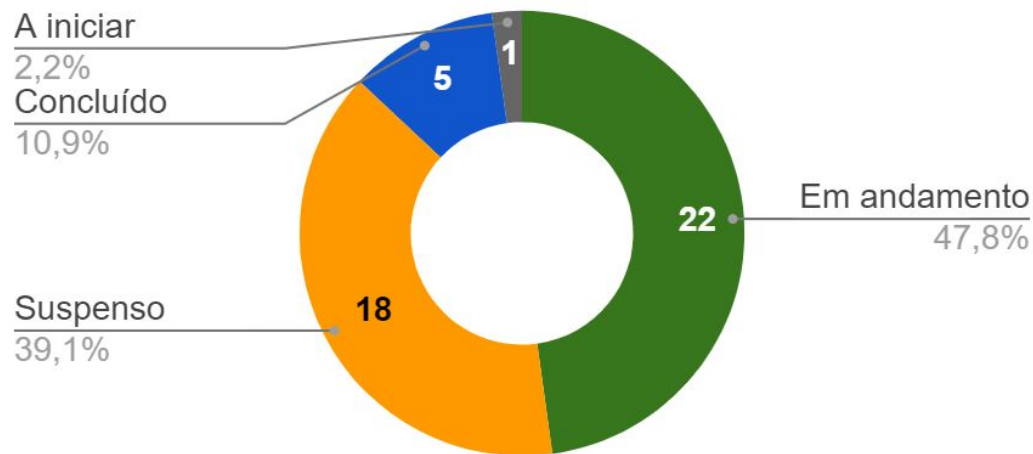

1.1. PROJETOS INCLUÍDOS NO PORTFÓLIO

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
552	Implantação do Satélite GPREC	Gilberto Cunha Filho	SPJE	01/06/2020	27/10/2020		Em andamento

1.2. PROJETOS INICIADOS

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
528	Formalizar e implantar o Processo de Gerenciamento de Nível de Serviços de TIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	SGTI	01/04/2020	19/10/2020		Em andamento
550	Contratação/Renovação dos links da RedeJT - 2020	Rodrigo Silveira Alexandre	SIC	29/09/2020	08/10/2020		Em andamento
552	Implantação do Satélite GPREC	Gilberto Cunha Filho	SPJE	01/06/2020	27/10/2020		Em andamento


1.3. PROJETOS CONCLUÍDOS

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
56	Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0	Djeison Rafael Neitzke	SPJE	06/04/2018	06/04/2018	19/10/2020	Concluído
527	Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária AJ/JT	Stanley Araujo de Sousa	CTIC	27/02/2020	01/07/2020	21/10/2020	Concluído
543	Publicação de ATA para Notebooks	Stanley Araujo de Sousa	CTIC	17/06/2020	07/07/2020	29/10/2020	Concluído
546	Solução de videoconferência destinada à realização de audiências, sessões e reuniões telepresenciais	Stanley Araujo de Sousa	CTIC	09/09/2020	09/09/2020	29/10/2020	Concluído
547	Suporte à Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços 2020	Carlos Eduardo Ferreira Marins	SRC	09/09/2020	11/09/2020	15/10/2020	Concluído

1.4. PROJETOS CANCELADOS

2.COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

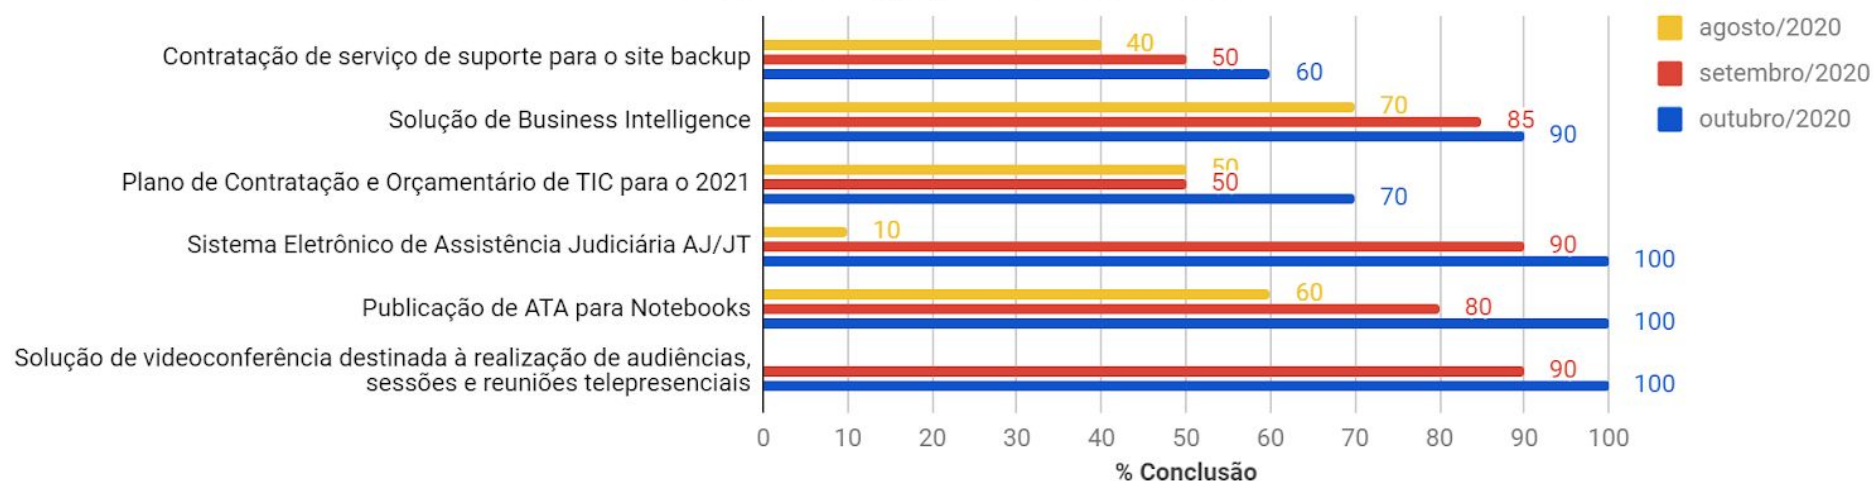


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	519	Contratação de serviço de suporte para o site backup	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	15/01/2020	16/12/2020	19/05/2020		60	Revisão do Termo de Referência Entregáveis: - Entrega 1: ETP(doc.018) - Entrega 2: Dotação Orçamentária(doc.034); Riscos e problemas: Dificuldade com os aspectos administrativos da contratação.
2	524	Solução de Business Intelligence	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	12/02/2020	30/11/2020	12/02/2020		90	Elaborado os entregáveis 4, 5, 6 e 7. Entregáveis: - Entrega 1: ETP(doc.018, P.A.2605/2020) - Entrega 2: TR (doc.031, P.A. 2605/2020) - Entrega 3: Minuta do Contrato(doc.049) - Entrega 4: Edital da Licitação (doc.054) - Entrega 5: ATA do Pregão(doc.59) - Entrega 6: Proposta Comercial Vencedora(doc.061) - Entrega 7: PARECER NAJ N° 498/2020(doc.064)

3	525	Plano de Contratação e Orçamentário de TIC para o 2021	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	18/02/2020	30/11/2020	18/02/2020		70	Elaboração da minuta do Plano de Contratação. Entregáveis: - Entrega 1: Coleta das necessidades externas a TIC - Entrega 2: Coleta das necessidades internas a TIC - Entrega 3: Consolidação das necessidades
4	527	Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária AJ/JT	Stanley Araujo de Sousa	Concluído	27/02/2020	21/10/2020	01/07/2020	21/10/2020	100	Aceite de finalização do projeto pela unidade demandante. Entregáveis: - Entrega 1: Edital de Credenciamento de Peritos, Tradutores e Intérpretes nº 01/2020 , disponível no endereço: https://www.trt16.jus.br/site/conteudo/publicacoes/pub_inteiro_teor.php?id=58363 ; - Entrega 2: Elaboração de documentação do sistema, disponibilizada para o público externo no endereço https://www.trt16.jus.br/servicos/judiciais/assistencia-judiciaria-dajustica-do-trabalho-ajjt , além de documentação específica para a Central de Atendimento de TI; - Entrega 3: Capacitação da equipe responsável pela validação dos cadastros (doc.026); - Entrega 4: Participação em Treinamento (P.A. 3828/2020) - Entrega 5: Termo de Finalização do Projeto(doc.031)
5	543	Publicação de ATA para Notebooks	Stanley Araujo de Sousa	Concluído	17/06/2020	29/10/2020	07/07/2020	29/10/2020	100	Finalização da licitação pelo órgão gestor. Entregáveis: - Entrega 1: ARP TRT 8 11/2020, doc.012, P.A. 3250/2020; - Entrega 2: DOU TRT 8 11/2020, doc.013, P.A. 3250/2020; - Entrega 3: PE TRT8 23/2020, doc.014, P.A. 3250/2020
6	546	Solução de videoconferência destinada à realização de audiências, sessões e reuniões telepresenciais	Stanley Araujo de Sousa	Concluído	09/09/2020	29/10/2020	09/09/2020	29/10/2020	100	Projeto finalizado. Entregáveis: - Entrega 1: ETP da Licitação (P.A. 4455/2020, doc.004) - Entrega 2: TR da Licitação (P.A. 4455/2020, doc.005) - Entrega 3: Declaração de inexistência de Parentesco (P.A. 4455/2020, doc.015)

- Entrega 4: 4 Termo Aditivo do Contrato (P.A. 7224/2017, doc.222)

3. SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

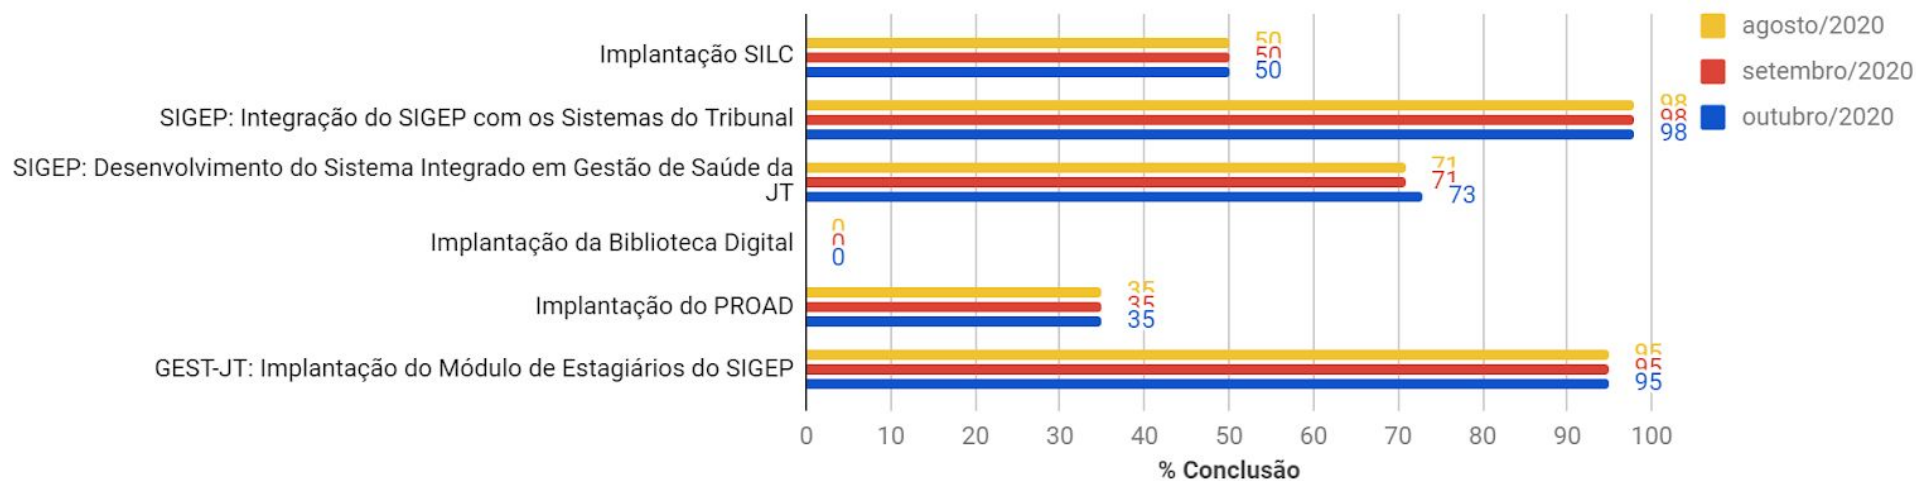


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	19	Implantação SILC	Andre Pereira Nunes	Suspensão	06/02/2018	18/12/2020	23/04/2018		50	Sem progressos no período. Projeto ainda não retomado.
2	32	SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	Andre Pereira Nunes	Em andamento	24/05/2018	28/02/2021	04/06/2018		98	Identificação e implementação de funcionalidades que existem no legado, porém não existem no SIGEP ou não atendem no formato que foram disponibilizadas; Migração dos dados da escala de férias do legado para o SIGEP; Mudança: Conforme Despacho da CGP (Doc. 06 do PA 3713/2018), foi solicitado o adiamento da interrupção da comunicação entre os sistemas do Tribunal e o Sistema RH Legado para 01/01/2021. A justificativa é a

										necessidade da produção de funcionalidades e relatórios que precisam ser criados enquanto os dados existem em paralelo, para fins de teste e comparação;
3	187	SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	Diogo Duailibe da Silva	Em andamento	25/08/2017	19/12/2022	29/08/2017		73	Geração das releases RC.1 e RC.2 da 1.16.0.0; Correção de erros encontrados nas releases; Início da integração entre o Assinador JWS. Entregáveis: - Entrega 1: Estruturação da arquitetura proposta (87%) - Entrega 2: Módulo de Agenda e Tabelas Básicas (94%) - Entrega 3: Módulo Ocupacional (91%) - Entrega 4: Módulo Pericial (96%) - Entrega 5: Módulo de Segurança do Trabalho (30%) - Entrega 6: Módulo Assistencial (90%) - Entrega 7: Módulo de segurança da NGS1 (67%) - Entrega 8: Módulo de Relatórios Gerenciais (38%)
4	279	Implantação da Biblioteca Digital	Andre Pereira Nunes	A iniciar	01/01/2018	18/12/2020			0	Projeto não iniciado.
5	499	Implantação do PROAD	Andre Pereira Nunes	Em andamento	28/02/2019	18/12/2021	28/08/2019		35	Realizado reunião entre CTIC, Desenvolvimento e Infraestrutura para definição da implantação do PROAD em Homologação, em infraestrutura ágil (a fim de resolver a pendência externa informada no RDS de Setembro de 2020); Mudança: Após a reunião, ficou acordado que, por necessidade de prioridades do PJE e do Módulo de Passivos, o setor de Infraestrutura informou que a implantação do PROAD entraria em pauta somente em 2021. Por conta disso, será necessário o ajuste de prazo do Projeto para 18/12/2021. Entregáveis: (90%) ENTREGA 1: Preparação da Infraestrutura (20%) ENTREGA 2: Acordo de Cooperação Técnica com o TRT12 (0%) ENTREGA 3: Configuração do Sistema (0%) ENTREGA 4: Adequação do SUAP e SISPAE (0%) ENTREGA 5: Visita Técnica e Treinamento (0%) ENTREGA 6: PROAD e PROAD-OUV em Produção
6	533	GEST-JT: Implantação do Módulo	Andre Pereira	Suspensão	06/05/2020	30/10/2020	07/05/2020		95	Sem progresso no período.

de Estagiários do SIGEP	Nunes									Entregáveis: (100%) ENTREGA 1: Preparação da Infra estrutura (100%) ENTREGA 3: Integração com outros sistemas do tribunal (100%) ENTREGA 2: Migração de Dados (80%) ENTREGA 4: Disponibilização em produção, com Manual de Operações Pendências: Aguardando SIC disponibilizar ambiente de PRODUÇÃO (S60142)
-------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

4. SETOR DE GOVERNANÇA DE TI

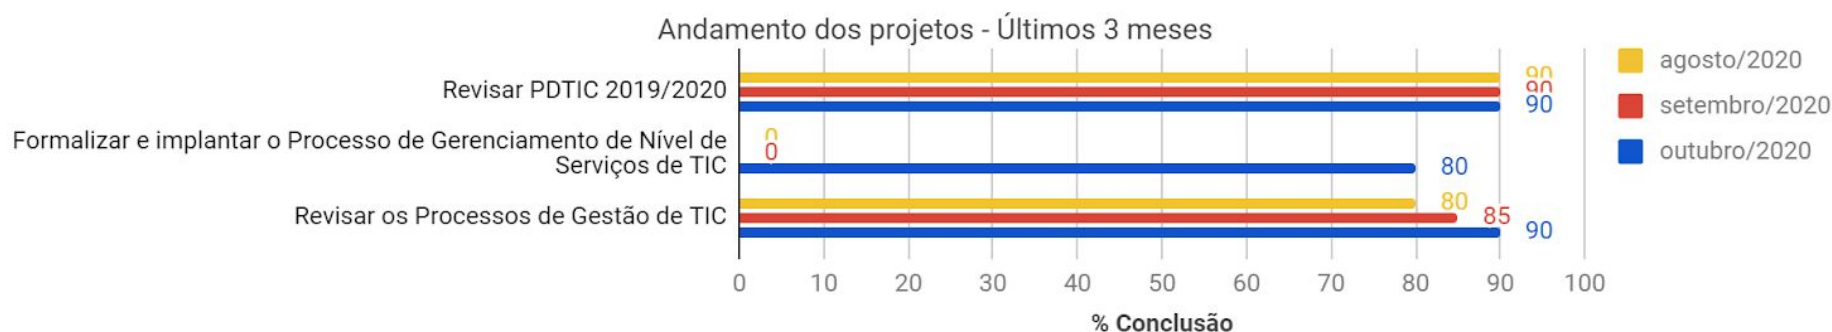


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	509	Revisar PDTIC 2019/2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	Suspenso	04/11/2019	18/12/2020	14/11/2019		90	Sem progresso no período. A minuta da revisão do PDTIC continua aguardando apreciação e publicação da matéria pela Presidência. Entregáveis: - (100%) Avaliação do resultado das metas e ações previstas para 2019 - (100%) Necessidades mapeadas e priorizadas para 2020 - (100%) Minuta da nova versão do PDTIC elaborada - (100%) Nova versão do PDTIC apreciada pelo CGovTIC - (50%) Nova versão do PDTIC publicada pela Presidência.

2	528	Formalizar e implantar o Processo de Gerenciamento de Nível de Serviços de TIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	01/04/2020	18/12/2020	19/10/2020		80	<p>Projeto iniciado.</p> <p>Entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (90%) Política de gerenciamento do processo de acordo de nível de serviço elaborada e publicada; - (80%) Processo de gerenciamento do acordo do nível de serviço definido e publicado; - (80%) Acordos de níveis de serviços definidos; - (80%) Acordos de níveis de serviços configurados no assyst. <p>Pendências: Política aguarda análise e formalização pela Presidência.</p>
3	531	Revisar os Processos de Gestão de TIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	Suspensão	24/04/2020	18/12/2020	27/04/2020		90	<p>Sem progresso no período. Pendência: o projeto aguarda deliberação da presidência acerca dos normativos a serem instituídos/atualizados.</p> <p>Entregáveis: (100%) Planejamento e Gerenciamento das Capacitações de TIC atualizado (100%) Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC atualizado (100%) Gerenciamento de Demandas atualizado (100%) Planejamento Estratégico e Tático de TIC atualizado (100%) Gerenciamento de Portfólio de TIC atualizado (100%) Gerenciamento de Software atualizado (100%) Gerenciamento de Problemas atualizado (100%) Gerenciamento da Central de Serviços de TIC atualizado (20%) Gerenciamento de Contratações de Soluções de TIC atualizado (Cancelado) (100%) Gerenciamento de Projetos de TIC atualizado (100%) Gerenciamento de Incidentes atualizado (100%) Gerenciamento de Requisição atualizado (100%) Gerenciamento de Mudança e Liberação atualizado (50%) Normativos dos Processos de Gestão de TIC publicados</p> <p>Mudança no prazo de entrega para 18/12/2020 devido atraso na publicação dos normativos.</p>

5. SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

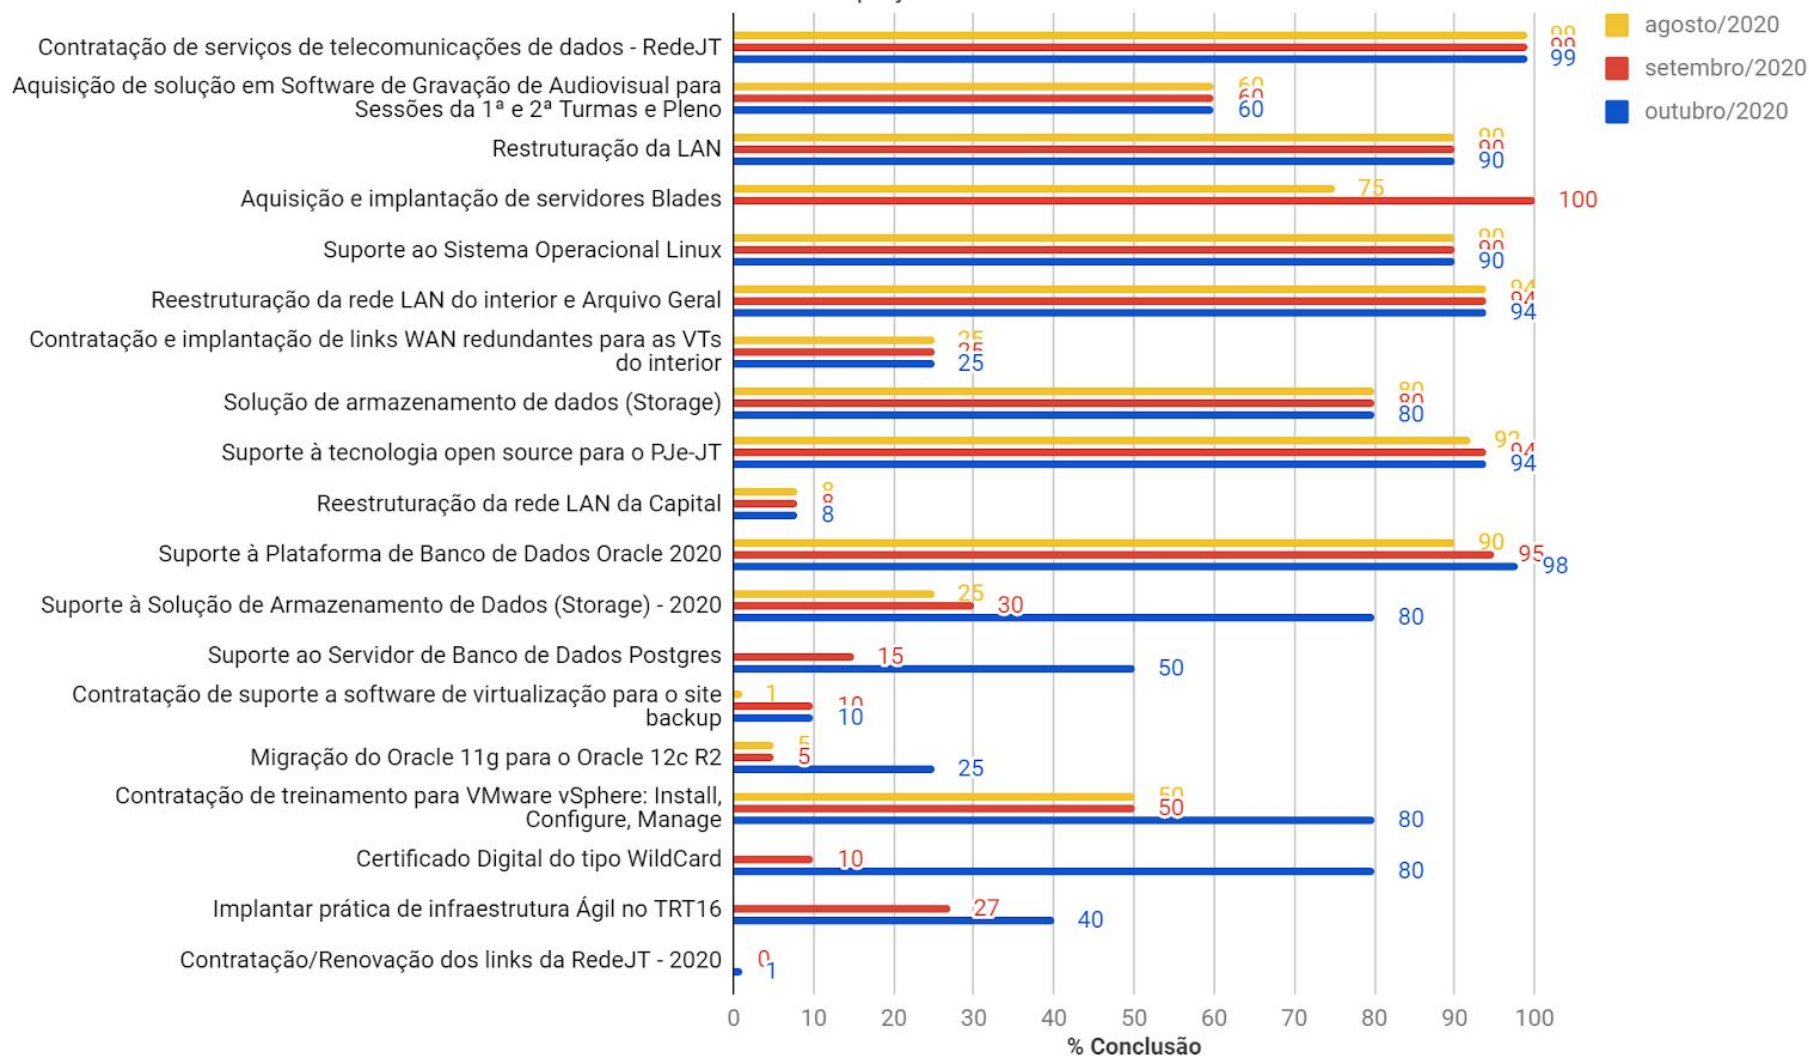

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	233	Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspenso	12/01/2018	06/11/2020	19/01/2018		99	Sem progresso no período.
2	358	Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno	Pablo Teofilo Durans	Suspenso	06/07/2018	30/06/2021	22/10/2018		60	Sem progresso no período. Com a mudança da administração, a coordenação decidiu suspender o projeto e provocar a nova chefia para definir a demanda da solução. Entregáveis: - ETP e TR: (90%); - Publicação da Licitação (0%); - Contratação (0%); - Implantação (0%);
3	442	Reestruturação da LAN	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspenso	17/10/2018	30/11/2020	01/11/2018		90	Sem progresso no período.
4	461	Suporte ao Sistema Operacional Linux	Fernando Rola Ferreira Filho	Em andamento	29/01/2019	04/12/2020	30/01/2019		90	Processo administrativo enviado a diretoria geral para conhecimento e apreciação da ARP publicada pelo TRT5.
5	476	Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo Geral	Antoniell Magalhaes de Carvalho	Suspenso	01/04/2019	31/03/2021	16/04/2019		94	Sem progresso no período. Entregáveis restantes: - Implantação do WiFi (75%)
6	480	Contratação e implantação de links WAN redundantes para as VTs do interior	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspenso	15/04/2019	31/12/2020	08/03/2019		25	Sem progresso no período.
7	490	Solução de armazenamento de dados (Storage)	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Suspenso	18/06/2019	04/12/2020	18/06/2019		80	Cronograma aprovado: - Instalação física e lógica dos storages do site principal e do site secundário durante a semana do dia 03 a 06/11 - Migração e transferência de conhecimento durante a semana do dia 09 a 13/11. (Sendo em turnos diferentes). Entregáveis: - Entrega 1: Storage do Site Principal (0%) - Entrega 2: Storage do Site Secundário (0%)
8	517	Suporte à tecnologia open source para o PJe-JT	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspenso	09/12/2019	30/11/2020	09/12/2019		94	Sem progresso no período. Pendência: A minuta do contrato está pronta e aguarda análise, deliberação e/ou assinatura por parte da administração.
9	518	Reestruturação da rede LAN da Capital	Antoniell Magalhaes de Carvalho	Suspenso	13/01/2020	30/06/2021	27/01/2020		8	Sem progresso no período. Entregáveis (50%) Switches do Bloco C (0%) Switches do Bloco B


										(0%) Switches do Bloco A (0%) Switches do Forum Astolfo Serra (0%) Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e Storages Sede (0%) Alteração dos IPs de Servidores Sede (0%) Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e Storages do FAS
10	536	Suporte à Plataforma de Banco de Dados Oracle 2020	Leonel Pereira	Em andamento	13/05/2020	30/11/2020	13/05/2020		98	Acompanhamento da Renovação/Contratação do serviço. A Presidência autorizou a contratação por 12 meses. A seguir o contrato foi assinado pelo Presidente em exercício e encaminhado para coleta da assinatura do representante da Oracle e de duas testemunhas. Entregáveis: - Entrega 1: contrato assinado pelo contratante pela contratada (100%)
11	538	Suporte à Solução de Armazenamento de Dados (Storage) - 2020	João Diego Rocha Lima	Em andamento	04/06/2020	30/11/2020	24/06/2020		80	O PA encontra-se na DG a espera da certidão relativa ao FGTS e da consulta da disponibilidade de dotação orçamentária junto a SOF. Entregáveis: - Entrega: Minuta do contrato (100%)
12	540	Suporte ao Servidor de Banco de Dados Postgres	Romulo Moura	Suspensão	15/06/2020	31/12/2020	22/06/2020		50	Realizado consulta de informações atualizadas do Tribunal que está conduzindo a contratação nacional; Entregáveis: - Entrega 1: DOD e TAP (100%) - Entrega 2: Portaria de Planejamento (100%) - Entrega 3: Elaboração de ETP e TR (50%); - Entrega 4: Acompanhamento da contratação e registro da ARP (50%); - Entrega 5: Registro de preços publicado (0%);
13	541	Contratação de suporte a software de virtualização para o site backup	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	17/06/2020	18/12/2020	22/06/2020		10	Entregáveis: - Entrega 1: (100%) ETP - aprovado pela Administração no dia 27/08/2020 - Entrega 2: (50%) TR - Integrante Administrativo solicitou a correção e a adaptação do Termo de Referência a um novo modelo disponibilizado pelo Setor de Licitação no dia 26/10/2020 - Entrega 3: (100%) Análise de Riscos - encaminhado para o Gestor do Contrato e Integrante Demandante no dia 24/09/2020 - Entrega 4: (0%) Serviço de Suporte Técnico renovado Riscos e problemas: - Falta de orçamento para concluir a contratação; - Manutenção do serviço solução de virtualização do site backup sem suporte técnico especializado frente à crescente demanda de serviços internos;

14	542	Migração do Oracle 11g para o Oracle 12c R2	Leonel Pereira	Em andamento	06/07/2020	31/01/2021	07/07/2020		25	As LUNs foram entregues e os sistemas operacionais customizados. Foram realizadas tarefas de instalação e configuração de pré-requisitos necessários à instalação do Grid Infrastructure e do Oracle Database: Entregáveis: - Entrega 1: Oracle RAC instalado, banco de dados de produção importado para o novo ambiente - Entrega 2: Novo servidor rman instalado e configurado pronto para a geração dos backups do novo ambiente Riscos e problemas: equipe não dedicada ao projeto com ausência do servidor chave no mês de dezembro.
15	545	Contratação de treinamento para VMware vSphere: Install, Configure, Manage	João Diego Rocha Lima	Em andamento	29/07/2020	13/11/2020	01/08/2020		80	As propostas das empresas foram atualizadas e encaminhadas para a Escola Judicial. Entregáveis: - ETP e propostas das empresas atualizadas(100%)
16	548	Certificado Digital do tipo WildCard	Yuri Sousa Oliveira	Em andamento	18/09/2020	12/11/2020	30/09/2020		80	- Criado o ETP - Estudo Técnico Preliminar; - Criado o TR - Termo de Referência; - Criado o Despacho CTIC para DG; Entregáveis - Entrega 1: Cotação de preços para a solução de certificado digital SSL do tipo Wildcard (100%); - Entrega 2: ETP - Estudo Técnico Preliminar (100%); - Entrega 3: TR - Termo de referencia (100%) ; - Entrega 4: Despacho CTIC para a DG (100%);
17	549	Implantar prática de infraestrutura Ágil no TRT16	Pablo Teofilo Durans	Em andamento	03/08/2020	18/12/2020	03/08/2020		40	- Construção do Cluster do PJe Produção já iniciada; - PJe de Homologação em pleno funcionamento no novo cluster; - Aplicação de PJe produção parametrizada; - Monitoramento e servidor de logs construídos para ambiente de homologação; - Lições aprendidas tem sido documentadas. Entregáveis: Capacitação da Equipe (95%) Peso: 15 Repositório de Imagens de Serviços (100%) Peso: 5 Infraestrutura de Orquestração de Serviços (55%) Peso: 20 PJe Homologação (100%) Peso: 2 PJe Produção (30%) Peso: 3 Administrativo Homologação (100%) Peso: 2 Administrativo Produção (10%) Peso: 3 PJe em nova infraestrutura (29%) Peso: 20 Homologação (100%) Peso: 3 Produção (20%) Peso: 5 Satélites Homologação (0%) Peso: 1

										<ul style="list-style-type: none"> Satélites Produção (0%) Peso: 1 Sistemas Administrativos em nova infraestrutura (4 %) Peso: 15 Homologação (10%) Peso: 4 Produção (0%) Peso: 6 Monitoramento (50%) Peso: 10 Automação de Deploy em ambiente de Homologação (0%) Peso: 15 Insumos para revisão do Processo de Gerenciamento de Software (30%) Peso: 10
18	550	Contratação/Renovação dos links da RedeJT - 2020	Rodrigo Silveira Alexandre	Em andamento	29/09/2020	21/01/2021	08/10/2020		1	<p>Iniciada elaboração do ETP. Entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estudo Técnico Preliminar; - Termo de Referência; - Contrato; - Link concentrador na Capital; - Link Açailândia; - Link Bacabal; - Link Balsas; - Link Barra do Corda; - Link Barreirinhas; - Link Caxias; - Link Chapadinha; - Link Estreito; - Link Imperatriz; - Link Imperatriz (VT antiga); - Link Pedreiras; - Link Pinheiro; - Link Presidente Dutra; - Link Santa Inês; - Link São João dos Patos; - Link Timon;

6. SEÇÃO DE APOIO AO PJE

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

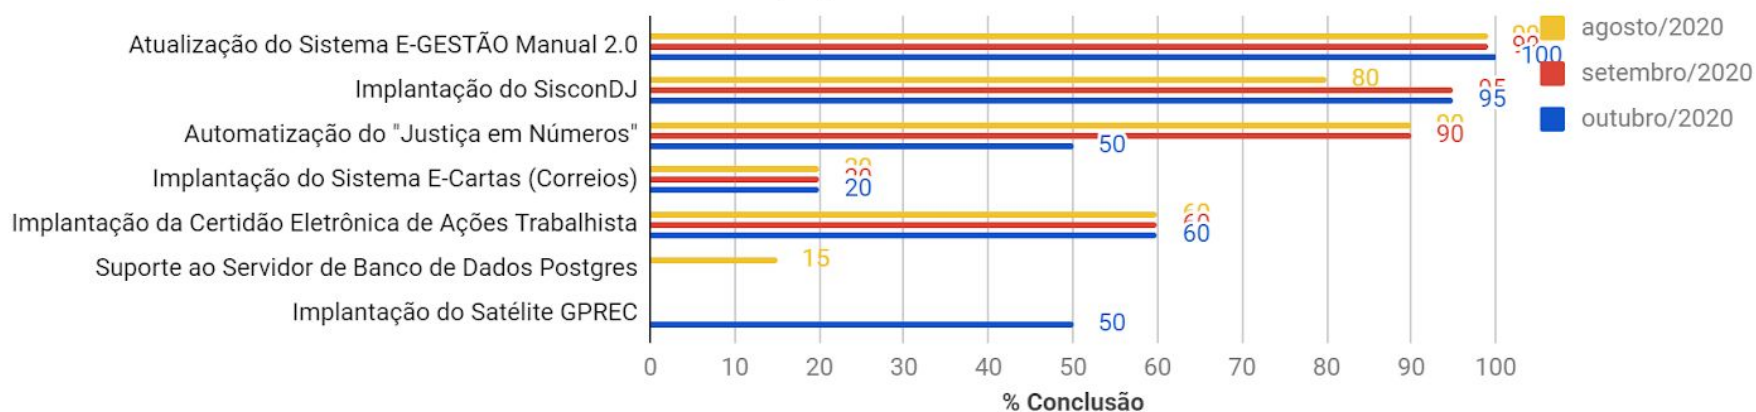


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	56	Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0	Djeison Rafael Neitzke	Concluído	06/04/2018	19/10/2020	06/04/2018	19/10/2020	100	Projeto finalizado.
2	477	Implantação do SisconDJ	Gilberto Cunha Filho	Em andamento	05/12/2018	30/11/2020	01/04/2019		95	Validado ambiente de homologação; Implementação de cadastros em produção; Solicitação de validação por parte da equipe do Banco do Brasil em ambiente de produção; Entregáveis: - Entrega 1: Validado ambiente de homologação - Entrega 2: Implementação de cadastros em ambiente de produção
3	481	Automatização do "Justiça em Números"	Djeison Rafael Neitzke	Suspensão	23/04/2019	31/07/2021	19/06/2019		50	Sem progresso no período. Mudanças no escopo do projeto, com novos requisitos definidos na Portaria CNJ N° 160 de 09/09/2020 - https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3453 -, e no prazo final, para 31/07/2021.
4	504	Implantação do Sistema E-Cartas (Correios)	Gutemberg Pereira Vidal Santos	Suspensão	10/09/2019	30/07/2021	01/11/2019		20	Sem progresso no período. O Setor de Infraestrutura pediu o prazo de 90 dias para implantar a estrutura de

										"containers", indispensável para prosseguimento do projeto.
5	506	Implantação da Certidão Eletrônica de Ações Trabalhista	Gutemberg Pereira Vidal Santos	Suspensão	27/09/2018	09/05/2021	14/10/2019		60	Sem progresso no período. Sugestão de cancelamento do projeto considerando que: - A versão 2.5 do PJe veio com a funcionalidade OBJETO deste sistema no que diz respeito aos processos eletrônicos; - O TRT 16 recebeu o selo de 100% PJe;
6	552	Implantação do Satélite GPREC	Gilberto Cunha Filho	Em andamento	01/06/2020	18/12/2020	27/10/2020		50	Entrega do ambiente de homologação do GPREC e início da parametrização do ambiente de produção; Entregáveis: - Entrega 1: Ambiente de homologação

7. SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

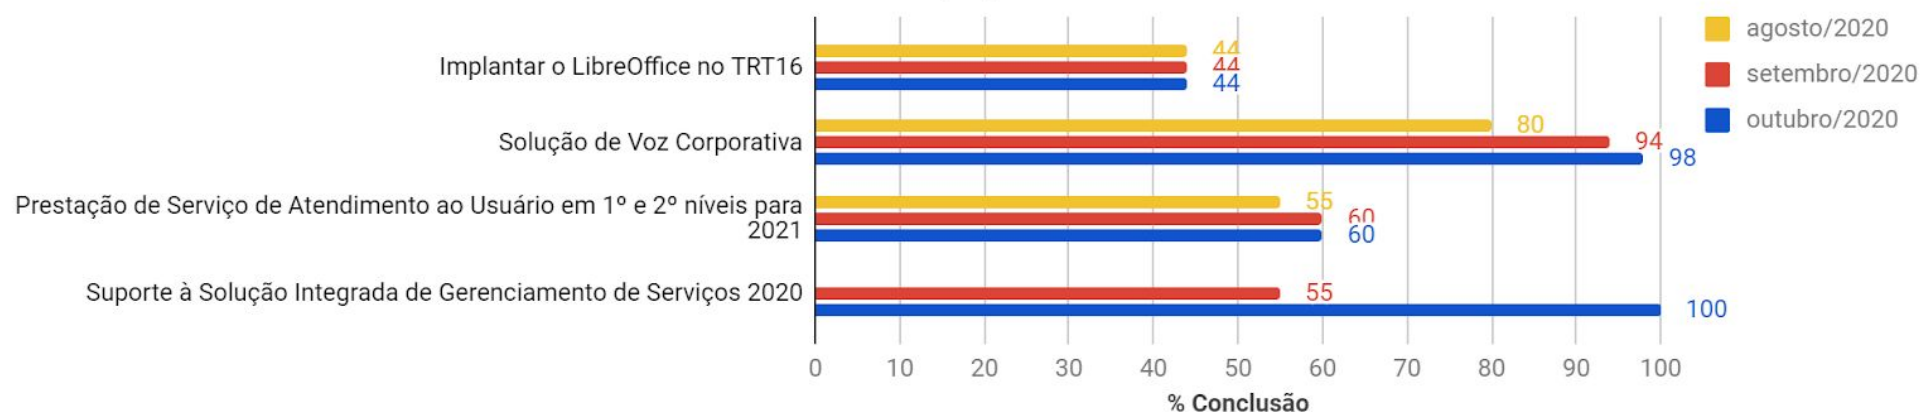


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	351	Implantar o LibreOffice no TRT16	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Suspensão	25/06/2018	18/12/2020	25/06/2018		44	Sem progresso no período. Entregáveis: - (40%) Instalação do LibreOffice - (0%) Desinstalação do Microsoft Office
2	381	Solução de Voz Corporativa	Carlos Eduardo	Em	27/08/2018	20/11/2020	31/08/2018		98	- Instalados 90% dos telefones IP;

			Ferreira Marins	andamento							<ul style="list-style-type: none"> - Migrados todos os ramais analógicos mapeados; - Instalado o Gravador, o Tarifador, a Criptografia, o Virtual Atendant, entre outros serviços; <p>Entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (100%) Contrato Assinado - (100%) Adequação da Infraestrutura Física - (100%) Recebimento dos equipamentos - (100%) Preparação da infraestrutura lógica - (60%) Fase presencial de implantação - (100%) Fase remota de implantação <p>Muanças: Postergação da data de conclusão do projeto para 20/11/2020 devido a complicações operacionais durante a implantação.</p>
3	537	Prestação de Serviço de Atendimento ao Usuário em 1º e 2º níveis para 2021	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	18/05/2020	01/05/2021	18/05/2020		60	<p>Assinado um aditivo emergencial do contrato vigente até 06/05/2021; Realizadas adequações no texto do TR e o Processo foi enviado para o assessoramento contábil para revisão de planilhas. Pendência da análise das planilhas pelo assessoramento contábil.</p> <p>Entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (100%) Portaria da Equipe de Planejamento - (100%) Estudo Técnico Preliminar - (90%) Termo de Referência - (0%) Acompanhamento da Licitação - (0%) Contrato Assinado - (0%) Assyst Configurado - (0%) Treinamento Realizado - (0%) Serviço Implantado <p>Mudança: Prorrogação do prazo para conclusão do projeto a fim de acompanhar a nova vigência do contrato atual que vai até 06/05/2021 e devido à grande demanda imposta pelo projeto de implantação da nova solução de voz do TRT16.</p>	
4	547	Suporte à Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços 2020	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Concluído	09/09/2020	19/10/2020	11/09/2020	15/10/2020	100	<p>Projeto concluído.</p> <p>Entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (100%) ETP - (100%) Aditivo ou contrato assinado 	

8. SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

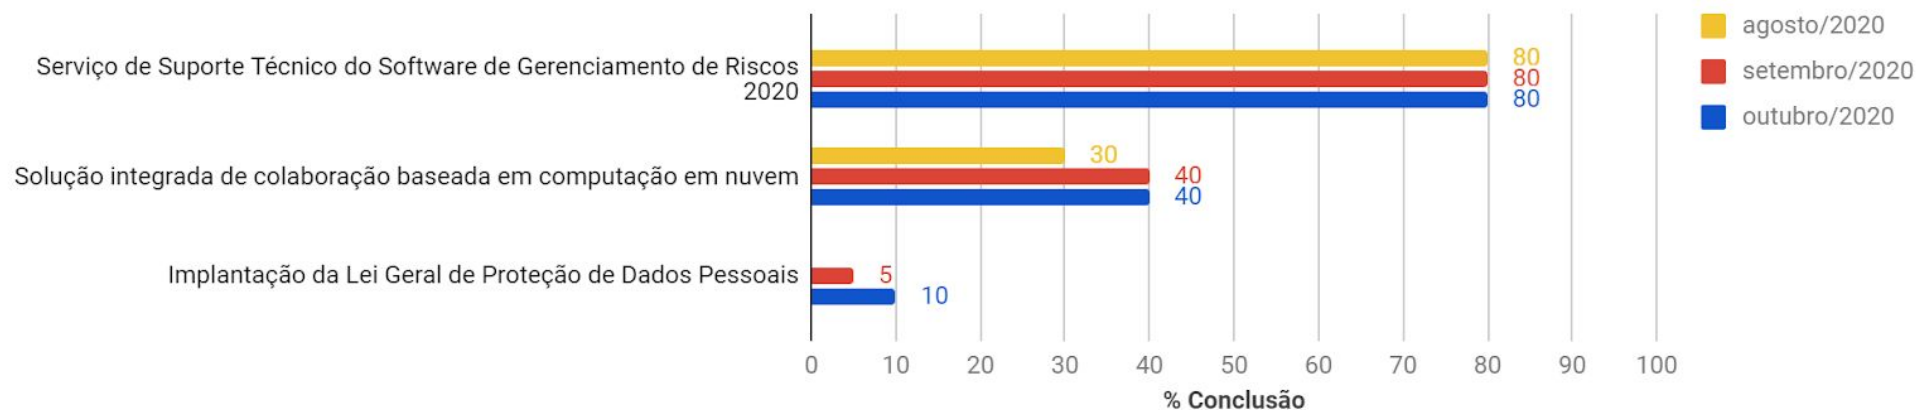

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	483	Serviço de Suporte Técnico do Software de Gerenciamento de Riscos 2020	Jose Augusto	Em andamento	25/04/2019	31/12/2020	16/01/2020		80	Solicitada nova proposta de preço devido ao período. Entregáveis: - (100%) 1 Preparação - (100%) 2 Estudo Técnico Preliminar - (100%) 3 Termo de Referência - (0%) 4 Contratação
2	539	Solução integrada de colaboração baseada em computação em nuvem	Jose Augusto	Suspense	17/06/2020	31/01/2021	19/06/2020		40	Sem progresso no período. Entregáveis: - (100%) Equipe de planejamento - (100%) ETP - Estudo Técnico Preliminar - (0%) TR - Termo de Referência - (0%) Acompanhamento da licitação - (0%) Gerenciamento da implantação
3	551	Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	Jose Augusto	Em andamento	29/09/2020	18/12/2020	01/09/2020		10	Realizada a segunda reunião do grupo de trabalho; Criação, no ambiente de homologação, da área reservada lei geral de proteção de dados; Apresentação da recomendação 73/2020 do CNJ;

										<p>Minuta do relatório a ser enviado ao CNJ sobre a situação de adequação do TRT16 a lei geral de proteção de dados pessoais;</p> <p>Entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrega 1: Capacitação inicial (básica) de servidores e magistrados na lei geral de proteção de dados pessoais (5%) - Entrega 2: Mapeamento inicial de dados pessoais tratados na justiça do trabalho no Maranhão (5%) - Entrega 3: Criação de área no site destinado para Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (90%) - Entrega 4: Criação de uma política de privacidade de dados (0%). <p>Riscos e problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servidores não dedicados integralmente ao projeto.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
