



TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

PORTFÓLIO DE PROJETOS DE TIC


SETEMBRO/2020

EGP-TIC


SUMÁRIO

1.	RESUMO DOS PROJETOS	3
1.1.	PROJETOS INCLUÍDOS NO PORTFÓLIO	4
1.2.	PROJETOS INICIADOS	4
1.3.	PROJETOS CONCLUÍDOS	4
1.4.	PROJETOS CANCELADOS	4
2.	COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES	5
3.	SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	7
4.	SETOR DE GOVERNANÇA DE TI	10
5.	SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL	13
6.	SEÇÃO DE APOIO AO PJE	17
7.	SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE	19
8.	SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	21


1. RESUMO DOS PROJETOS




Temas

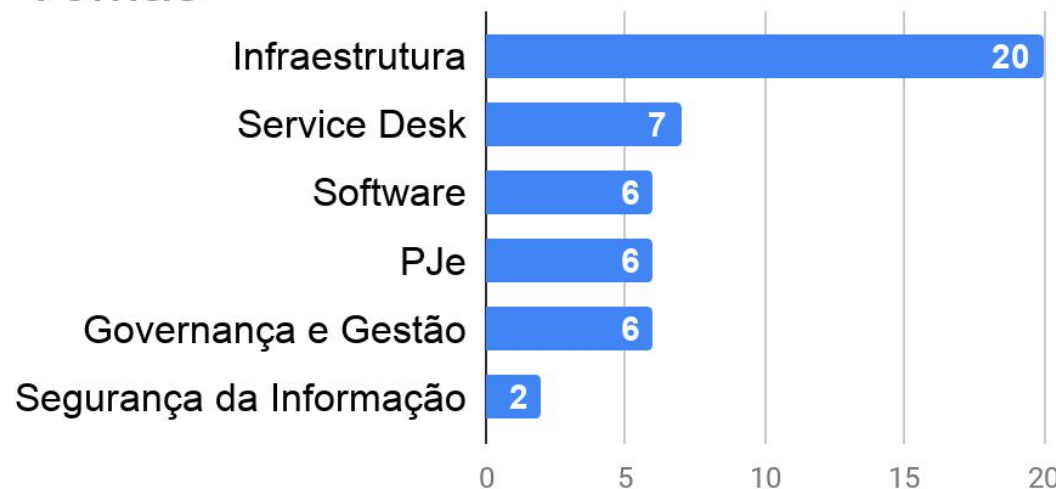

Projetos nas unidades

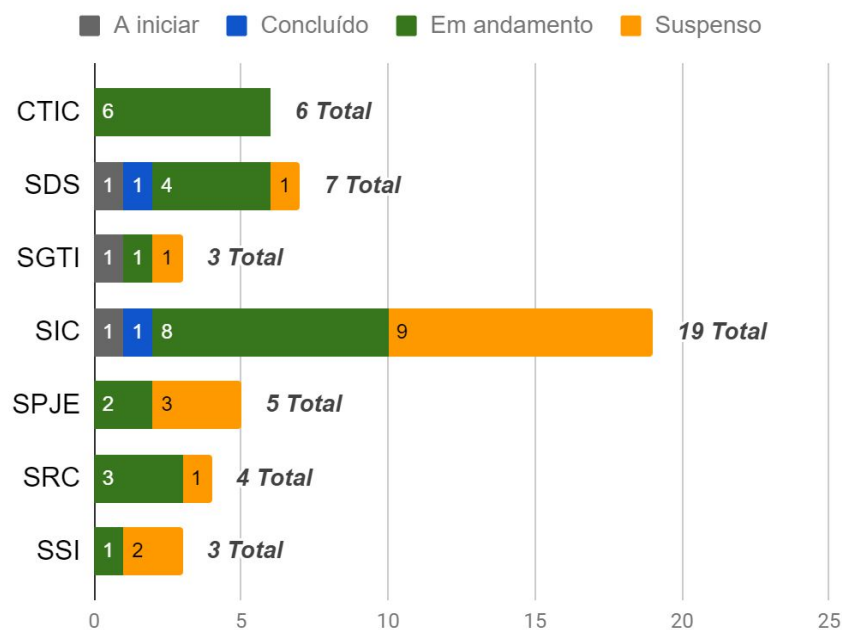

Situação

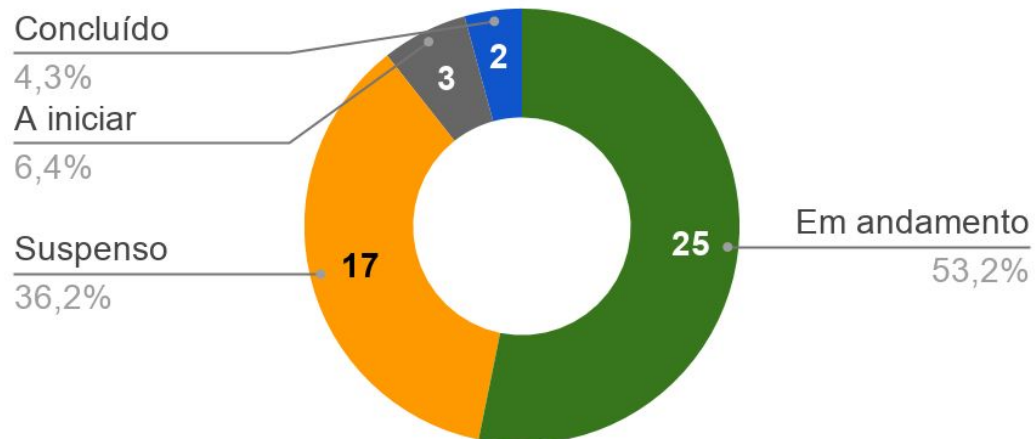

1.1. PROJETOS INCLUÍDOS NO PORTFÓLIO

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
546	Solução de videoconferência destinada à realização de audiências, sessões e reuniões telepresenciais	Stanley Araujo de Sousa	CTIC	09/09/2020	09/09/2020		Em andamento
547	Suporte à Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços 2020	Carlos Eduardo Ferreira Marins	SRC	09/09/2020	11/09/2020		Em andamento
548	Certificado Digital do tipo WildCard	Yuri Sousa Oliveira	SIC	18/09/2020	30/09/2020		Em andamento
549	Implantar prática de infraestrutura Ágil no TRT16	Pablo Teofilo Durans	SIC	03/08/2020	03/08/2020		Em andamento
550	Contratação/Renovação dos links da RedeJT - 2020	Rodrigo Silveira Alexandre	SIC	29/09/2020			A iniciar
551	Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	Jose Augusto	SSI	29/09/2020	01/09/2020		Em andamento

1.2. PROJETOS INICIADOS

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
546	Solução de videoconferência destinada à realização de audiências, sessões e reuniões telepresenciais	Stanley Araujo de Sousa	CTIC	09/09/2020	09/09/2020		Em andamento
547	Suporte à Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços 2020	Carlos Eduardo Ferreira Marins	SRC	09/09/2020	11/09/2020		Em andamento
548	Certificado Digital do tipo WildCard	Yuri Sousa Oliveira	SIC	18/09/2020	30/09/2020		Em andamento
549	Implantar prática de infraestrutura Ágil no TRT16	Pablo Teofilo Durans	SIC	03/08/2020	03/08/2020		Em andamento
551	Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	Jose Augusto	SSI	29/09/2020	01/09/2020		Em andamento


1.3. PROJETOS CONCLUÍDOS

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
455	Aquisição e implantação de servidores Blades	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	SIC	15/01/2019	31/01/2019	30/09/2020	Concluído
526	Contratação de Treinamento em DevOps	Andre Pereira Nunes	SDS	12/03/2020	18/03/2020	16/09/2020	Concluído

1.4. PROJETOS CANCELADOS

2. COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

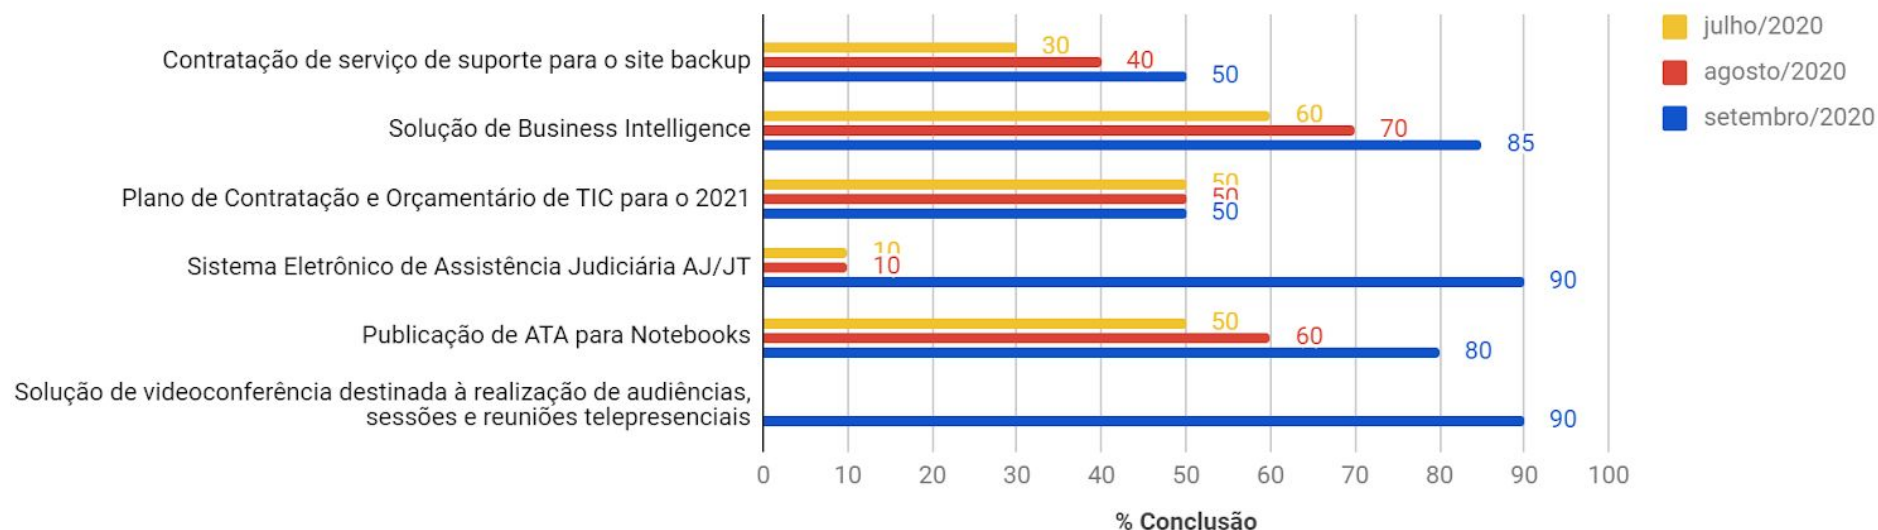


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	519	Contratação de serviço de suporte para o site backup	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	15/01/2020	16/12/2020	19/05/2020		50	Finalização do ETP (doc.018) Entregáveis: - 1: ETP(doc.018)
2	524	Solução de Business Intelligence	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	12/02/2020	30/11/2020	12/02/2020		85	Elaboração e revisão da Minuta do Contrato (doc.049). Entregáveis: - 1: ETP(doc.018, P.A.2605/2020) - 2: TR (doc.031, P.A. 2605/2020) - 3: Minuta do Contrato(doc.049)
3	525	Plano de Contratação e Orçamentário de TIC para o 2021	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	18/02/2020	30/11/2020	18/02/2020		50	Realizado a revisão das contratações. Riscos e Problemas: - Não cumprimento dos prazos de publicação. - Acúmulo do gerente de atividades da unidade de infraestrutura computacional a fim de desafogar aquela unidade. - Priorização da licitação da Sala Backup.

4	527	Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária AJ/JT	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	27/02/2020	30/10/2020	01/07/2020		90	Habilitação dos cadastros, elaboração de documentação e treinamento dos validadores. Entregáveis: - 1: Edital de convocação 01/2020 - https://www.trt16.jus.br/legislacao/expedientes-do-tribunal - 2: Inclusão das ofertas na central.trt16.jus.br - 3: Publicação de Guias em https://www.trt16.jus.br/servicos/judiciais/assistencia-judiciaria-da-justica-do-trabalho-ajjt - 4: Solicitação de atualização do Catálogo de Serviço
5	543	Publicação de ATA para Notebooks	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	17/06/2020	16/11/2020	07/07/2020		80	Abertura das propostas agendada para dia 08/10/2020. PREGÃO ELETRÔNICO TRT8 Nº 00023/2020. https://www.trt8.jus.br/transparencia/contas-publicas/licitacoes Entregas: - 1: Manifestação de Interesse em participar do Certame(P.A. 3250/2020, doc.010) (100%) - 2: Edital publicado(100%)
6	546	Solução de videoconferência destinada à realização de audiências, sessões e reuniões telepresenciais	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	09/09/2020	30/10/2020	09/09/2020		90	Elaboração de ETP e TR da Contratação. Entregas: - 1 ETP da Licitação (P.A. 4455/2020, doc.004) - 2: TR da Licitação (P.A. 4455/2020, doc.005) - 3: Declaração de inexistência de Parentesco (P.A. 4455/2020, doc.015) - 4: 4 Termo Aditivo do Contrato (P.A. 7224/2017, doc.222)

3. SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

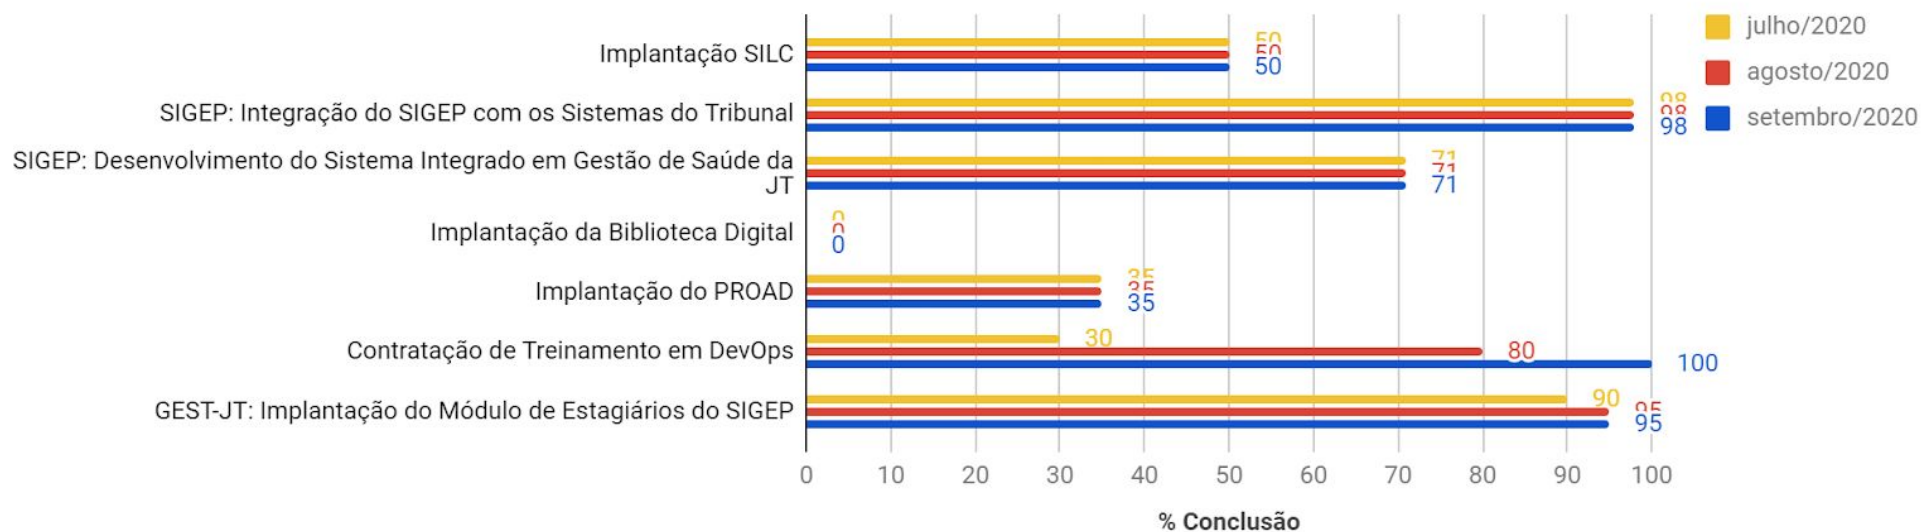


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	19	Implantação SILC	Andre Pereira Nunes	Suspense	06/02/2018	18/12/2020	23/04/2018		50	Sem progressos no período. Projeto ainda não retomado.
2	32	SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	Andre Pereira Nunes	Em andamento	24/05/2018	18/12/2020	04/06/2018		98	Adequação do sistema de estagiários legado em andamento.

3	187	SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	Diogo Duailibe da Silva	Em andamento	25/08/2017	19/12/2022	29/08/2017		71	Fechamento das versões 1.15.0.1 e 1.15.0.2; Desenvolvimento das funcionalidades que entrarão na versão 1.16.0.0; Refatoração de funcionalidades já existentes para se adequar à atualização do Angular 10. Entregáveis: - Entrega 1: Estruturação da arquitetura proposta (86%) - Entrega 2: Módulo de Agenda e Tabelas Básicas (93%) - Entrega 3: Módulo Ocupacional (87%) - Entrega 4: Módulo Pericial (92%) - Entrega 5: Módulo de Segurança do Trabalho (30%) - Entrega 6: Módulo Assistencial (90%) - Entrega 7: Módulo de segurança da NGS1 (60%) - Entrega 8: Módulo de Relatórios Gerenciais (34%)
4	279	Implantação da Biblioteca Digital	Andre Pereira Nunes	A iniciar	01/01/2018	18/12/2020			0	Projeto não iniciado.
5	499	Implantação do PROAD	Andre Pereira Nunes	Em andamento	28/02/2019	18/12/2020	28/08/2019		35	Realizado contato com o TRT da 12ª Região para obtenção de um modelo de minuta atualizada. Entregáveis: (90%) ENTREGA 1: Preparação da Infraestrutura (20%) ENTREGA 2: Acordo de Cooperação Técnica com o TRT12 (0%) ENTREGA 3: Configuração do Sistema (0%) ENTREGA 4: Adequação do SUAP e SISPAE (0%) ENTREGA 5: Visita Técnica e Treinamento (0%) ENTREGA 6: PROAD e PROAD-OUV em Produção
6	526	Contratação de Treinamento em DevOps	Andre Pereira Nunes	Concluído	12/03/2020	29/09/2020	18/03/2020	16/09/2020	100	Projeto concluído. O treinamento foi realizado entre os dias 24 de agosto e 10 de setembro de 2020. Sem pendências.

7	533	GEST-JT: Implantação do Módulo de Estagiários do SIGEP	Andre Pereira Nunes	Em andamento	06/05/2020	30/10/2020	07/05/2020		95	Realizada adequação da migração de dados do legado para o sigep. Entregáveis: (100%) ENTREGA 1: Preparação da Infra estrutura (100%) ENTREGA 3: Integração com outros sistemas do tribunal (100%) ENTREGA 2: Migração de Dados (80%) ENTREGA 4: Disponibilização em produção, com Manual de Operações Pendências: Aguardando SIC disponibilizar ambiente de PRODUÇÃO (S60142)
---	-----	--	---------------------	---------------------	------------	------------	------------	--	----	---

4. SETOR DE GOVERNANÇA DE TI

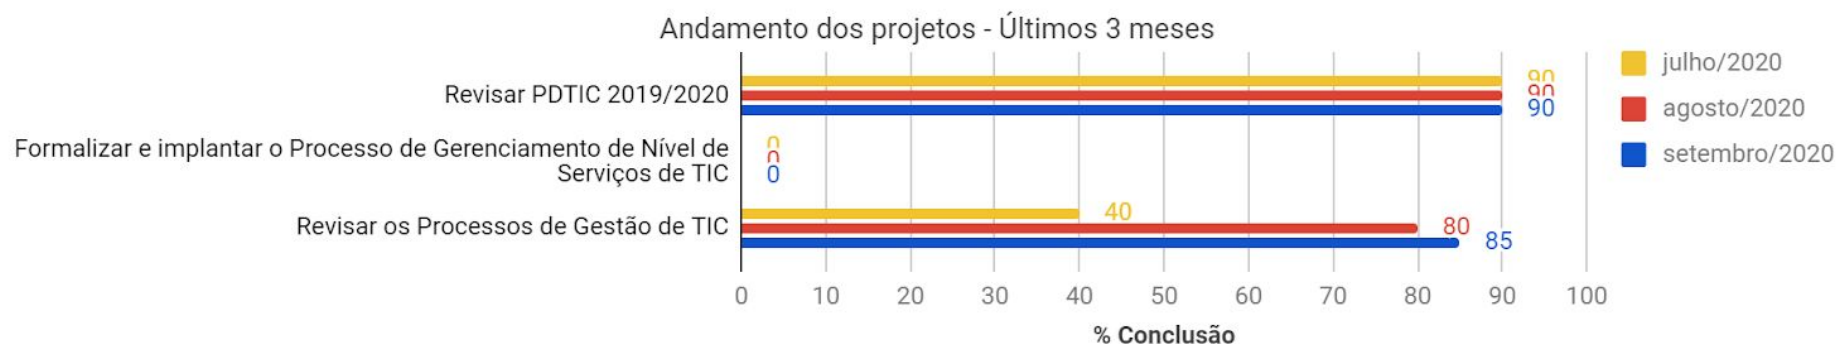


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	509	Revisar PDTIC 2019/2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	Suspensa	04/11/2019	30/10/2020	14/11/2019		90	Sem progresso no período. A minuta da revisão do PDTIC continua aguardando apreciação e publicação da matéria pela Presidência. Entregáveis: (100%) Avaliação do resultado das metas e ações previstas para 2019 (100%) Necessidades mapeadas e priorizadas para 2020 (100%) Minuta da nova versão do PDTIC elaborada (100%) Nova versão do PDTIC apreciada pelo CGovTIC (50%) Nova versão do PDTIC publicada pela Presidência. Mudanças: O prazo foi estendido em função da espera da apreciação e deliberação do Presidente acerca da minuta de revisão do PDTIC. Nova previsão: 30/10/2020.
2	528	Formalizar e implantar o Processo de Gerenciamento de Nível de Serviços de TIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	A iniciar	01/04/2020	18/12/2020			0	Sem progresso no período. Postergado o início de execução do projeto devido a priorização de outras atividades/projetos.

3	531	Revisar os Processos de Gestão de TIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	24/04/2020	31/10/2020	27/04/2020		85	<p>- Finalização da revisão dos processo de trabalho do Planejamento e Gerenciamento das Capacitações de TIC, Gerenciamento de Projetos de TIC, Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de Requisição, Gerenciamento da Central de Atendimento de TIC, Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC;</p> <p>- Elaboração do relatório de monitoramento do catálogo de serviços de TIC e atualização da versão para publicação do catálogo de Serviços de TIC;</p> <p>- Revisão dos normativos dos processos de Gestão de TIC;</p> <p>- Encaminhamento do normativos gerados na revisão para apreciação e publicação pela Presidência.</p> <p>Entregáveis:</p> <p>(100%) Planejamento e Gerenciamento das Capacitações de TIC atualizado</p> <p>(100%) Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC atualizado</p> <p>(100%) Gerenciamento de Demandas atualizado</p> <p>(100%) Planejamento Estratégico e Tático de TIC atualizado</p> <p>(100%) Gerenciamento de Portfólio de TIC atualizado</p> <p>(100%) Gerenciamento de Software atualizado</p> <p>(100%) Gerenciamento de Problemas atualizado</p> <p>(100%) Gerenciamento da Central de Serviços de TIC atualizado</p> <p>(20%) Gerenciamento de Contratações de Soluções de TIC atualizado</p> <p>(100%) Gerenciamento de Projetos de TIC atualizado</p> <p>(100%) Gerenciamento de Incidentes atualizado</p> <p>(100%) Gerenciamento de Requisição atualizado</p> <p>(100%) Gerenciamento de Mudança e Liberação atualizado</p> <p>(50%) Normativos dos Processos de Gestão de TIC publicados</p> <p>Mudanças:</p> <p>- O prazo foi estendido em função da espera da apreciação e deliberação do Presidente sobre os normativos propostos pela revisão. Nova data: 31/10/2020.</p>
---	-----	---------------------------------------	-------------------------------	---------------------	------------	------------	------------	--	----	--

5. SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

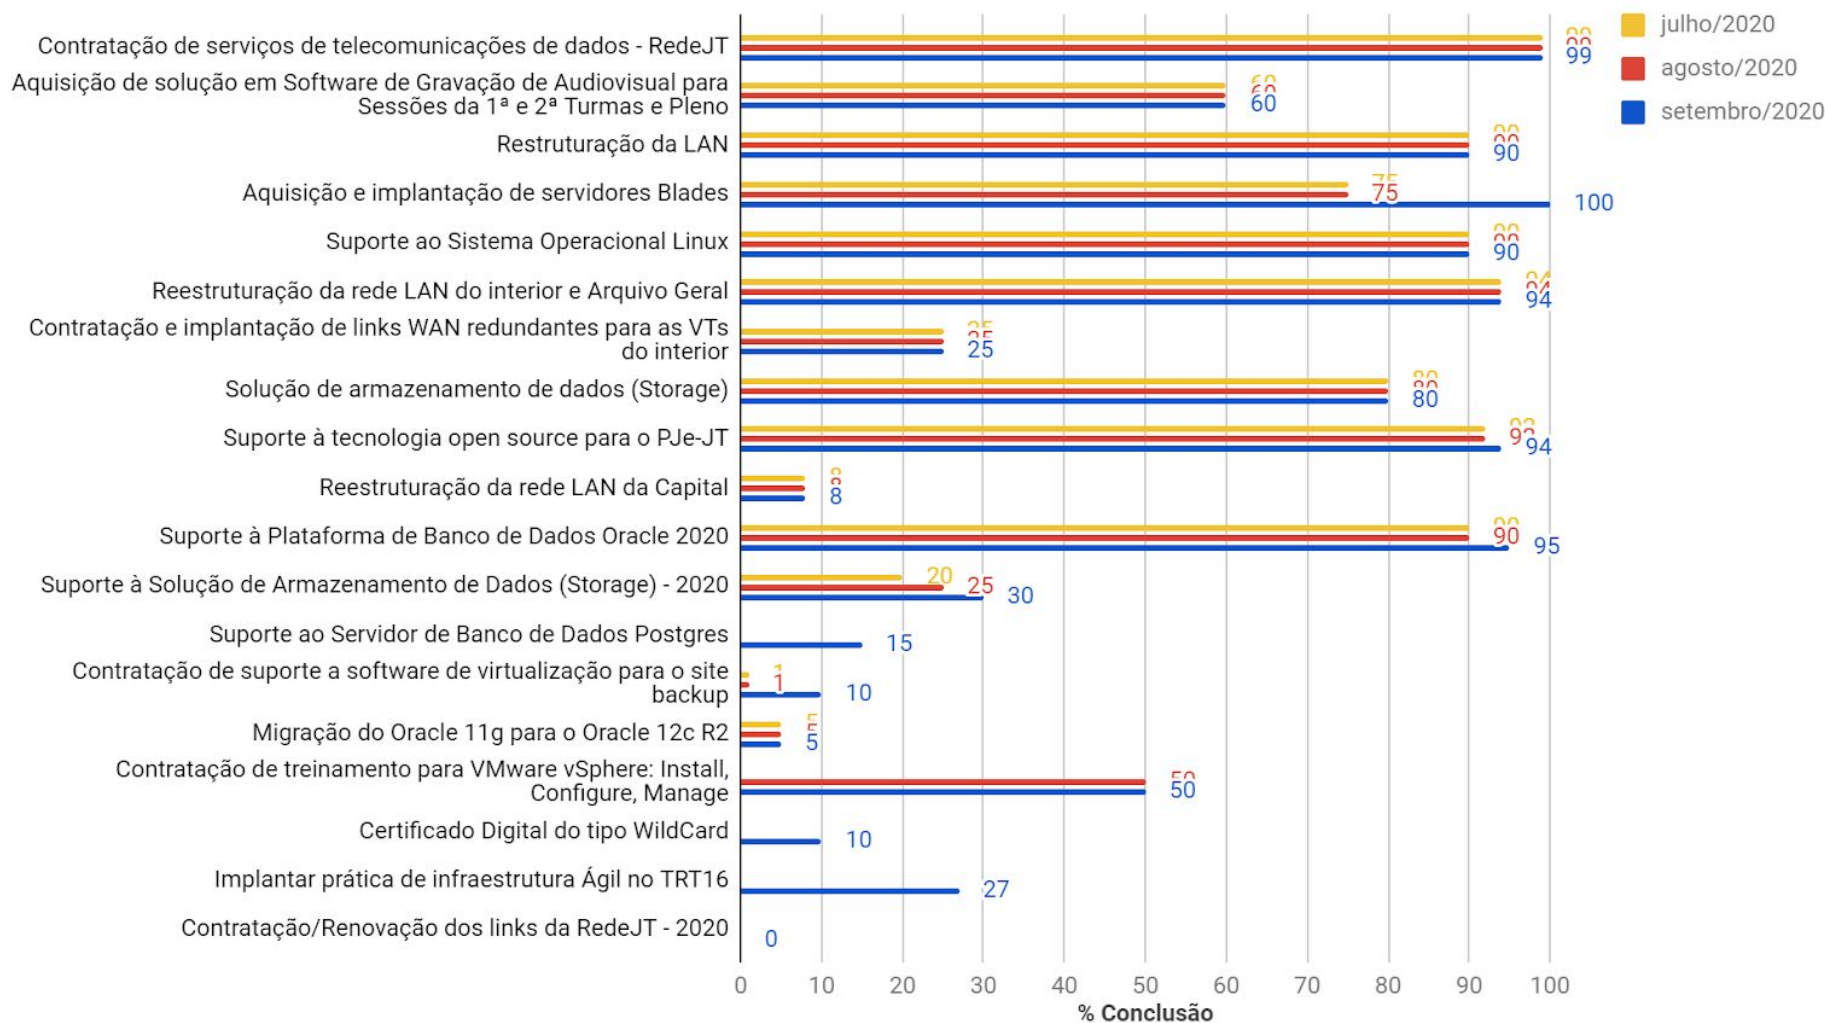

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	233	Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspenso	12/01/2018	30/10/2020	19/01/2018		99	Sem progresso no período.
2	358	Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno	Pablo Teofilo Durans	Suspenso	06/07/2018	18/12/2020	22/10/2018		60	Sem progresso no período. Entregáveis: - ETP e TR: (90%); - Publicação da Licitação (0%); - Contratação (0%); - Implantação (0%);
3	442	Reestruturação da LAN	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspenso	17/10/2018	30/10/2020	01/11/2018		90	Sem progresso no período.
4	455	Aquisição e implantação de servidores Blades	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Concluído	15/01/2019	30/09/2020	31/01/2019	30/09/2020	100	Projeto concluído.
5	461	Suporte ao Sistema Operacional Linux	Fernando Rola Ferreira Filho	Suspenso	29/01/2019	06/11/2020	30/01/2019		90	Sem progresso no período.
6	476	Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo Geral	Antoniell Magalhaes de Carvalho	Suspenso	01/04/2019	31/12/2020	16/04/2019		94	Sem progresso no período. Inviável dar prosseguimento devido à quarentena.
7	480	Contratação e implantação de links WAN redundantes para as VTs do interior	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspenso	15/04/2019	31/12/2020	08/03/2019		25	Sem progresso no período.
8	490	Solução de armazenamento de dados (Storage)	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Suspenso	18/06/2019	04/12/2020	18/06/2019		80	Sem progresso no período. Riscos e Problemas: - Devido a falta de recursos de armazenamento, a prestação de novos serviços poderá ficar prejudicada. É necessário a aquisição de novos storages e gavetas para o PJe e os sistemas administrativos, conforme sinalizado para a CTIC. - A ausência futura do recurso de armazenamento (storage) poderá ocasionar em indisponibilidade dos serviços de TI nos Tribunais. - Logística de entrega dos equipamentos e os possíveis atrasos.
9	517	Suporte à tecnologia open source para o PJe-JT	Rodrigo Silveira Alexandre	Em andamento	09/12/2019	30/10/2020	09/12/2019		94	Elaborada minuta do contrato, que recebeu parecer favorável do NAJ.


10	518	Reestruturação da rede LAN da Capital	Antoniél Magalhaes de Carvalho	Suspenso	13/01/2020	31/12/2020	27/01/2020		8	Sem progresso no período. Entregáveis (50%) Switches do Bloco C (0%) Switches do Bloco B (0%) Switches do Bloco A (0%) Switches do Forum Astolfo Serra (0%) Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e Storages Sede (0%) Alteração dos IPs de Servidores Sede (0%) Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e Storages do FAS
11	536	Suporte à Plataforma de Banco de Dados Oracle 2020	Leonel Pereira	Em andamento	13/05/2020	27/10/2020	13/05/2020		95	Elaborado e aprovada a minuta do contrato para a coleta das assinaturas das partes.
12	538	Suporte à Solução de Armazenamento de Dados (Storage) - 2020	João Diego Rocha Lima	Em andamento	04/06/2020	30/10/2020	24/06/2020		30	Todas as informações necessárias já foram incluídas no processo. A administração questionou o percentual de reajuste indicado pela empresa, e aguarda sua manifestação. Mudanças: - Alteração no previsão de fim do projeto para 30/10/2020.
13	540	Suporte ao Servidor de Banco de Dados Postgres	Romulo Moura	Suspenso	15/06/2020	31/12/2020	22/06/2020		15	Sem progresso no período.
14	541	Contratação de suporte a software de virtualização para o site backup	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	17/06/2020	18/12/2020	22/06/2020		10	Termo de Referência construído e encaminhado para o Integrante Administrativo incluir a parte jurídico-administrativa. Análise de Riscos construída e encaminhada para o Gestor do Contrato e Integrante Demandante. Entregáveis: - 1: (100%) ETP - aprovado pela Administração no dia 27/08/2020 - 2: (100%) TR - encaminhado para o Integrante Administrativo no dia 24/09/2020 - 3: (100%) Análise de Riscos - encaminhado para o Gestor do Contrato e Integrante Demandante no dia 24/09/2020 Riscos e problemas: - Falta de orçamento para concluir a contratação; - Manutenção do serviço solução de virtualização do site backup sem suporte técnico especializado frente à crescente demanda de serviços internos;
15	542	Migração do Oracle 11g para o Oracle 12c R2	Leonel Pereira	Em andamento	06/07/2020	30/11/2020	07/07/2020		5	O sistema operacional Oracle Linux foi instalado nas máquinas em substituição ao Suse 12.

16	545	Contratação de treinamento para VMware vSphere: Install, Configure, Manage	João Diego Rocha Lima	Em andamento	29/07/2020	30/11/2020	01/08/2020		50	Atualização do ETP.
17	548	Certificado Digital do tipo WildCard	Yuri Sousa Oliveira	Em andamento	18/09/2020	12/11/2020	30/09/2020		10	Formalizado o início do projeto. Entregáveis: - Certificado Adquirido.
18	549	Implantar prática de infraestrutura Ágil no TRT16	Pablo Teofilo Durans	Em andamento	03/08/2020	18/12/2020	03/08/2020		27	- A equipe foi capacitada em Práticas Devops; - Foi entregue no dia 11/09 um serviço de registry que possibilita o SDS a disponibilizar imagens de serviços que serão utilizadas na nova infraestrutura; - Foram construído clusters e já disponibilizados Kubernetes (K8S) para ambiente de Homologação (PJe e Administrativo); - Iniciou-se a implantação do serviços de passivos, que possui ação própria mas a experiência com essa implantação ditará o processo a ser seguido daqui em diante; - Implantação do PJe em Container em Homologação em fase avançada; - Monitoramento do Cluster a nível de recurso das Máquinas; - Reunião para alinhamento inicial para interação dev x ops; Entregáveis: Capacitação da Equipe (90%) Peso: 15 Repositório de Imagens de Serviços (100%) Peso: 5 Infraestrutura de Orquestração de Serviços (46%) Peso: 20 PJe Homologação (100%) Peso: 2 PJe Produção (10%) Peso: 3 Administrativo Homologação (100%) Peso: 2 Administrativo Produção (10%) Peso: 3 PJe em nova infraestrutura (18%) Peso: 20 Homologação (60%) Peso: 3 Produção (0%) Peso: 5 Satélites Homologação (0%) Peso: 1 Satélites Produção (0%) Peso: 1 Sistemas Administrativos em nova infraestrutura (4 %) Peso: 15 Homologação (10%) Peso: 4 Produção (0%) Peso: 6 Monitoramento (10%) Peso: 10 Automatização de Deploy em ambiente de Homologação (0%) Peso: 15 Insumos para revisão do Processo de Gerenciamento de Software (10%) Peso: 10

19	550	Contratação/Renovação dos links da RedeJT - 2020	Rodrigo Silveira Alexandre	A iniciar	29/09/2020	21/01/2021		0	Projeto não iniciado.
----	-----	--	----------------------------	-----------	------------	------------	--	---	-----------------------

6. SEÇÃO DE APOIO AO PJE

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

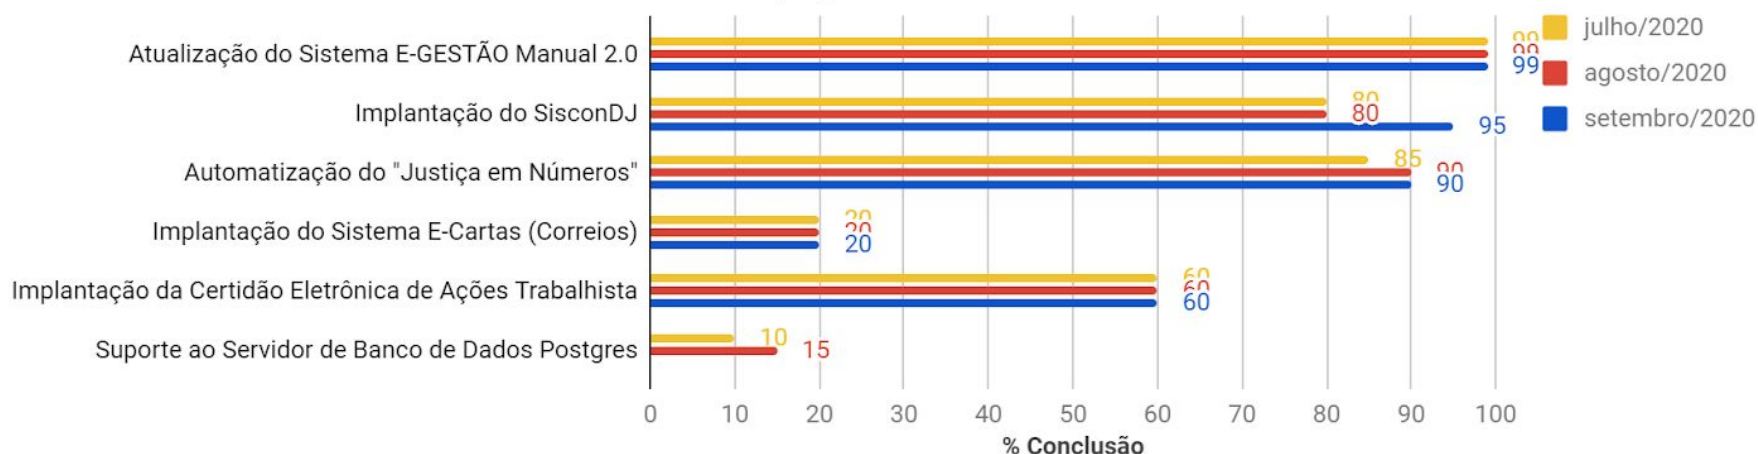


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	56	Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0	Djeison Rafael Neitzke	Suspenso	06/04/2018	31/10/2020	06/04/2018		99	Sem progresso no período. Aguarda-se a reunião do demandante (Comitê Gestor Regional do E-Gestão) para o aceite formal da entrega do projeto.
2	477	Implantação do SisconDJ	Gilberto Cunha Filho	Em andamento	05/12/2018	30/10/2020	01/04/2019		95	Homologação das funcionalidades do módulo; Acionamento da equipe do Banco do Brasil e aplicação das soluções propostas pela equipe. Entregáveis: - Entrega 1: Testes mapeamento das Vts - 100% - Entrega 2: Testes de autenticação - 100% - Entrega 3: Testes de geração de alvarás - 95% Riscos e Problemas: - o Apoio ao PJe conta apenas com um analista judiciário, que está de licença, para homologação do satélite;

										Mudança: prazo de finalização do projeto.
3	481	Automatização do "Justiça em Números"	Djeison Rafael Neitzke	Em andamento	23/04/2019	31/12/2020	19/06/2019		90	Realizado a retransmissão de todos os arquivos, no dia 04/09, após o CNJ informar que alguns arquivos enviados em agosto podem ter sido recebidos com erro, por problema técnico na infra do CNJ.
4	504	Implantação do Sistema E-Cartas (Correios)	Gutemberg Pereira Vidal Santos	Suspenso	10/09/2019	30/03/2021	01/11/2019		20	Sem progresso no período. O Setor de Infraestrutura pediu o prazo de 90 dias para implantar a estrutura de "containers", indispensável para prosseguimento do projeto.
5	506	Implantação da Certidão Eletrônica de Ações Trabalhista	Gutemberg Pereira Vidal Santos	Suspenso	27/09/2018	01/12/2020	14/10/2019		60	Sem progresso no período. Sugestão de cancelamento do projeto considerando que: - A versão 2.5 do PJe veio com a funcionalidade OBJETO deste sistema no que diz respeito aos processos eletrônicos; - O TRT 16 recebeu o selo de 100% PJe;

7. SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

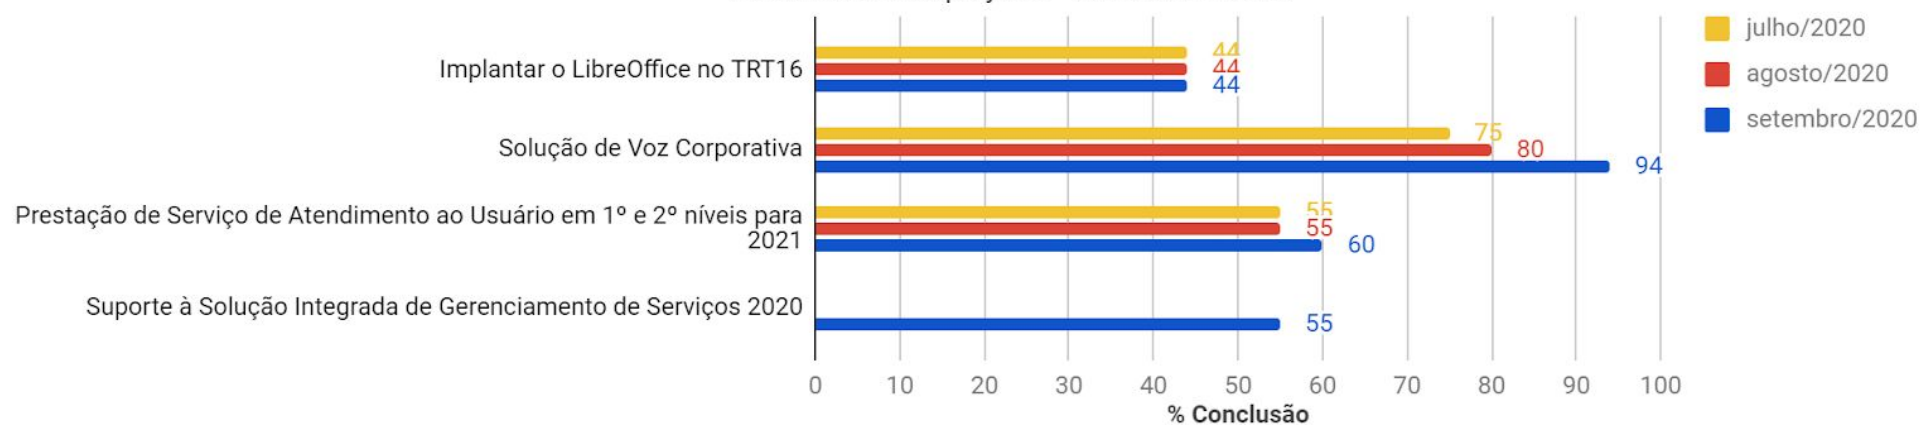


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	351	Implantar o LibreOffice no TRT16	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Suspenso	25/06/2018	18/12/2020	25/06/2018		44	Sem progresso no período. Entregáveis: - (40%) Instalação do LibreOffice - (0%) Desinstalação do Microsoft Office Riscos e Problemas: - Concorrência de outros projetos; - Falta de recursos humanos; - Dificuldades impostas pela pandemia.

2	381	Solução de Voz Corporativa	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	27/08/2018	30/10/2020	31/08/2018		94	<p>Coletadas informações solicitadas pela empresa; Realizado o acompanhamento do início da implantação física da solução; Realizados testes em telefones analógicos e IPs em conjunto com a infraestrutura, com os ajustes necessários na configuração de rede; Iniciada a instalação dos telefone IPs nas unidades administrativas e judiciais.</p> <p>Entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (100%) Contrato Assinado - (100%) Adequação da Infraestrutura Física - (100%) Recebimento dos equipamentos - (100%) Preparação da infraestrutura lógica - (0%) Fase presencial de implantação - (70%) Fase remota de implantação <p>Riscos e Problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Complexidade e dificuldades de instalação na ausência presencial de servidores. Limitações de hardware.
3	537	Prestação de Serviço de Atendimento ao Usuário em 1º e 2º níveis para 2021	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	18/05/2020	18/06/2021	18/05/2020		60	<p>Acompanhamento e esclarecimento de dúvidas em relação aos artefatos da contratação. Solicitado mudanças no texto do Termo de Referência.</p> <p>Entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (100%) Portaria da Equipe de Planejamento - (100%) Estudo Técnico Preliminar - (90%) Termo de Referência - (0%) Acompanhamento da Licitação - (0%) Contrato Assinado - (0%) Assyst Configurado - (0%) Treinamento Realizado - (0%) Serviço Implantado <p>Riscos e problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Necessidade de prorrogação emergencial do contrato vigente devido atrasos no trâmite do PA.
4	547	Suporte à Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços 2020	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	09/09/2020	26/10/2020	11/09/2020		55	<p>Desenvolvimento dos estudos técnicos preliminares.</p> <p>Entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ETP: (80%) - Aditivo ou contrato assinado: (0%) <p>Riscos e Problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concorrência com os projetos de Contratação da Central de Serviços e Implantação do Novo PABX. - Prazo restante muito curto.

8. SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

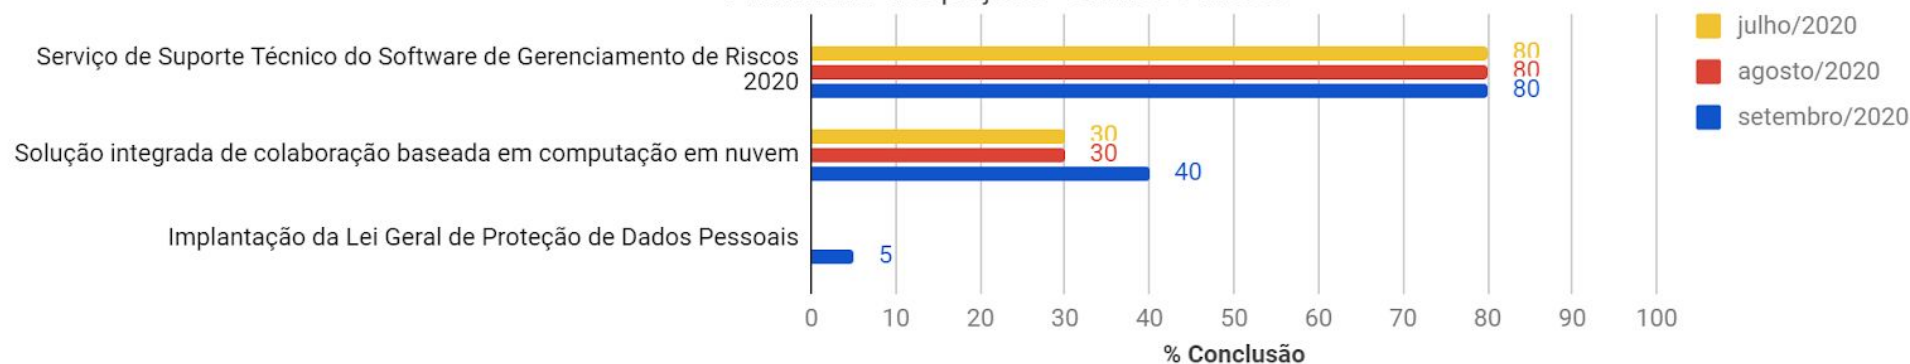

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	483	Serviço de Suporte Técnico do Software de Gerenciamento de Riscos 2020	Jose Augusto	Suspense	25/04/2019	18/12/2020	16/01/2020		80	Sem progresso no período. Entregáveis: - (100%) 1 Preparação - (100%) 2 Estudo Técnico Preliminar - (100%) 3 Termo de Referência - (0%) 4 Contratação
2	539	Solução integrada de colaboração baseada em computação em nuvem	Jose Augusto	Suspense	17/06/2020	31/01/2021	19/06/2020		40	Elaboração e conclusão do Estudo Técnico Preliminar. Entregáveis: - (100%) Equipe de planejamento - (100%) ETP - Estudo Técnico Preliminar - (0%) TR - Termo de Referência - (0%) Acompanhamento da licitação - (0%) Gerenciamento da implantação Mudança: alterado a previsão de fim do projeto.

3	551	Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	Jose Augusto	Em andamento	29/09/2020	18/12/2020	01/09/2020		5	<p>Formalizado o início do projeto; Elaborado o questionário para o mapeamento dos dados; Elaborada a minuta do ofício de convocação a capacitação por parte da presidência; Entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrega 1: Capacitação inicial (básica) de servidores e magistrados na lei geral de proteção de dados pessoais (5%) - Entrega 2: Mapeamento inicial de dados pessoais tratados na justiça do trabalho no Maranhão (5%) - Entrega 3: Criação de área no site destinado para Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (0%) - Entrega 4: Criação de uma política de privacidade de dados (0%).
---	-----	--	--------------	---------------------	------------	------------	------------	--	---	---
