



TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CTIC

JANEIRO/2020

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	REUNIÃO DOS COMITÊS DE TIC	3
3.	ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC	4
4.	PORTFÓLIO DE PROJETOS E AÇÕES DE TIC	5
4.1.	RESUMO DOS PROJETOS	6
4.1.1.	PROJETOS INCLUÍDOS NO PORTFÓLIO	7
4.1.2.	PROJETOS INICIADOS	7
4.1.3.	PROJETOS CONCLUÍDOS	7
4.2.	COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES	8
4.3.	SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	10
4.4.	SETOR DE GOVERNANÇA DE TI	13
4.5.	SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL	15
4.6.	SEÇÃO DE APOIO AO PJE	18
4.7.	SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE	20
4.8.	SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	23

1. INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo apresentar as atividades realizadas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação e suas unidades subordinadas no mês de **Janeiro de 2020**.

O relatório está estruturado pelos seguintes tópicos:

- Reunião dos comitês de TIC;
- Atendimento aos usuários de TIC;
- Portfólio de Projetos e Ações de TIC.



2. REUNIÃO DOS COMITÊS DE TIC

No período de referência foi realizado uma reunião nos comitês relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação.

O **Comitê de Governança de TIC** reuniu-se no dia **10/01/2020** ([link para ata da reunião](#)), tratando dos seguintes temas:

- Apresentação da Área de TIC aos novo membros do comitê;
- Plano de Contratação e Orçamentário de TIC de 2020;
- Portfólio de Projetos de TIC.

3. ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC

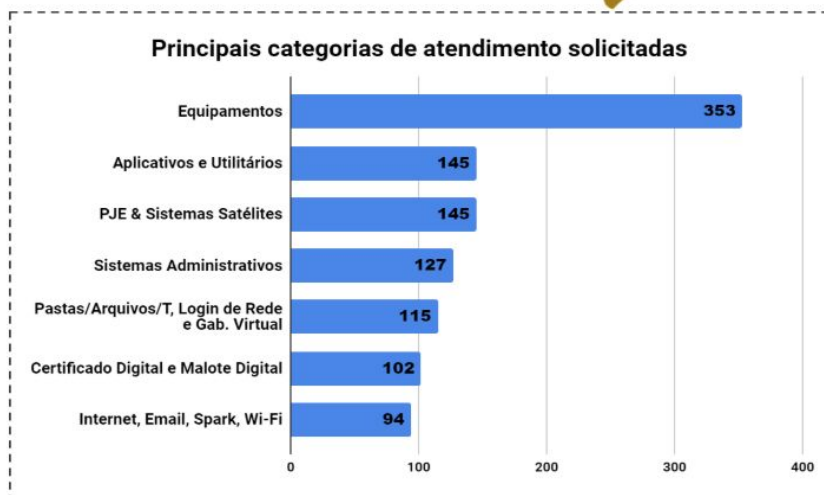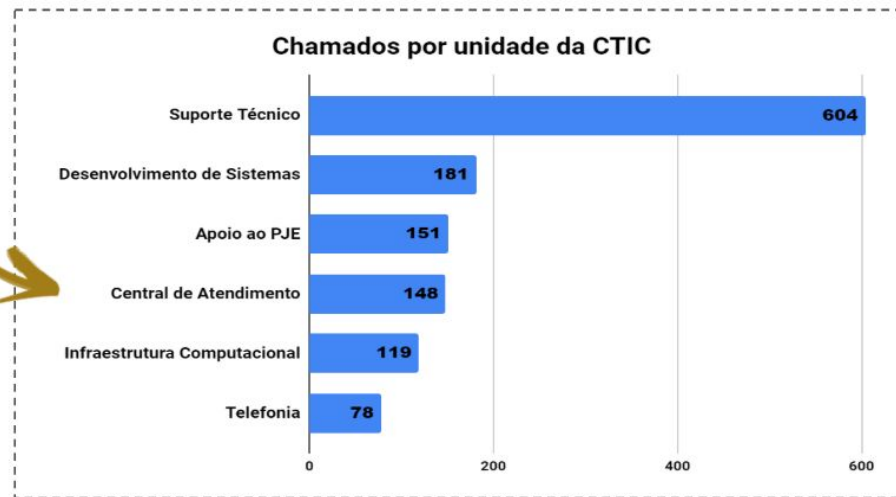

4. PORTFÓLIO DE PROJETOS E AÇÕES DE TIC


Nesta seção são apresentados as informações relativas aos projetos de TIC controlados pelo Escritório de Projetos de TIC.

Inicialmente, é exibida uma perspectiva geral dos projetos agrupados pela unidade na qual eles estão sendo gerenciados, e são listados os projetos iniciados, concluídos e cancelados no período.


Além do resumo do portfólio, para cada área de TIC são listados os projetos e suas respectivas evoluções no período de referência.

4.1. RESUMO DOS PROJETOS


Quantidade de projetos nas unidades

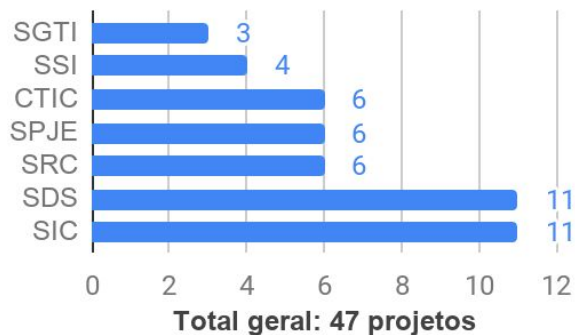


Complexidade dos projetos



Situação dos projetos

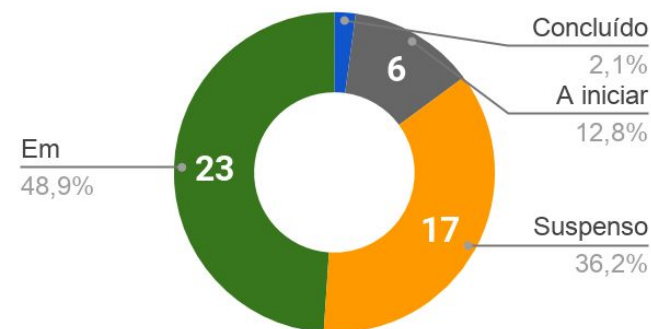

Situação dos projetos nas unidades

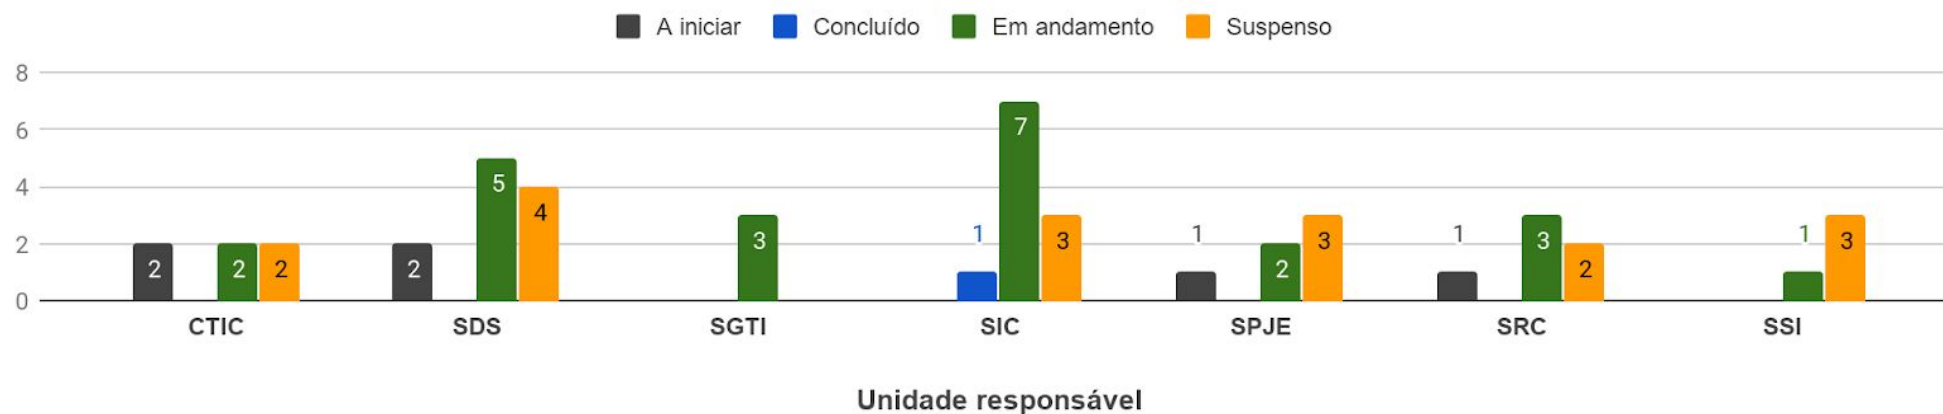

4.1.1. PROJETOS INCLUÍDOS NO PORTFÓLIO

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
519	Contratação de serviço de suporte para o site backup	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	CTIC	Projeto	15/01/2020			A iniciar
522	Aquisição de Solução de Gerador de Energia Auxiliar – Grupo Motor – Gerador	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	CTIC	Projeto	15/01/2020			A iniciar
518	Reestruturação da rede LAN da Capital	Antoniél Magalhaes de Carvalho	SIC	Projeto	13/01/2020	27/01/2020		Em andamento
520	Renovação do Contrato de Serviço de SMS Corporativo	Andre Pereira Nunes	SDS	Ação	15/01/2020	21/01/2020		Em andamento
521	Interligação dos datacenters do TRT16 por Fibra Óptica	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	CTIC	Projeto	15/01/2020	21/01/2020		Em andamento

4.1.2. PROJETOS INICIADOS


<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
483	Serviço de Suporte Técnico do Software de Gerenciamento de Riscos 2020	Jose Augusto	SGTI	Ação	25/04/2019	16/01/2020		Em andamento
518	Reestruturação da rede LAN da Capital	Antoniél Magalhaes de Carvalho	SIC	Projeto	13/01/2020	27/01/2020		Em andamento
520	Renovação do Contrato de Serviço de SMS Corporativo	Andre Pereira Nunes	SDS	Ação	15/01/2020	21/01/2020		Em andamento
521	Interligação dos datacenters do TRT16 por Fibra Óptica	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	CTIC	Projeto	15/01/2020	21/01/2020		Em andamento

4.1.3. PROJETOS CONCLUÍDOS

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
493	Implantação do Switch SAN	Pablo Teofilo Durans	SIC	Ação	02/07/2019	01/08/2019	14/01/2020	Concluído

4.2. COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

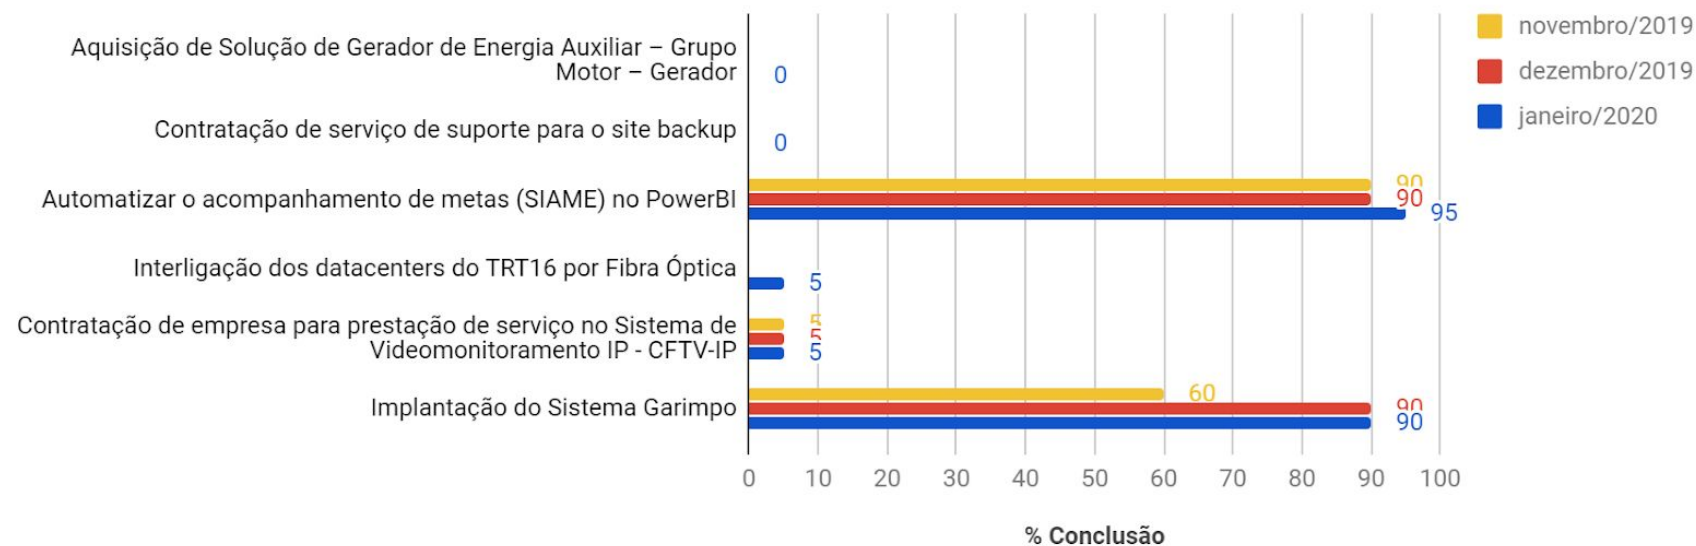


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	519	Contratação de serviço de suporte para o site backup	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	A iniciar	Projeto	15/01/2020	30/06/2020			0	Sem progresso no período. Aguardando a elaboração do TAP.
2	522	Aquisição de Solução de Gerador de Energia Auxiliar – Grupo Motor – Gerador	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	A iniciar	Projeto	15/01/2020	30/09/2020			0	Projeto a iniciar no segundo semestre de 2020.
3	378	Automatizar o acompanhamento de metas (SIAME) no PowerBI	David Tedson Mendonca Ferreira	Em andamento	Ação	23/08/2018	30/03/2020			95	Automatizadas as metas 01, 02, 03, 05 e 06 do CNJ. A meta 7 do CNJ, por não utilizar dados somente do sistema eGestão, não foi automatizada. Pendência do encerramento formal.

4	521	Interligação dos datacenters do TRT16 por Fibra Óptica	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Em andamento	Projeto	15/01/2020	31/08/2020	21/01/2020		5	- Elaborado o TAP do projeto. Solicitada à DG a indicação da equipe de planejamento da contratação e iniciado o ETP.
5	246	Contratação de empresa para prestação de serviço no Sistema de Videomonitoramento IP - CFTV-IP	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Suspenso	Projeto	16/02/2018	31/08/2019			5	Sem progresso no período. Priorizado outros projetos e ações.
6	489	Implantação do Sistema Garimpo	David Tedson Mendonca Ferreira	Suspenso	Projeto	05/06/2019	31/03/2020			90	Sem progresso no período. Pendência: implantação em produção pela equipe de infraestrutura computacional.

4.3. SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

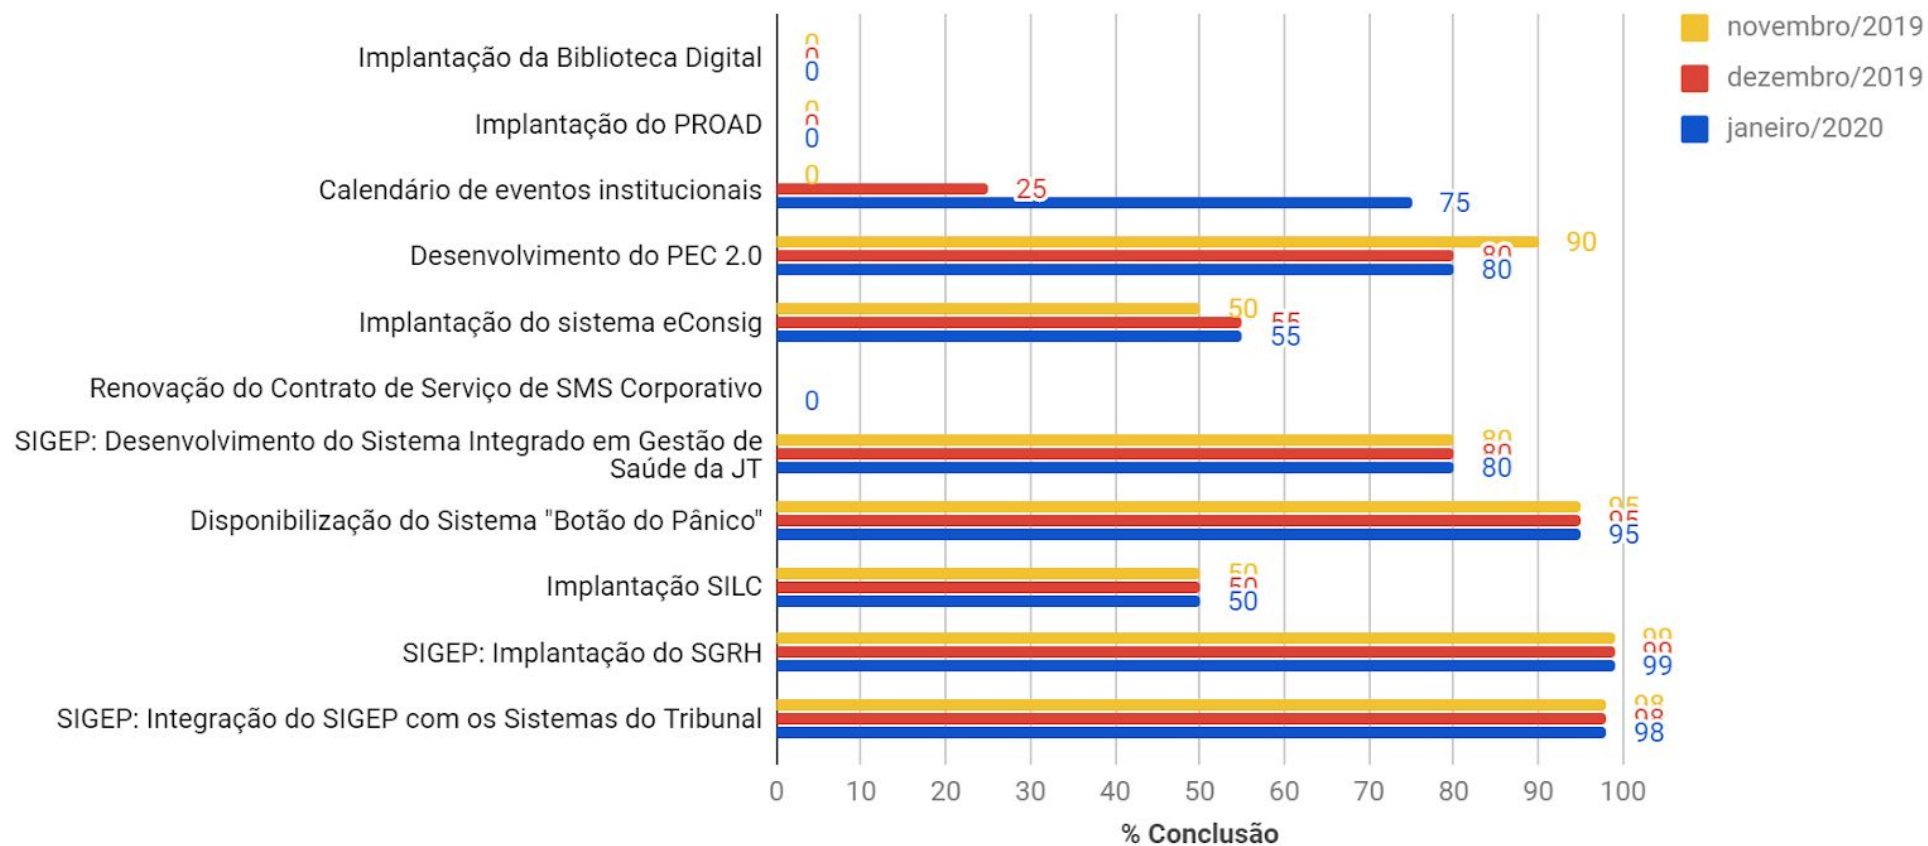


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	279	Implantação da Biblioteca Digital	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	01/01/2018	18/12/2020			0	Sem progressos no período. Projeto previsto para execução no segundo semestre de 2020.
2	499	Implantação do PROAD	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	28/02/2019	31/07/2020	28/08/2019		0	Sem progressos no período. Pendência: falta de recursos disponíveis para iniciar o projeto, equipe alocada nos demais projetos e demandas vigentes.
3	187	SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	Diogo Duailibe da Silva	Em andamento	Projeto	25/08/2017	01/12/2020	29/08/2017		80	- Sem progresso no desenvolvimento de escopo no período devido à indefinição dos programas de saúde; - Fechamento e liberação da versão 1.12.0.0; - Resolução de bugs;
4	223	Calendário de eventos institucionais	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Ação	06/12/2017	28/02/2020			75	Conclusão da entrega 3. Funcionalidade colocada em produção no site do do tribunal em Serviços -> Calendário Institucional. [ENTREGA 1] Tabela de tipos de eventos: 100% [ENTREGA 2] Módulo de cadastro de eventos na intranet: 100% [ENTREGA 3] Módulo de visualização do calendário: 100% [ENTREGA 4] Treinamento: 0%
5	224	Implantação do sistema eConsig	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	06/12/2017	31/03/2020	12/07/2019		55	Implementando layout de arquivos para troca entre instituições financeiras e o sistema SIGEP, para o módulo FolhaWeb.

6	354	Desenvolvimento do PEC 2.0	Ronny Paterson Cruz da Silva	Em andamento	Projeto	03/07/2018	30/06/2020	02/07/2018		80	Com todas as histórias devidamente integradas, o progresso no período consistiu na finalização da estabilização do PEC, com a correção de defeitos ainda existentes, a serem integrados na versão 2.5.2. Entregável 01 - Cadastro de Atos Agrupados e Exibição de Participantes do Processo 100% Entregável 02 - Cadastro de Destinatários, Outros destinatários e Signatários de Expedientes e Comunicações 100% Entregável 03 - PEC Fora do Fluxo e Impressão de Expedientes e Comunicações Físicos 100% Entregável 04 - Cadastro de Endereços em Expedientes e Comunicações 100% Entregável 05 - Integração com o GIM 100% Entregável 06 - Finalização de Expedientes e Comunicações 100% Entregável 08 - Integração com o GIGS 0% Entregável 09 - Integração com o eCarta 0% Entregável 10 - Integração com as Cartas Precatórias 0%
7	520	Renovação do Contrato de Serviço de SMS Corporativo	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Ação	15/01/2020	06/03/2020	21/01/2020		0	Elaboração do TAP e início do projeto.
8	19	Implantação SILC	Andre Pereira Nunes	Suspensão	Projeto	06/02/2018	18/12/2020	23/04/2018		50	Sem progressos no período. Projeto previsto para execução no segundo semestre de 2020.
9	32	SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	Andre Pereira Nunes	Suspensão	Projeto	24/05/2018	31/03/2020	04/06/2018		98	Data de virada dos satélites alterada para dia 02/março/2020, a pedido da CGP e do NFP. Problema: postergação indefinida da data de virada.
10	277	SIGEP: Implantação do SGRH	Andre Pereira Nunes	Suspensão	Projeto	28/04/2015	31/03/2020	28/04/2015		99	Sem progressos no período. Pendência: aguardando o aceite da área demandante (Encaminhado via PA 2372/2015).
11	446	Disponibilização do Sistema "Botão do Pânico"	Darlon José Coqueiro	Suspensão	Projeto	13/11/2018	31/12/2019	13/11/2018		95	Sem progresso no período. Pendência: Setor de Segurança resolver sobre a disponibilidade de Chefes e Diretores de Vara utilizarem o sistema.

4.4. SETOR DE GOVERNANÇA DE TI

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

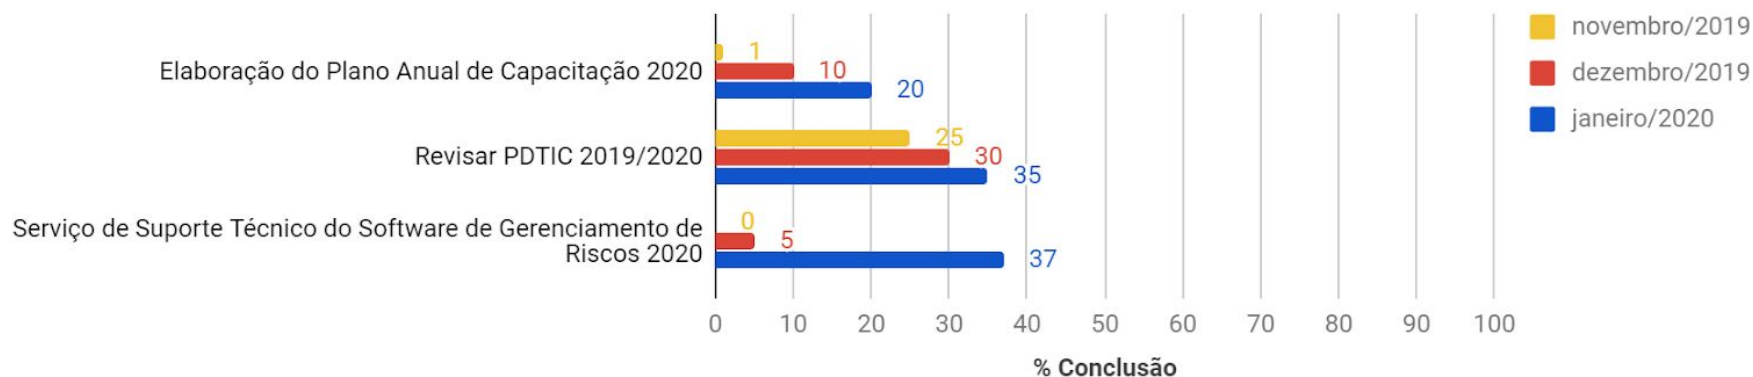


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	483	Serviço de Suporte Técnico do Software de Gerenciamento de Riscos 2020	Jose Augusto	Em andamento	Ação	25/04/2019	13/03/2020	16/01/2020		37	Evolução nas entregas: 1 Preparação Fechada 100% 2 Estudo Técnico Preliminar em andamento 50% 3 Termo de Referência Nova 0% 4 Contratação Nova 0%
2	509	Revisar PDTIC 2019/2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Ação	04/11/2019	13/03/2020	14/11/2019		35	Evolução nos entregáveis: - Avaliação do resultado das metas e ações previstas para 2019 - Em andamento 70% - Necessidades mapeadas e priorizadas para 2020 - Em andamento 70% - Minuta da nova versão do PDTIC elaborada - Nova 0% - Nova versão do PDTIC apreciada pelo CGovTIC - Nova 0% - Nova versão do PDTIC publicada pela Presidência - Nova 0%

3	510	Elaboração do Plano Anual de Capacitação 2020	Jose Augusto	Em andamento	Ação	23/10/2019	09/03/2020	25/11/2019		20	<p>Evolução na elaboração da lista dos cursos. SGTI, SDS, SPJE, SSI, SRC com listas de cursos completos.</p> <p>1 Lista de documentos de referência Fechada 100%</p> <p>2 Lista de cursos aprovados Em andamento 75%</p> <p>3 Minuta da portaria do plano Nova 0%</p> <p>4 Minuta do PAC Nova 0%</p>
---	-----	---	--------------	---------------------	------	------------	------------	------------	--	----	--

4.5. SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

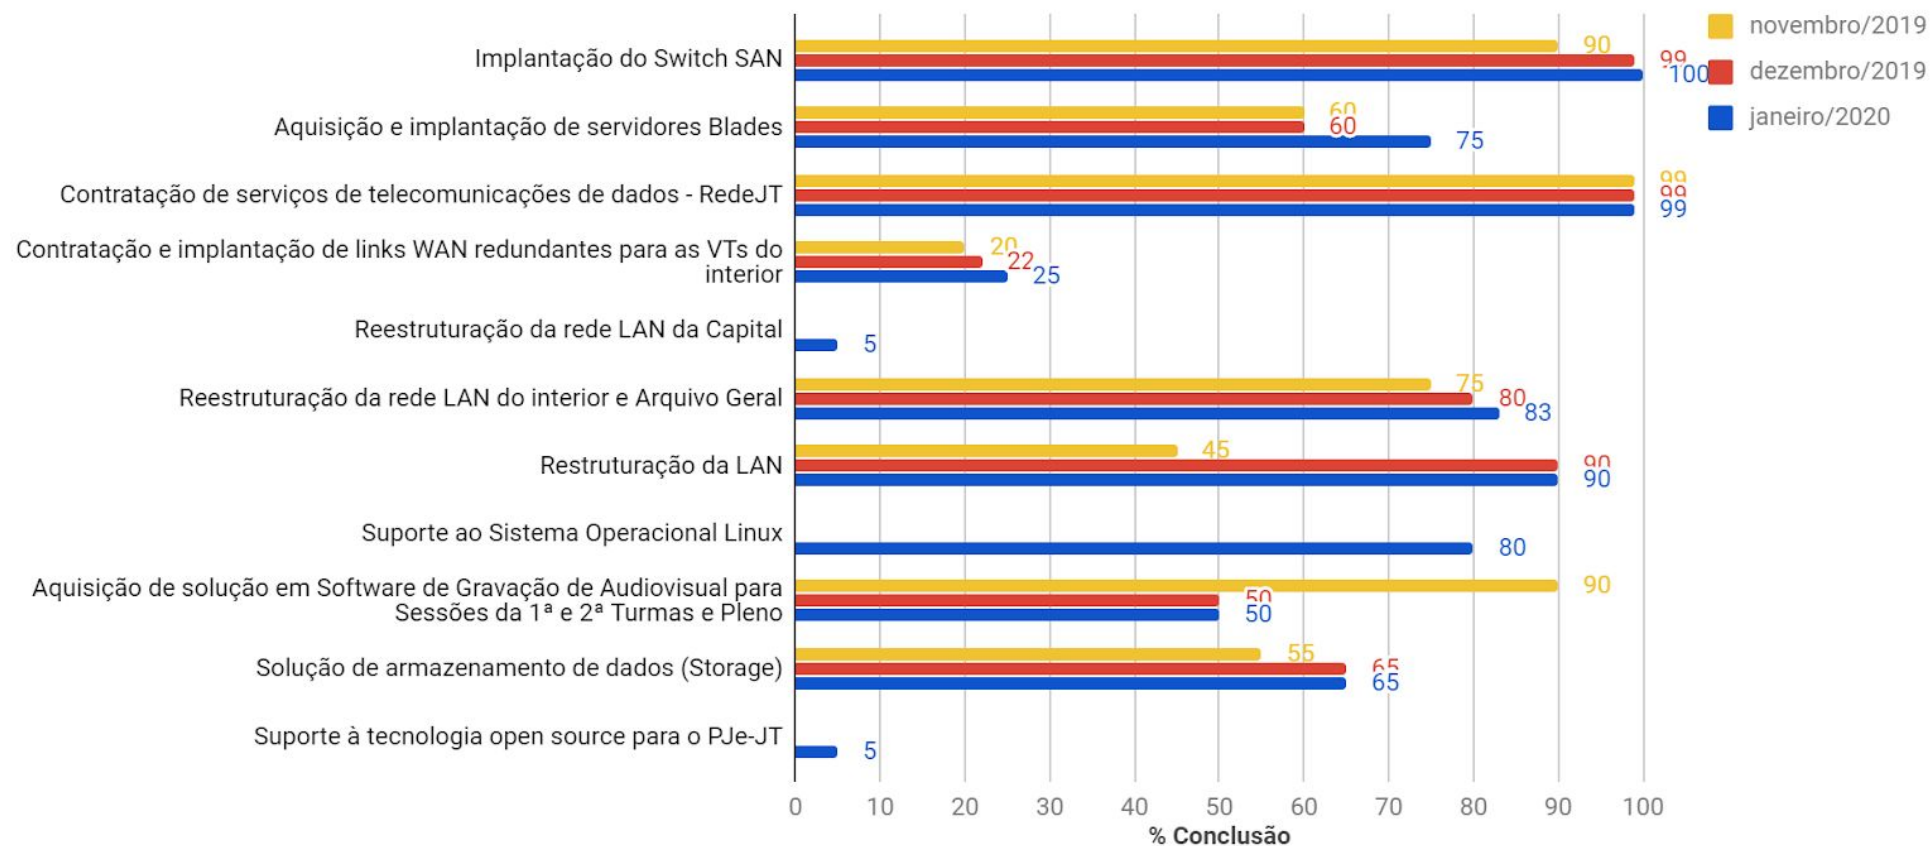


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	493	Implantação do Switch SAN	Pablo Teofilo Durans	Concluído	Ação	02/07/2019	17/01/2020	01/08/2019	14/01/2020	100	O projeto foi finalizado em 2019, só ficando pendente o encerramento formal, realizado no mês de janeiro de 2020. As seguintes entregas foram realizadas: - Adequação física dos datacenters para recebimento do equipamentos; - Recebimento do equipamentos; - Implantação dos 4 switches SAN (2 para cada site); - Treinamento na solução;
2	233	Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT	Rodrigo Silveira Alexandre	Em andamento	Projeto	12/01/2018	28/02/2020	19/01/2018		99	Aguardando encerramento formal do projeto.
3	442	Restruturação da LAN	Rodrigo Silveira Alexandre	Em andamento	Projeto	17/10/2018	30/04/2020			90	A rede WIFI foi corrigida e disponibilizada em São João dos Patos, Imperatriz, Balsas e Açailândia. O funcionamento em outras VTs provavelmente dependerá de intervenção no local.
4	455	Aquisição e implantação de servidores Blades	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	Projeto	15/01/2019	19/06/2020	31/01/2019		75	- Realizada as atividades de configuração física, lógica, verificação do status das máquinas e correções de defeitos/falhas no hardware; - Realizada configuração preliminar dos chassis para a chegada das peças/kit complementar durante os dias 20/01/2020 ao dia 23/01/2020; - Realizado o recebimento do kit complementar, no dia 27/01/2020; - A Contratada disponibilizou um preposto técnico, André Gedra, durante as duas semanas, do dia 20/01/2020 até o dia 31/01/2020. O Fiscal do contrato desenvolveu atividades com o preposto técnico da HPE Brazil durante essas duas semanas.
5	461	Suporte ao Sistema Operacional Linux	Fernando Rola Ferreira Filho	Em andamento	Projeto	29/01/2019	28/02/2020	30/01/2019		80	Pregão eletrônico 030/19, TRT 5, em andamento.

6	476	Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo Geral	Antoniél Magalhaes de Carvalho	Em andamento	Projeto	01/04/2019	30/06/2020	16/04/2019		83	Corrigido o WiFi (Rede Institucional) nas VTs de Açailândia, Balsas e São João dos Patos. A de Imperatriz também está funcionando, mas com apenas 2 dos 4 APs previstos para o local.
7	480	Contratação e implantação de links WAN redundantes para as VTs do interior	Rodrigo Silveira Alexandre	Em andamento	Projeto	15/04/2019	31/12/2020	08/03/2019		25	Elaborados o edital e a minuta do contrato.
8	518	Reestruturação da rede LAN da Capital	Antoniél Magalhaes de Carvalho	Em andamento	Projeto	13/01/2020	02/11/2020	27/01/2020		5	Criado e aprovado o TAP, bem como concluído o PGP e iniciada a execução do projeto, com a troca física dos switches relativos ao switch de distribuição do anexo C, na antessala da sala cofre, no prédio sede.
9	358	Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno	Pablo Teofilo Durans	Suspenso	Projeto	06/07/2018	29/10/2020	22/10/2018		50	Sem progresso no período. Risco: dada a mudança de gestão do órgão, poderá haver mudança no escopo do projeto.
10	490	Solução de armazenamento de dados (Storage)	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Suspenso	Projeto	18/06/2019	13/05/2020	18/06/2019		65	Sem progresso no período. Problemas: - A atualização da aplicação PJe influenciará no cronograma de migração dos dados para o novo storage; - Devido à falta de recursos de armazenamento, a prestação de novos serviços poderá ficar prejudicada; - A ausência futura do recurso de armazenamento (storage) poderá ocasionar em indisponibilidade dos serviços de TI nos Tribunais.
11	517	Suporte à tecnologia open source para o PJe-JT	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspenso	Projeto	09/12/2019	30/04/2020	09/12/2019		5	Aguardando processo licitatório do TRT12.

4.6. SEÇÃO DE APOIO AO PJE

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

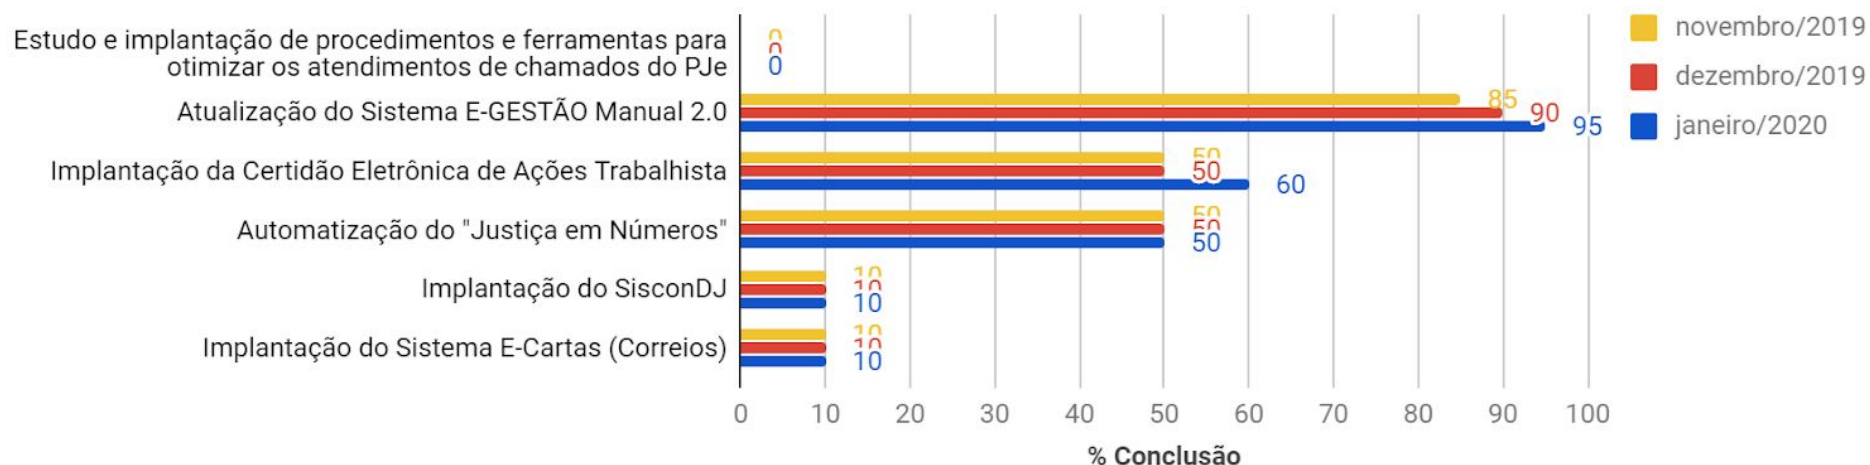


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	492	Estudo e implantação de procedimentos e ferramentas para otimizar os atendimentos de chamados do PJe	Gilberto Cunha Filho	A iniciar	Projeto	18/06/2019	30/04/2020			0	Sem progresso no período. Projeto não iniciado.
2	56	Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0	Djeison Rafael Neitzke	Em andamento	Projeto	06/04/2018	01/03/2020			95	<ul style="list-style-type: none"> - Implantação em produção das versões 2.5.2 e 2.5.3 do Extrator PJe; - Atualização e reenvio de 5 remessas mensais (janeiro a maio) referente ao PJe 2º grau com a versão 2.5.3, quando foi interrompido devido a uma nova versão do extrator a ser liberada. - Aguarda-se a liberação pelo TST da versão 2.5.4 do Extrator, e sua implantação no Regional para então reprocessar novamente todas as remessas de 2019 e 2020.

3	506	Implantação da Certidão Eletrônica de Ações Trabalhista	Gutemberg Pereira Vidal Santos	Em andamento	Ação	27/09/2018	20/03/2020	14/10/2019		60	Criada a máquina virtual para o ambiente de homologação do sistema. Há risco de versão do PJe absorver o objeto deste projeto deste Projeto.
4	477	Implantação do SisconDJ	Gilberto Cunha Filho	Suspensão	Ação	05/12/2018	31/03/2020			10	Sem progresso no período. Sem recurso humano de Infraestrutura para execução das tarefas de criação do ambiente de homologação/produção.
5	481	Automatização do "Justiça em Números"	Djeison Rafael Neitzke	Suspensão	Ação	23/04/2019	01/03/2020	19/06/2019		50	Sem progresso no período.
6	504	Implantação do Sistema E-Cartas (Correios)	Gutemberg Pereira Vidal Santos	Suspensão	Ação	10/09/2019	30/04/2020			10	Sem progresso no período. Risco: A implantação pode ser afetada pela versão do PJe, de forma que só poderá ser iniciada após a próxima atualização do PJe.

4.7. SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

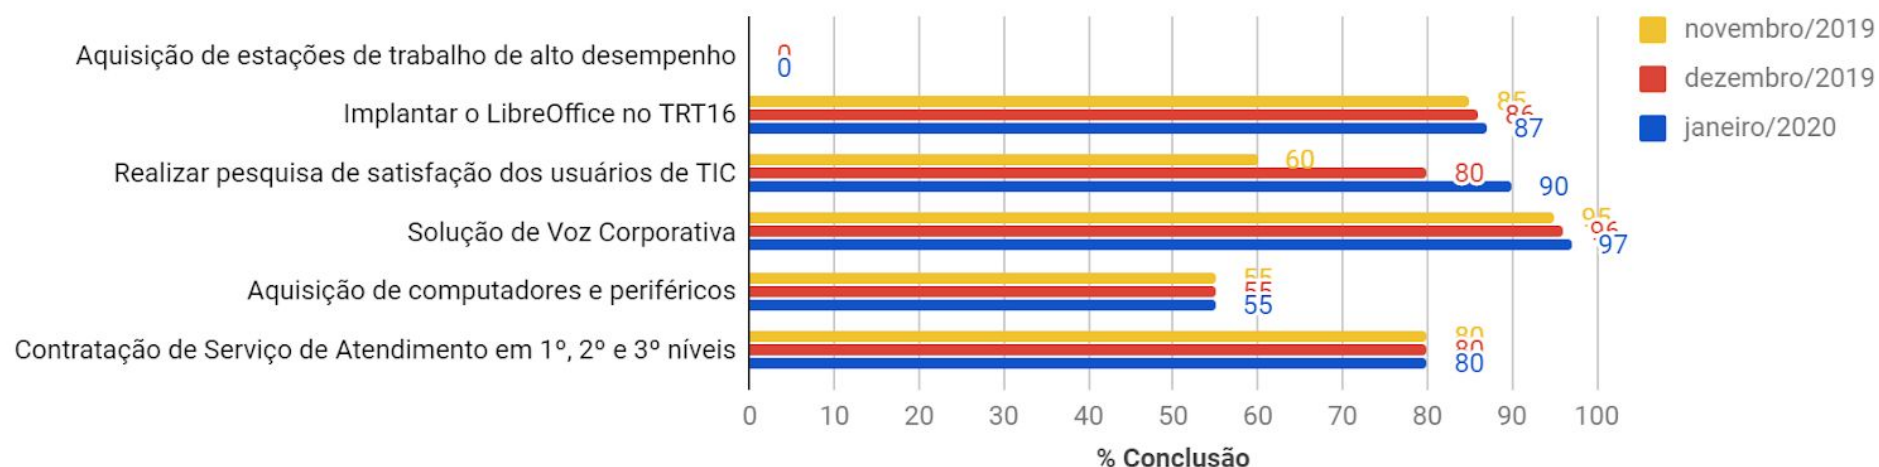


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	516	Aquisição de estações de trabalho de alto desempenho	Carlos Eduardo Ferreira Marins	A iniciar	Projeto	11/12/2019	30/04/2020			0	Sem progresso no período. Risco: indisponibilidade de orçamento.

2	351	Implantar o LibreOffice no TRT16	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	25/06/2018	30/04/2020			87	<p>Tabela foi atualizada devido a remoção de algumas máquinas que estavam fora do domínio, por essa razão, o "porcentual instalado" progrediu em comparação com mês anterior.</p> <p>Localidades Porcentual Instalado</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 VT de Imperatriz 100,00% - 2 VT de Imperatriz 94,74% - Distribuicao do FMAMR 100,00% - VT de Acailandia 93,33% - VT de Bacabal 17,65% - VT de Balsas 100,00% - VT de Barra do Corda 93,75% - VT de Barreirinhas 85,71% - VT de Caxias 100,00% - VT de Chapadinha 73,33% - VT de Estreito 100,00% - VT de Pedreiras 33,33% - VT de Pinheiro 94,12% - VT de Presidente Dutra 80,00% - VT de Santa Ines 93,33% - VT de Sao Joao dos Patos 66,67% - VT de Timon 100,00% <p>GPO continua não realizando as instalações do LibreOffice.</p>
3	381	Solução de Voz Corporativa	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	27/08/2018	31/03/2020			97	<p>Realizada uma reunião preliminar entre dois representantes da empresa e representante dos setores de Infraestrutura Computacional, Relacionamento com o Cliente, Coordenação.</p> <p>Risco: o prazo contratual pra entrega da solução se encerra em 20/04/2020;</p>
4	508	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Ação	17/10/2019	29/02/2020	25/10/2019		90	<p>Realizada a produção do relatório com as respostas coletadas na Pesquisa de Satisfação Interna e Externa;</p>
5	391	Contratação de Serviço de Atendimento em 1º, 2º e 3º níveis	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Suspensão	Projeto	19/09/2018	30/04/2020			80	<p>Sem progresso no período. Pendência: ETP e TR estão pendentes de revisão pelo integrante administrativo. Risco: Vencimento da validade de 180 dias da pesquisa de preços, o que exigirá retrabalho;</p>

6	500	Aquisição de computadores e periféricos	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Suspensão	Projeto	05/08/2019	31/03/2020	05/08/2019		55	Sem progresso no período. Pendência: aprovação orçamentária para aquisição dos equipamentos.
---	-----	---	--------------------------------	------------------	---------	------------	------------	------------	--	----	--

4.8. SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

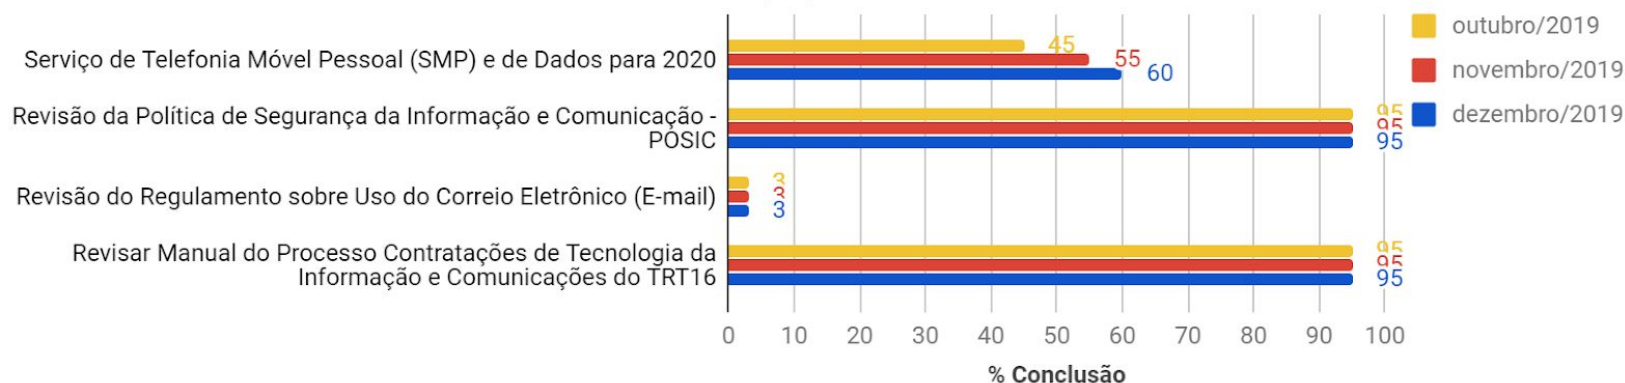

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	457	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2020	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	22/01/2019	31/03/2020	15/03/2019		70	Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência finalizados. O P.A. está no Assessoramento Jurídico para análise.
2	147	Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	09/05/2017	29/05/2020			95	Sem progresso no período. Pedido de vista regimental pela Desembargadora Ilka Esdra Silva Araújo.
3	168	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	28/06/2017	30/06/2020			95	Sem progresso no período. Pedido de vista regimental pelos Desembargadores James Magno Araújo Farias e Ilka Esdra Silva Araújo.
4	475	Revisão do Regulamento sobre Uso do Correio Eletrônico (E-mail)	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	05/04/2019	31/07/2020			3	Sem progresso no período. Férias do servidor integrante e finalização do projeto da telefonia móvel.
