



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 16ª REGIÃO

Relatório de de Atividades da CTIC

Abril/2019

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	REUNIÃO DOS COMITÊS DE TIC	3
3.	ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC	4
4.	PORTFÓLIO DE PROJETOS E AÇÕES DE TIC	5
4.1.	RESUMO DOS PROJETOS	5
4.1.1.	PROJETOS INICIADOS NO PERÍODO	6
4.1.2.	PROJETOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO	6
4.1.3.	PROJETOS CANCELADOS NO PERÍODO	7
4.2.	COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES	8
4.3.	SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	9
4.4.	SETOR DE GOVERNANÇA DE TI	12
4.5.	SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL	14
4.6.	SEÇÃO DE APOIO AO PJE	16
4.7.	SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE	19
4.8.	SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	20

1. Introdução

Este documento tem por objetivo apresentar as atividades realizadas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação e suas unidades subordinadas no mês de **Abril de 2019**.

O relatório está estruturado pelos seguintes tópicos:

- Reunião dos comitês de TIC;
- Atendimento aos usuários de TIC;
- Portfólio de Projetos e Ações de TIC.

2. Reunião dos Comitês de TIC

No período de referência foram realizadas duas reuniões nos comitês relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação.


○ **Comitê de Governança de TIC** reuniu-se no dia **24/04/2019** ([link para ata da reunião](#)) e tratou do seguinte tema:

- Apreciação do Plano Diretor de TIC 2019-2020.

○ **Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação** reuniu-se no dia **05/04/2019** ([link para ata da reunião](#)) e tratou dos seguintes temas:

- Análise da minuta da revisão do Processo de Gestão de Risco em Segurança da Informação;
- Apresentação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

3. Atendimento aos Usuários de TIC

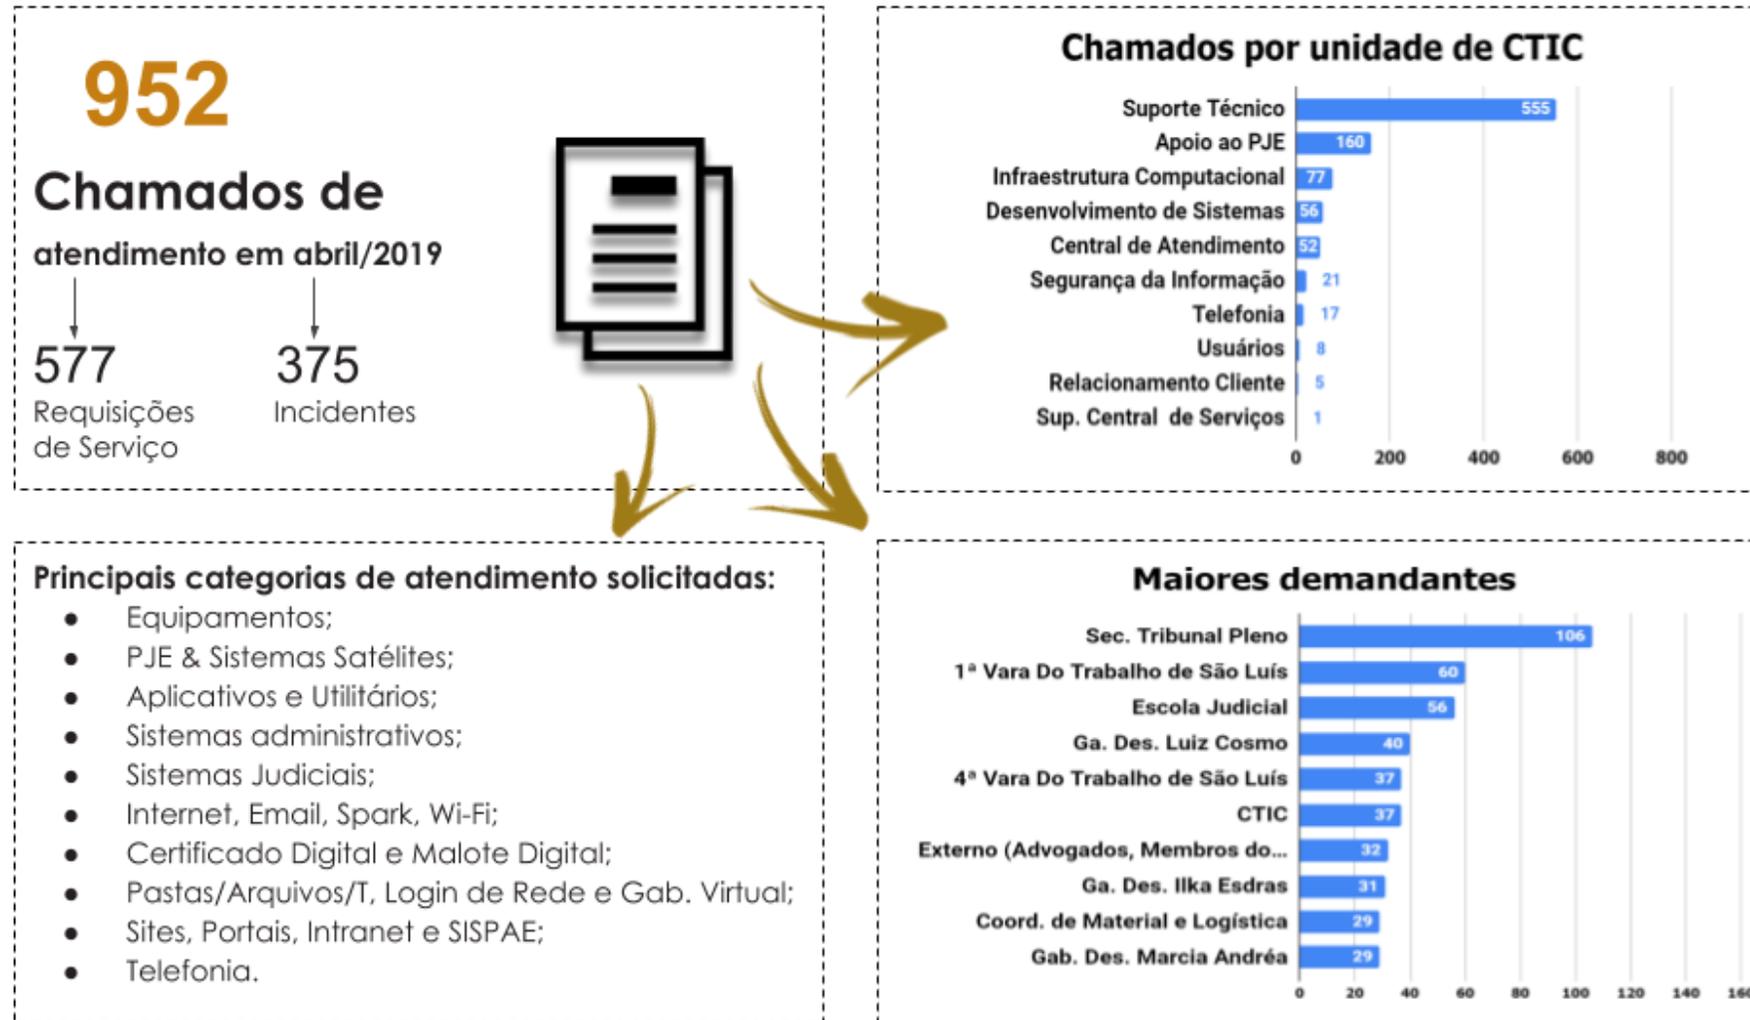


4. Portfólio de Projetos e Ações de TIC

Nesta seção são apresentadas as informações relativas aos projetos de TIC controlados pelo Escritório de Projetos de TIC.

Inicialmente, é exibida uma perspectiva geral dos projetos agrupados pela unidade na qual eles estão sendo gerenciados, e são listados os projetos iniciados, concluídos e cancelados no período.

Além do resumo do portfólio, para cada área de TIC são listados os projetos e suas respectivas evoluções no período de referência.

4.1. Resumo dos projetos

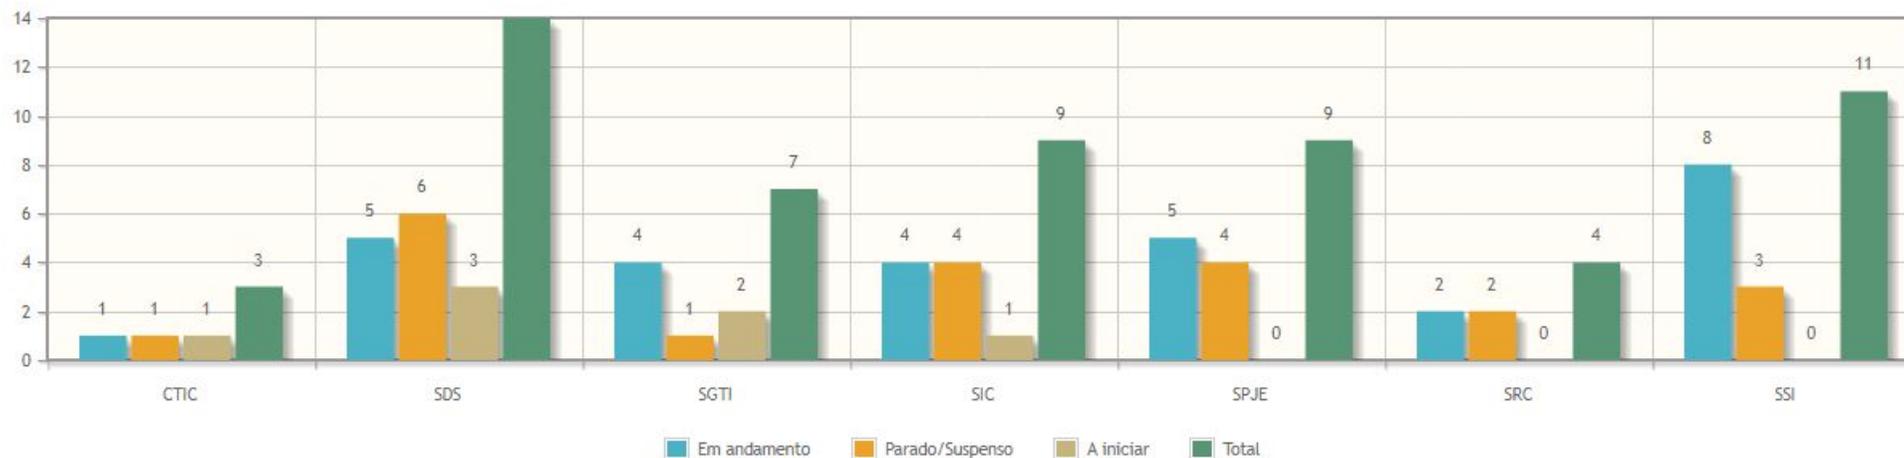

4.1.1. Projetos iniciados no período

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
472	Curso em Gestão de Riscos de TI - NBR 31000 e NBR 27005	Stanley Araujo de Sousa	SSI	Ação	14/03/2019	27/03/2019		Em andamento
473	Elaboração do Plano Anual de Conscientização e Treinamento em Segurança da Informação de 2020	Stanley Araujo de Sousa	SSI	Projeto	01/04/2019	08/04/2019		Em andamento
476	Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo Geral	Antoniél Magalhaes de Carvalho	SIC	Projeto	01/04/2019	16/04/2019		Em andamento
479	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do PABX	Carlos Eduardo Ferreira Marins	SRC	Contratação	23/04/2019	24/04/2019		Em andamento
484	Revisar o Processo de Software	Rafael Robinson de Sousa Neto	SGTI	Ação	26/04/2019	26/04/2019		Em andamento
474	Contratação de capacitações técnicas e gerenciais EAD	Gilberto Cunha Filho	SPJE	Capacitação	28/03/2019	29/03/2019		Suspensão

4.1.2. Projetos concluídos no período


<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
38	Aquisição de impressoras	Stanley Araujo de Sousa	SSI	Contratação	08/02/2018		16/04/2019	Concluído
41	Implantação do Pje KZ	Gilberto Cunha Filho	SPJE	Projeto	02/01/2018		16/04/2019	Concluído
236	Implantação do Sistema Satélite SAOPJE	Gilberto Cunha Filho	SPJE	Ação	22/01/2018		23/04/2019	Concluído
448	Plano Anual de Capacitação de 2019	José Augusto	SGTI	Projeto	14/11/2018		24/04/2019	Concluído
349	Revisão dos processos de gerenciamento de riscos e de incidentes de segurança da informação	Stanley Araujo de Sousa	SSI	Projeto	19/06/2018		25/04/2019	Concluído
390	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2019	Stanley Araujo de Sousa	SSI	Contratação	21/09/2018		25/04/2019	Concluído

132	Implantação da primeira fase do SIF	Gilberto Cunha Filho	SPJE	Projeto	30/03/2017		30/04/2019	Concluído
-----	-------------------------------------	----------------------	------	---------	------------	--	-------------------	------------------

4.1.3. Projetos cancelados no período


<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>	<i>Justificativa</i>
51	Contratação de Link de Internet para São João dos Patos e redundância para VTs do interior	Danilo Augusto Alves Leite	SIC	Contratação	23/03/2018		23/04/2019	Cancelado	O projeto foi cancelado sem entregas. Um novo projeto demandando (DOD #3679). Com isso, este perdeu o objetivo e o projeto de redundância WAN para o interior será gerenciado pelo projeto 480, Contratação e implantação de links WAN redundantes para as VTs do interior. (EGP-TIC)

4.2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações

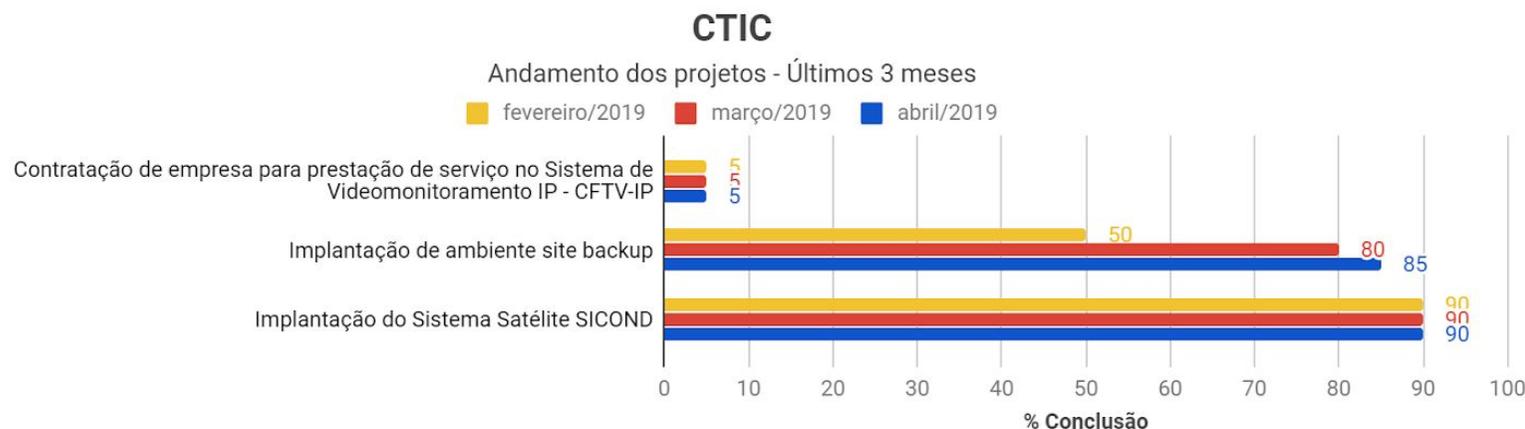

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	221	Implantação de ambiente site backup	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Em andamento	Projeto	30/11/2017	26/06/2019			85	Foram concluídas as instalações dos seguintes subsistemas: Sistema elétrico e de aterramento (fornecimento e instalação dos quadros de distribuição); Sistema de Detecção e Alarme Contra Incêndio; Instaladas as portas corta-fogo
2	246	Contratação de empresa para prestação de serviço no Sistema de Videomonitoramento IP - CFTV-IP	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Suspensão	Contratação	16/02/2018	20/08/2019			5	Sem progresso no período.
3	237	Implantação do Sistema Satélite SICOND	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Suspensão	Ação	22/01/2018	31/05/2019			90	Sem progresso no período.

4.3. Setor de Desenvolvimento de Sistemas

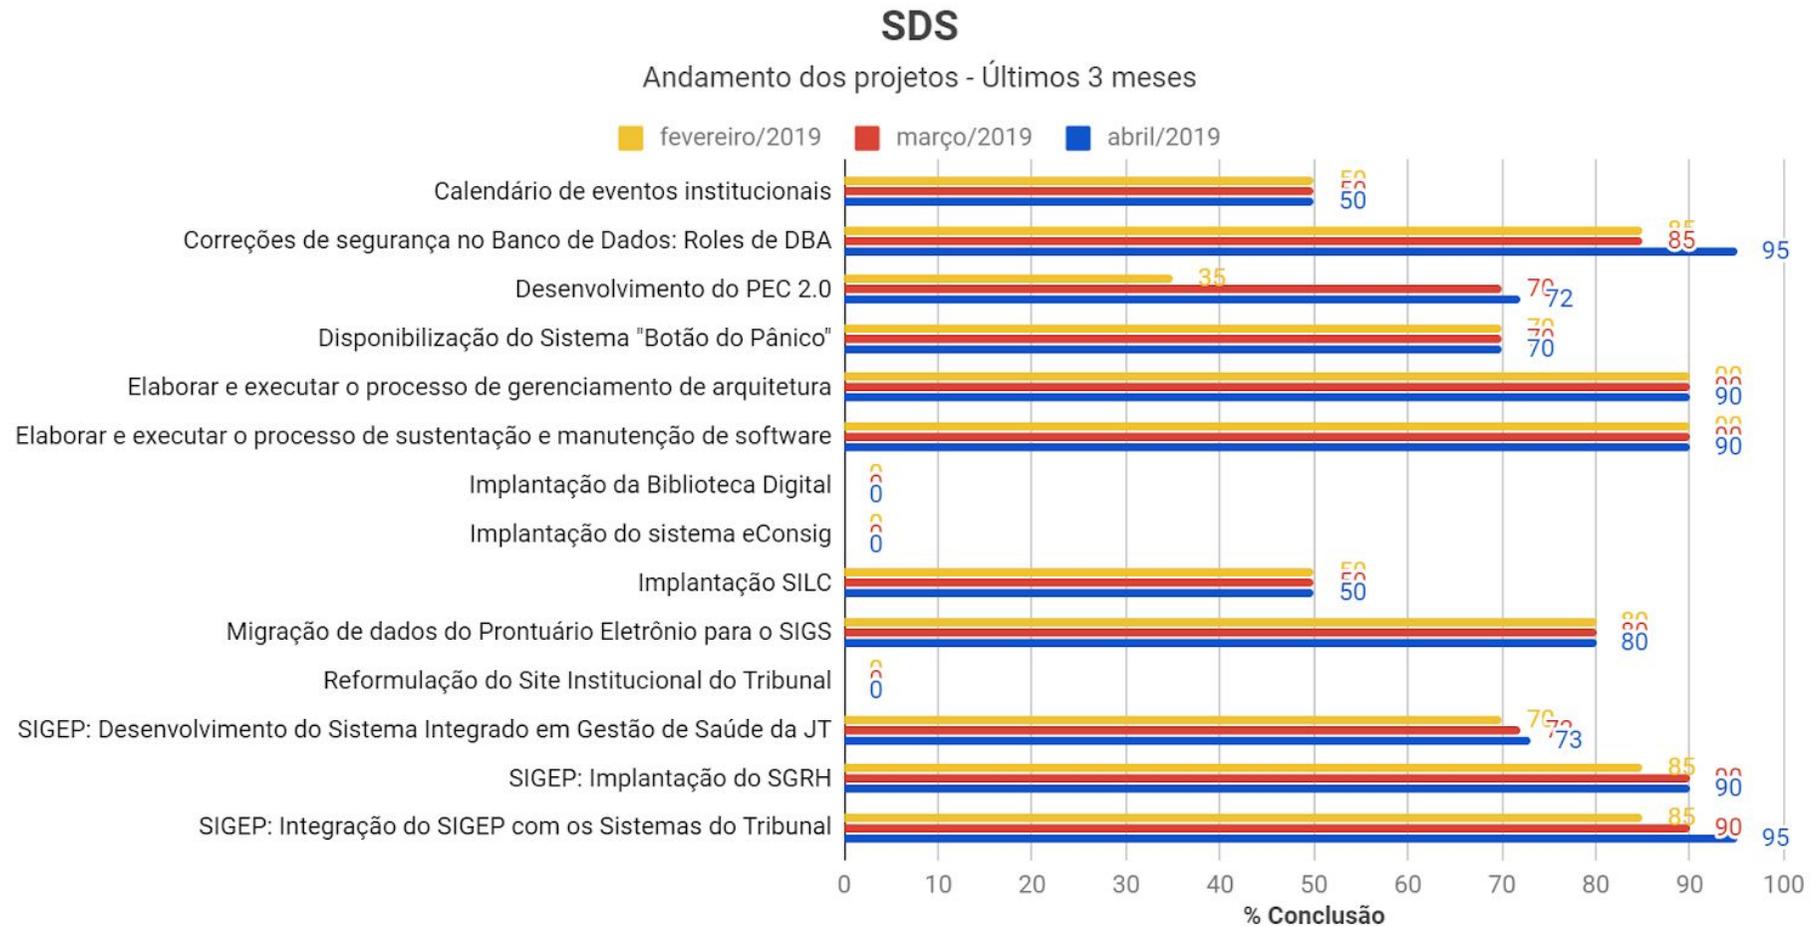

Relatório de Atividades da CTIC

Abril/2019

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	10	Correções de segurança no Banco de Dados: Roles de DBA	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	10/01/2017	08/05/2019			95	Atividades do projeto concluídos. Pendência encerramento formal.
2	19	Implantação SILC	Andre Pereira Nunes	Suspensão	Projeto	06/02/2018	31/07/2020			50	Sem progressos no período. Projeto postergado para execução em 2020 conforme PDTIC. (EGP-TIC)
3	32	SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	24/05/2018	31/05/2019			95	Concluídas as tarefas: Criação de tela para o cadastro de folgas na intranet; Criação de tela para o gozo de folgas adquiridas; Adequação do SCMP;
4	187	SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	Diogo Duailibe da Silva	Em andamento	Projeto	25/08/2017	01/12/2020			73	Foi realizada a homologação da primeira versão entre os dias 10 a 12 de Abril, na cidade de Salvador, a ser disponível para os regionais Foram corrigidos bugs encontrados em gerais do sistema, bugs impeditivos para homologação. Durante homologação, algumas funcionalidades não adequadas como especificado. Prazo até 31/05 para que essas funcionalidades estejam adequadas.
5	223	Calendário de eventos institucionais	Andre Pereira Nunes	Suspensão	Projeto	06/12/2017	31/05/2019			50	Sem progressos no período.
6	224	Implantação do sistema eConsig	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	06/12/2017	30/08/2019			0	Sem progressos no período. O projeto só pode iniciar após a o SIGEP e a FolhaWeb estarem em produção.
7	277	SIGEP: Implantação do SGRH	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	01/01/2018	04/06/2019			90	Resoluções de chamados referentes à implantação do SGRH.
8	279	Implantação da Biblioteca Digital	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	01/01/2018	18/12/2020			0	Sem progressos no período. Projeto previsto para execução em 2020.
9	280	Reformulação do Site Institucional do Tribunal	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	01/01/2018	27/12/2019			0	Pré-projeto: em fase de análise de soluções dos TRT5 e TRT8.


10	354	Desenvolvimento do PEC 2.0	Ronny Paterson Cruz da Silva	Em andamento	Projeto	03/07/2018	29/03/2019			72	Evolução no desenvolvimento dos pacotes: PEC - Pacote 02 - Destinatários e Outros destinatários: de 70% para 90%; PEC - Pacote 03 - Expedientes Fora do Fluxo (Elaboração e Impressão): de 74% para 90%;
11	376	Elaborar e executar o processo de sustentação e manutenção de software	Andre Pereira Nunes	Suspenso	Projeto	02/08/2018	31/05/2019			90	Sem progresso no período.
12	386	Elaborar e executar o processo de gerenciamento de arquitetura	Diogo Duailibe da Silva	Suspenso	Projeto	27/08/2018	07/05/2019			90	Sem progresso no período. Iniciado a revisão do PDS - Processo de Desenvolvimento de Software e decidiu-se incorporar o processo de arquitetura no PDS.
13	444	Migração de dados do Prontuário Eletrônico para o SIGS	Darlon José Coqueiro	Suspenso	Projeto	12/11/2018	31/05/2019			80	Sem progresso no período. Pendência ainda da homologação do SIGS.
14	446	Disponibilização do Sistema "Botão do Pânico"	Darlon José Coqueiro	Suspenso	Projeto	13/11/2018	15/06/2019			70	Sem progressos no período. Pendência de infraestrutura para o sistema.

4.4. Setor de Governança de TI

SGTI

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

■ fevereiro/2019 ■ março/2019 ■ abril/2019

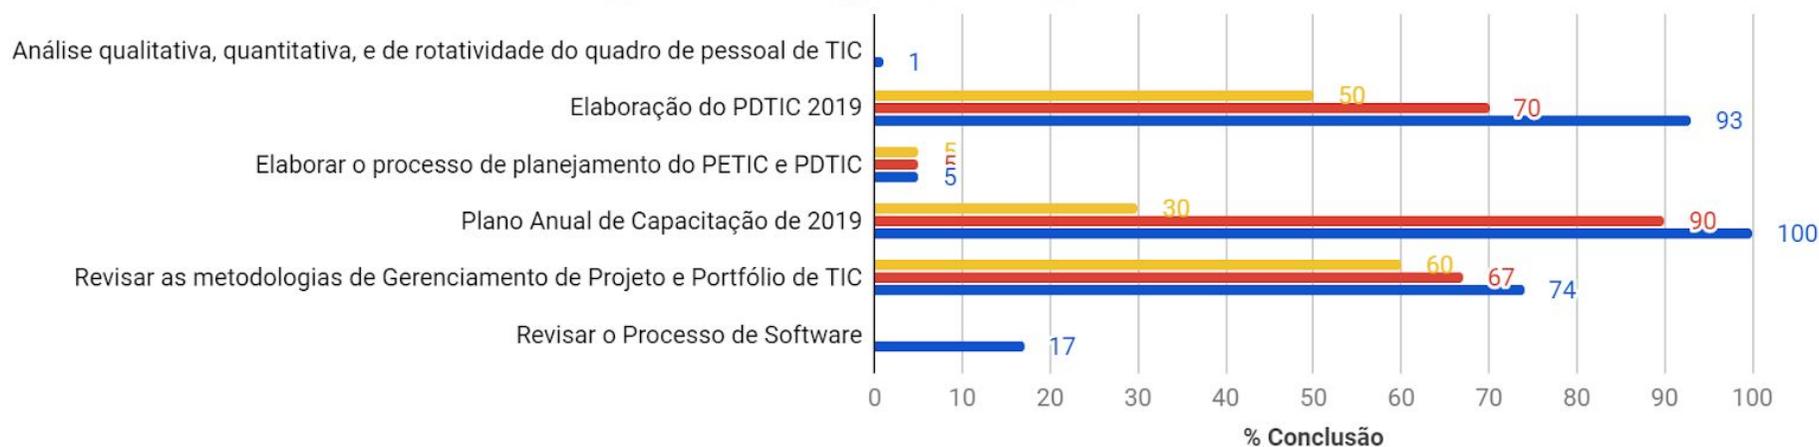


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	365	Elaboração do PDTIC 2019	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Projeto	03/08/2018	03/05/2019			93	Plano de ação aprovado pelo grupo de trabalho do PDTIC. Plano Diretor de TIC e a minuta da sua aprovação finalizadas e encaminhadas à Presidência para avaliação e publicação.
2	372	Elaborar o processo de planejamento do PETIC e PDTIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	Suspensão	Projeto	10/08/2018	31/07/2019			5	Sem progresso no período.

Relatório de Atividades da CTIC

Abril/2019

3	392	Revisar as metodologias de Gerenciamento de Projeto e Portfólio de TIC	Maickel Roberto Neitzke	Em andamento	Projeto	24/09/2018	31/05/2019			74	Minutas das portarias das políticas de gerenciamento de demandas, portfólio e projetos elaboradas. Documento da Metodologia de Gerenciamento de Projetos em fase de atualização com 40% concluído.
4	448	Plano Anual de Capacitação de 2019	Jose Augusto	Concluído	Projeto	14/11/2018	12/04/2019		24/04/2019	100	O projeto foi concluído com a publicação do PACTIC através da portaria EJUD N° 48/2019.
5	482	Análise qualitativa, quantitativa, e de rotatividade do quadro de pessoal de TIC	Jose Augusto	Em andamento	Projeto	24/04/2019	31/07/2019			1	O projeto foi autorizado e iniciado no final do período de abrangência da RDS.
6	484	Revisar o Processo de Software	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Ação	26/04/2019	14/06/2019	26/04/2019		17	Formalização e planejamento da ação realizada. Estudo dos processos relacionados à software e início da elaboração dos fluxos dos processo de software.

4.5. Setor de Infraestrutura Computacional

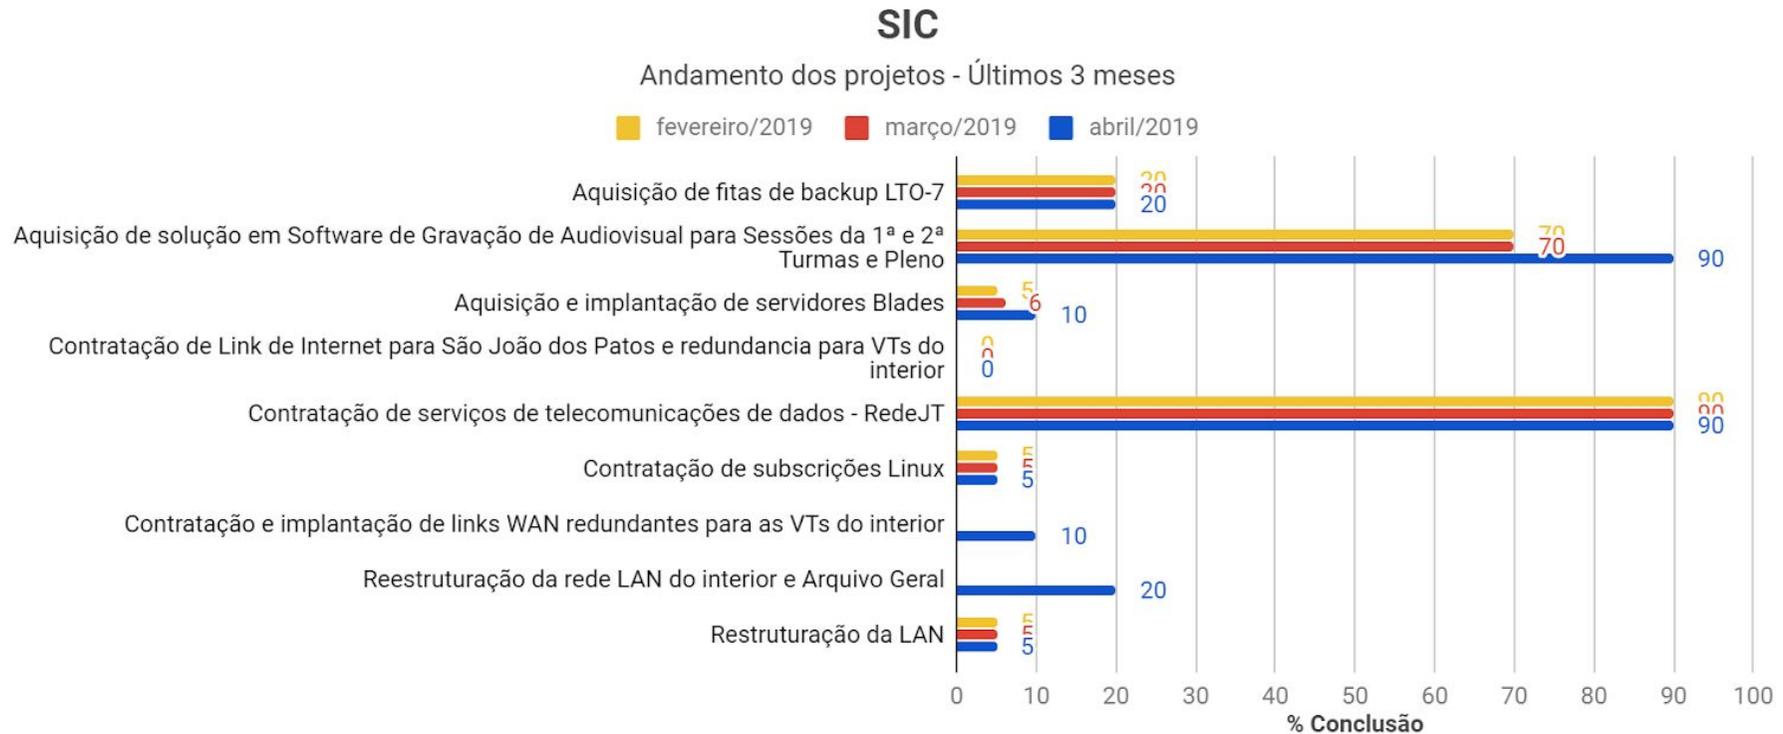


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	51	Contratação de Link de Internet para São João dos Patos e redundância para VTs do interior	Danilo Augusto Alves Leite	Cancelado	Contratação	23/03/2018	31/08/2020		23/04/2019	0	O projeto foi cancelado sem entregas. Um novo projeto demandando (DOD #3679). Com isso, este perdeu o objetivo e o projeto de redundância WAN para o interior será gerenciado pelo projeto 480, Contratação e implantação de links WAN redundantes para as VTs do interior.

											(EGP-TIC)	
2	233	Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT	Danilo Augusto Alves Leite	Suspensão	Contratação	12/01/2018	30/04/2019				90	Sem reporte do Gerente de Projeto. (EGP-TIC)
3	358	Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno	Pablo Teofilo Durans	Em andamento	Contratação	06/07/2018	30/06/2019				90	ETP e TR disponibilizado para revisão e ajustes.
4	442	Reestruturação da LAN	Danilo Augusto Alves Leite	Suspensão	Projeto	17/10/2018	19/12/2019				5	Sem progresso no período.
5	455	Aquisição e implantação de servidores Blades	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	Projeto	15/01/2019	28/06/2019	31/01/2019			10	ETP, TR, edital, ARP e extrato da ARP incluídos no PA. ETP complementar do TRT16 assinado e anexado ao PA.
6	460	Aquisição de fitas de backup LTO-7	Aured de Freitas Costa Rodrigues	Suspensão	Projeto	29/01/2019	30/06/2019	30/01/2019			20	Sem reporte do Gerente de Projeto. (EGP-TIC)
7	461	Contratação de subscrições Linux	Fernando Rola Ferreira Filho	Suspensão	Projeto	29/01/2019	31/07/2019	30/01/2019			5	Sem progresso no período.
8	476	Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo Geral	Antonieli Magalhaes de Carvalho	Em andamento	Projeto	01/04/2019	23/08/2019	16/04/2019			20	Início do projeto com as atividades realizadas: Elaboração do PGP; Planejamento do endereçamento IPv4 do Tribunal; Definição das VLANs; Definir cronograma de execução; Reestruturação da rede LAN do Arquivo Geral;
9	480	Contratação e implantação de links WAN redundantes para as VTs do interior	Danilo Augusto Alves Leite	Em andamento	Contratação	15/04/2019	07/05/2020	08/03/2019			10	Projeto iniciado com DOD e TAP. ETP em fase de elaboração. Realizadas reuniões e cotações com potenciais fornecedores.

4.6. Seção de Apoio ao PJe

SPJE

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

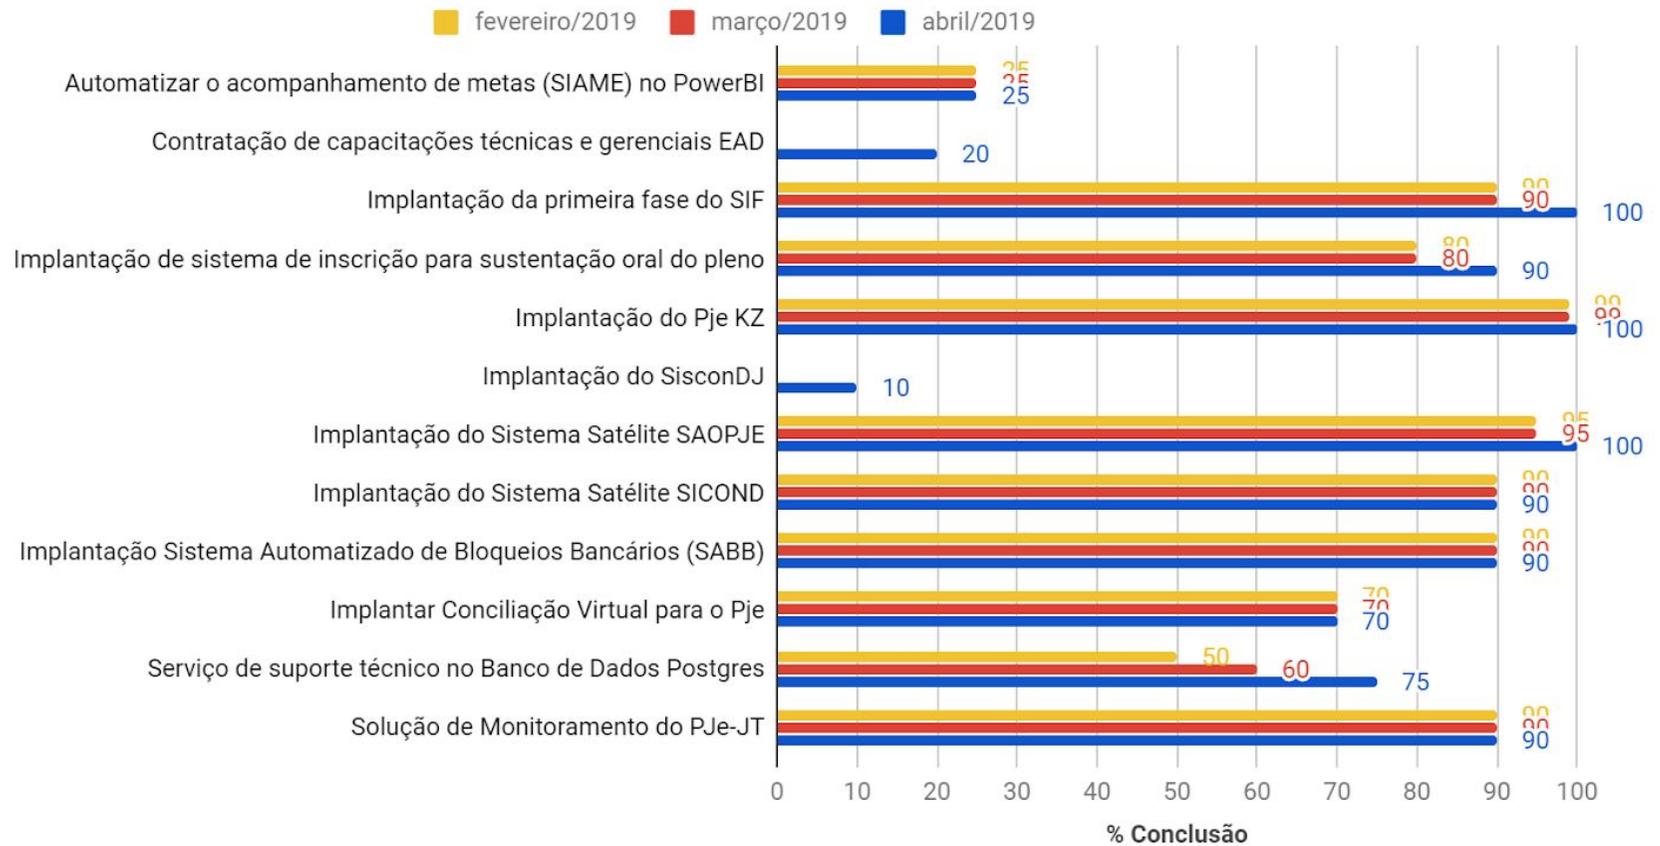

Relatório de Atividades da CTIC

Abril/2019

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	41	Implantação do Pje KZ	Gilberto Cunha Filho	Concluído	Projeto	02/01/2018	30/04/2019		16/04/2019	100	Projeto concluído. Aceite final do demandante realizado. (EGP-TIC)
2	56	Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0	Gilberto Cunha Filho	Suspenso	Projeto	06/04/2018	31/12/2019			80	Sem progresso no período. Pendência: definição pelo TST da data inicial de vigência para liberação das novas regras já implementadas.
3	132	Implantação da primeira fase do SIF	Gilberto Cunha Filho	Concluído	Projeto	30/03/2017	30/04/2019		30/04/2019	100	Projeto concluído conforme PA 2392/2017.
4	175	Implantar Conciliação Virtual para o Pje	Gilberto Cunha Filho	Suspenso	Projeto	20/07/2017	31/07/2019			70	Sem progresso no período.
5	236	Implantação do Sistema Satélite SAOPJE	Gilberto Cunha Filho	Concluído	Ação	22/01/2018	23/04/2019		23/04/2019	100	Termo de entrega aceito pelo requerente. Projeto concluído.
6	244	Implantação de sistema de inscrição para sustentação oral do pleno	Gilberto Cunha Filho	Em andamento	Projeto	15/02/2018	15/05/2019			90	Sistema disponibilizado em produção.
7	353	Solução de Monitoramento do PJe-JT	Romulo Moura	Em andamento	Contratação	21/06/2018	31/05/2019			90	Realizado o acompanhamento do registro de preço que o TST está liderando. Ainda sem informação concreta a respeito da data.
8	378	Automatizar o acompanhamento de metas (SIAME) no PowerBI	David Tedson Mendonca Ferreira	Suspenso	Ação	23/08/2018	30/08/2019			25	Sem progressos no período. Projeto previsto para retomar em 10/06/2019. (EGP-TIC)
9	396	Implantação Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários (SABB)	Gilberto Cunha Filho	Em andamento	Projeto	28/09/2018	31/05/2019			90	Correções de instalação em ambiente de produção. Atualização da versão em todas as estações de trabalho.
10	463	Serviço de suporte técnico no Banco de Dados Postgres	Romulo Moura	Em andamento	Contratação	10/01/2019	31/05/2019	29/01/2019		75	ETP assinado. PA de renovação encaminhado para DG autorizar o procedimento de renovação. Risco: Contrato atual expira em 31/05.

Relatório de Atividades da CTIC

Abril/2019


11	474	Contratação de capacitações técnicas e gerenciais EAD	Gilberto Cunha Filho	Suspensão	Capacitação	28/03/2019	28/06/2019	29/03/2019		20	Sem progresso no período.
12	477	Implantação do SisconDJ	Gilberto Cunha Filho	Em andamento	Ação	05/12/2018	08/07/2019			10	Início do projeto. Estudo para implantação.

4.7. Setor de Relacionamento com o Cliente

SRC

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

■ fevereiro/2019 ■ março/2019 ■ abril/2019

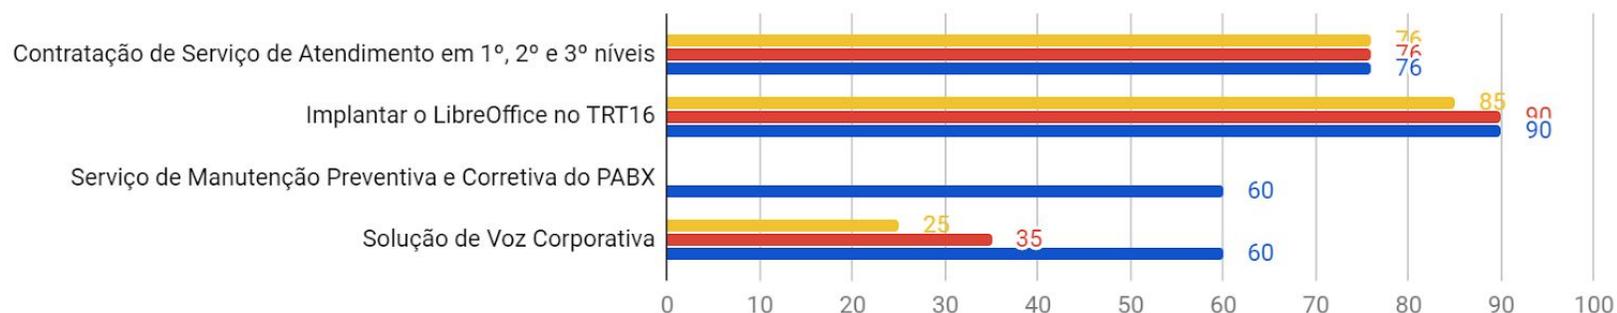


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	351	Implantar o LibreOffice no TRT16	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Suspense	Projeto	25/06/2018	07/06/2019			90	Sem progresso no período.
2	381	Solução de Voz Corporativa	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Contratação	27/08/2018	30/08/2019			60	Continuidade do desenvolvimento do ETP e TR.
3	391	Contratação de Serviço de Atendimento em 1º, 2º e 3º níveis	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Suspense	Contratação	19/09/2018	30/09/2019			76	Sem progresso no período.
4	479	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do PABX	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Contratação	23/04/2019	01/07/2019	24/04/2019		60	Elaborado TAP e o PGP, publicada a portaria de designação da equipe de planejamento da contratação e iniciado o desenvolvimento do ETP.

4.8. Seção de Segurança da Informação

SSI

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

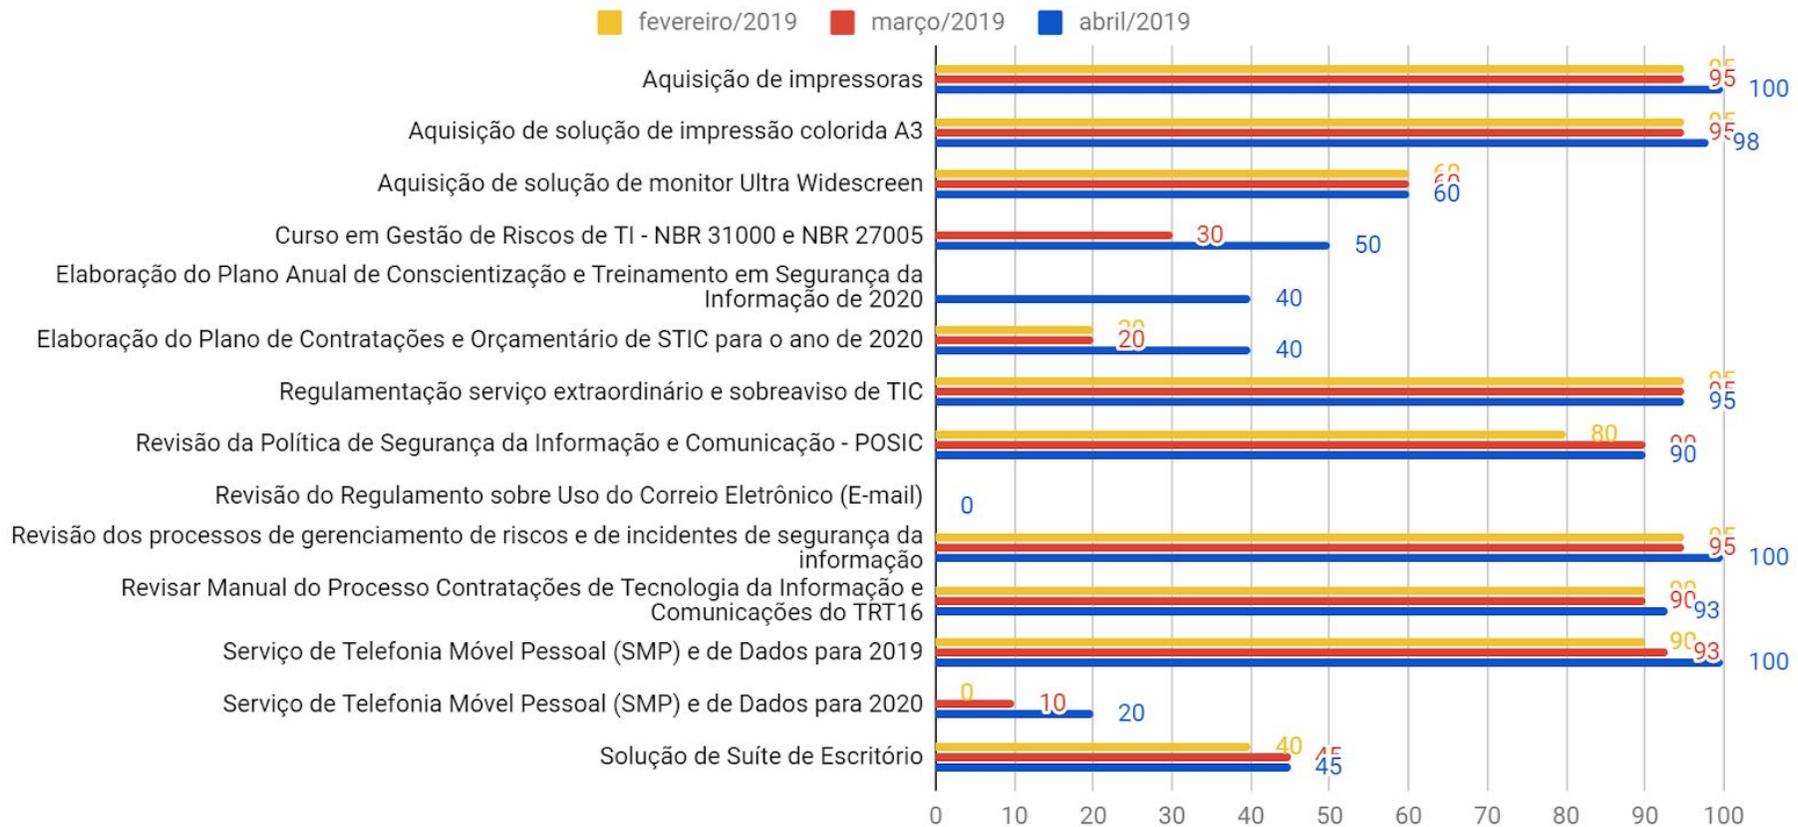

Relatório de Atividades da CTIC

Abril/2019

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	38	Aquisição de impressoras	Stanley Araujo de Sousa	Concluído	Contratação	08/02/2018	16/04/2019		16/04/2019	100	Projeto concluído.
2	39	Regulamentação serviço extraordinário e sobreaviso de TIC	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Ação	27/04/2018	28/06/2019			95	Sem progresso no período. Pendência de análise pelo CGovTIC.
3	42	Aquisição de solução de impressão colorida A3	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Contratação	26/10/2017	31/05/2019			98	Recebimentos de 02 impressoras.
4	147	Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	09/05/2017	11/06/2019			93	Manual revisado pela Diretoria-Geral. Texto do manual em fase de adequação.
5	168	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	28/06/2017	31/07/2019			90	Análise da minuta favorável pelo NAJ e DG.
6	349	Revisão dos processos de gerenciamento de riscos e de incidentes de segurança da informação	Stanley Araujo de Sousa	Concluído	Projeto	19/06/2018	31/05/2019		25/04/2019	100	Projeto concluído com publicação da portaria GP nº 319/2019.
7	375	Aquisição de solução de monitor Ultra Widescreen	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Contratação	27/08/2018	31/08/2019			60	Sem progresso no período. Pendência: lentidão no processo licitatório pelo CSJT.
8	390	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2019	Stanley Araujo de Sousa	Concluído	Contratação	21/09/2018	25/04/2019		25/04/2019	100	Projeto concluído.
9	450	Solução de Suíte de Escritório	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Contratação	21/11/2018	28/08/2019			45	Sem progresso no período.

10	454	Elaboração do Plano de Contratações e Orçamentário de STIC para o ano de 2020	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	04/01/2019	31/10/2019	04/01/2019		40	Coletas das necessidades realizadas. Análise de conformidade com as necessidades inseridas na PLOA de 2020 no SIGEO.
11	457	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2020	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Contratação	22/01/2019	10/04/2020	15/03/2019		20	Relatório sobre análise de Uso e Consumo do serviço de voz e uma proposta de ressarcimento indenizatória dos custos de telefonia encaminhada para a Secretaria de Administração para análise.
12	472	Curso em Gestão de Riscos de TI - NBR 31000 e NBR 27005	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Ação	14/03/2019	30/05/2019	27/03/2019		50	Processo em análise pelo Jurídico do Tribunal.
13	473	Elaboração do Plano Anual de Conscientização e Treinamento em Segurança da Informação de 2020	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	01/04/2019	24/09/2019	08/04/2019		40	Formalização do projeto. Análise das principais ameaças, dúvidas e sugestões de temas.
14	475	Revisão do Regulamento sobre Uso do Correio Eletrônico (E-mail)	Stanley Araujo de Sousa	A iniciar	Projeto	05/04/2019	30/09/2019			0	Projeto a iniciar.
