



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 16ª REGIÃO

Relatório de de Atividades da CTIC

Maio/2019

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	REUNIÃO DOS COMITÊS DE TIC	3
3.	ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC	4
4.	PORTFÓLIO DE PROJETOS E AÇÕES DE TIC	5
4.1.	RESUMO DOS PROJETOS	5
4.1.1.	PROJETOS INICIADOS NO PERÍODO	5
4.1.2.	PROJETOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO	6
4.1.3.	PROJETOS CANCELADOS NO PERÍODO	6
4.2.	COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES	8
4.3.	SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	10
4.4.	SETOR DE GOVERNANÇA DE TI	13
4.5.	SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL	15
4.6.	SEÇÃO DE APOIO AO PJE	17
4.7.	SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE	19
4.8.	SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	21

1. Introdução

Este documento tem por objetivo apresentar as atividades realizadas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação e suas unidades subordinadas no mês de **Maio de 2019**.

O relatório está estruturado pelos seguintes tópicos:

- Reunião dos comitês de TIC;
- Atendimento aos usuários de TIC;
- Portfólio de Projetos e Ações de TIC.


2. Reunião dos Comitês de TIC

No período de referência foi realizada uma reunião nos comitês relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação.

O **Comitê de Governança de TIC** reuniu-se no dia **29/05/2019** ([link para ata da reunião](#)) e tratou dos seguintes temas:

- Política de Gerenciamento de Software;
- Políticas do Escritório de Projetos de TIC;
- Demanda de Capacitação e Suporte em Infraestrutura Ágil (CSJT);
- Telefonia Móvel;
- Licenças de Software;
- Necessidade de Computador do Tipo Desktop;
- Projeto Reformulação do Portal Institucional;
- Regulamentação de Serviço extraordinário e regime de Sobreaviso de TIC;
- Portfólio de Projetos de TIC.

3. Atendimento aos Usuários de TIC

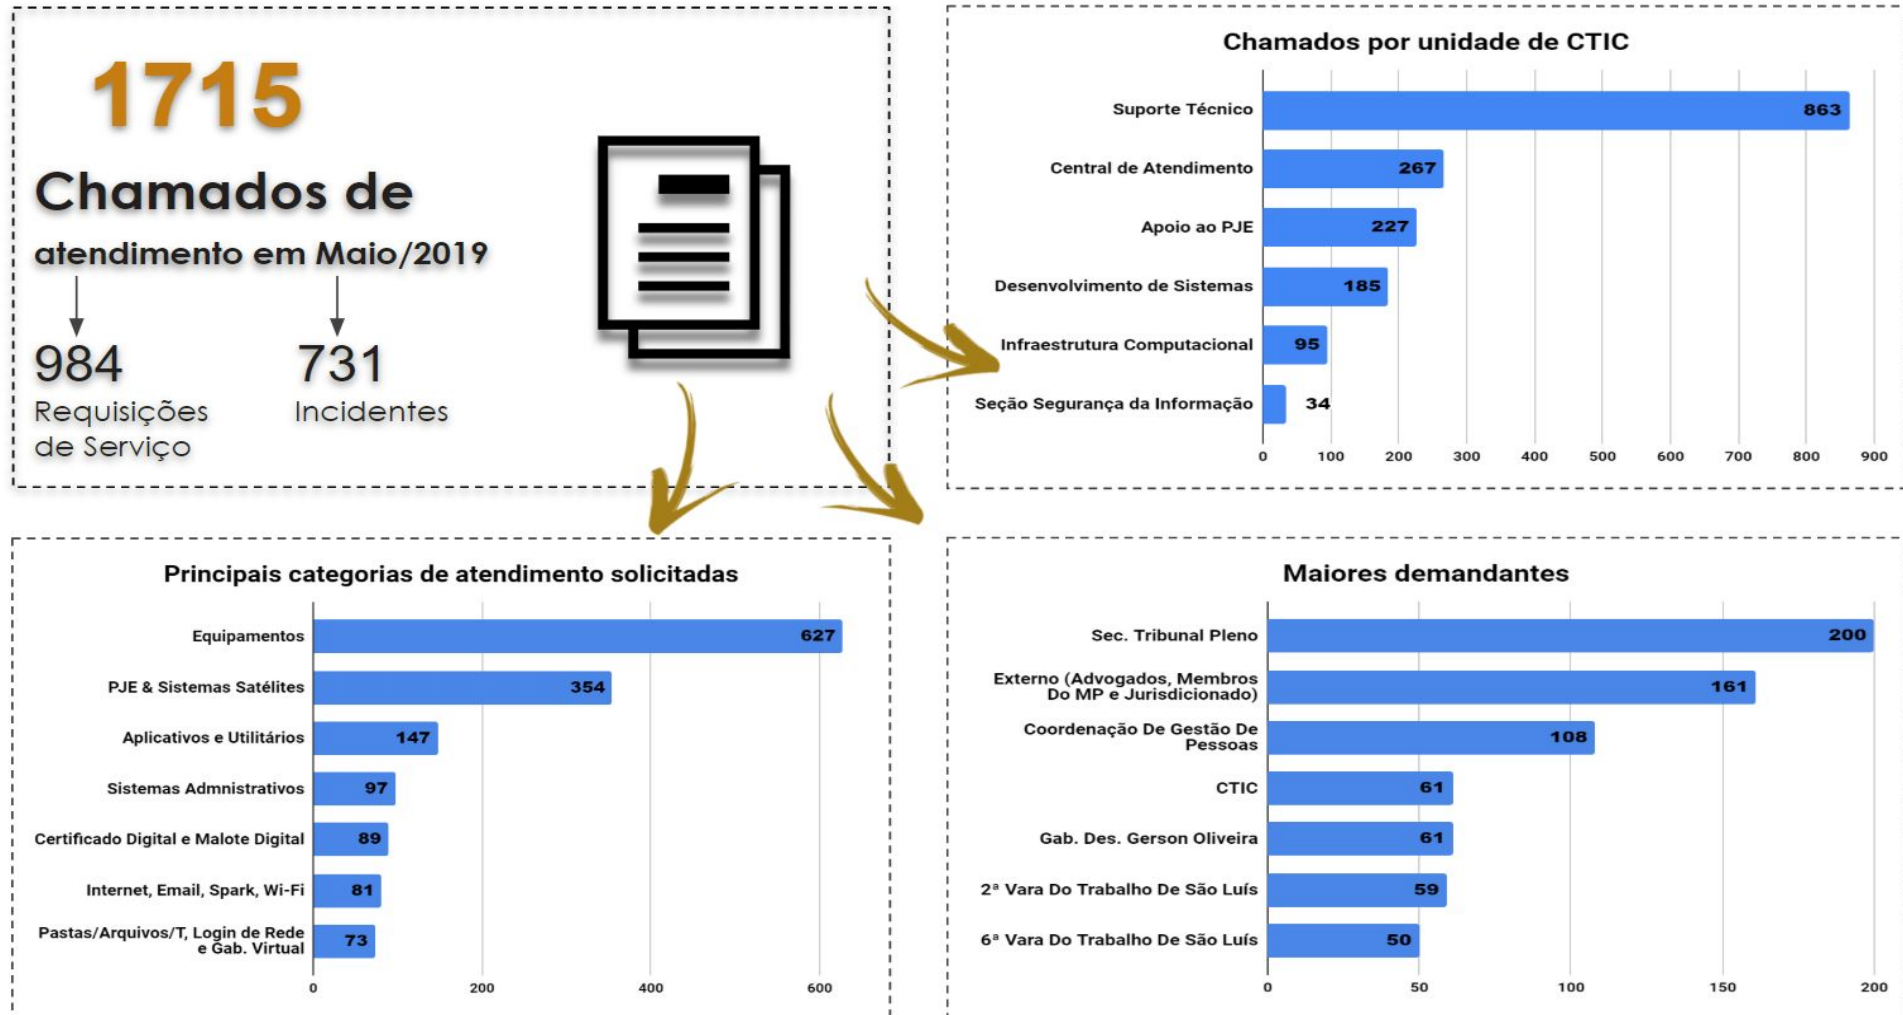


4. Portfólio de Projetos e Ações de TIC

Nesta seção são apresentadas as informações relativas aos projetos de TIC controlados pelo Escritório de Projetos de TIC.

Inicialmente, é exibida uma perspectiva geral dos projetos agrupados pela unidade na qual eles estão sendo gerenciados, e são listados os projetos iniciados, concluídos e cancelados no período.

Além do resumo do portfólio, para cada área de TIC são listados os projetos e suas respectivas evoluções no período de referência.

4.1. Resumo dos projetos

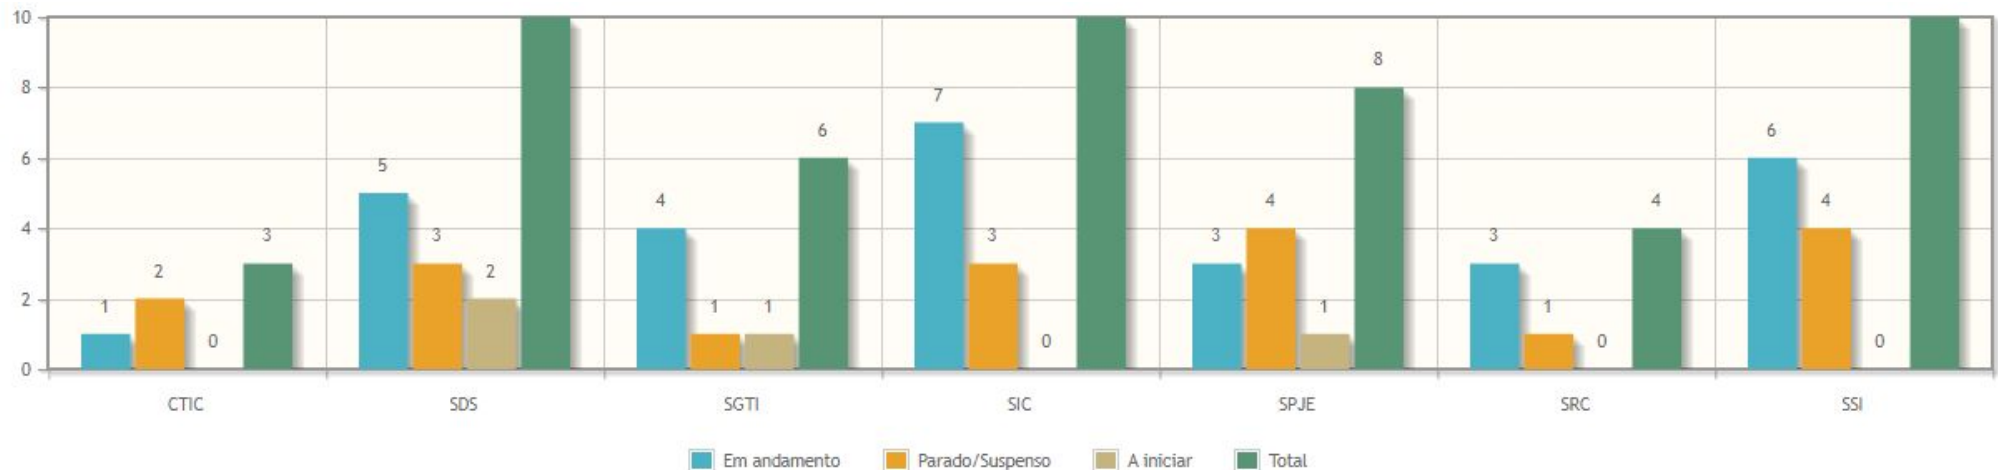

4.1.1. Projetos iniciados no período

Id	Nome	Gerente do projeto	Unidade responsável	Tipo	Data da demanda	Início realizado	Fim realizado	Status
280	Reformulação do Site Institucional do Tribunal	Andre Pereira Nunes	SDS	Projeto	01/01/2018	29/05/2019		Em andamento

Relatório de Atividades da CTIC

Maio/2019

485	Suporte à Plataforma de Banco de Dados Oracle 2019	Leonel Pereira	SIC	Contratação	02/05/2019	17/05/2019		Em andamento
486	Revisar PETIC 2017-2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	SGTI	Ação	13/05/2019	14/05/2019		Em andamento

4.1.2. Projetos concluídos no período

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
10	Correções de segurança no Banco de Dados: Roles de DBA	Andre Pereira Nunes	SDS	Projeto	10/01/2017		07/05/2019	Concluído
42	Aquisição de solução de impressão colorida A3	Stanley Araujo de Sousa	SSI	Contratação	26/10/2017	14/06/2018	21/05/2019	Concluído
244	Implantação de sistema de inscrição para sustentação oral do pleno	Gilberto Cunha Filho	SPJE	Projeto	15/02/2018		16/05/2019	Concluído
376	Elaborar e executar o processo de sustentação e manutenção de software	Andre Pereira Nunes	SDS	Projeto	02/08/2018		07/05/2019	Concluído
386	Elaborar e executar o processo de gerenciamento de arquitetura	Diogo Duailibe da Silva	SDS	Projeto	27/08/2018		07/05/2019	Concluído
396	Implantação Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários (SABB)	Gilberto Cunha Filho	SPJE	Projeto	28/09/2018		08/05/2019	Concluído
444	Migração de dados do Prontuário Eletrônico para o SIGS	Darlon José Coqueiro	SDS	Projeto	12/11/2018	12/11/2018	30/05/2019	Concluído
365	Elaboração do PDTIC 2019	Rafael Robinson de Sousa Neto	SGTI	Projeto	03/08/2018		15/05/2019	Concluído

4.1.3. Projetos cancelados no período

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>	<i>Justificativa</i>
237	Implantação do Sistema	Claudio	CTIC	Ação	22/01/2018		24/05/2019	Cancelado	Projeto cancelado pelo demandante:


Satélite SICOND	Henrique Carneiro Sampaio									<i>"Considerando que o sistema SICOND tem por objetivo auxiliar na criação da Ata de Correição e que, no entanto, este Tribunal criou uma ferramenta própria para este fim, atendendo, na visão de negócio e técnica, de forma mais completa que o Sicond, a Corregedoria entende que, no momento, projeto não deve prosseguir."</i>
-----------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações

CTIC

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

março/2019 abril/2019 maio/2019

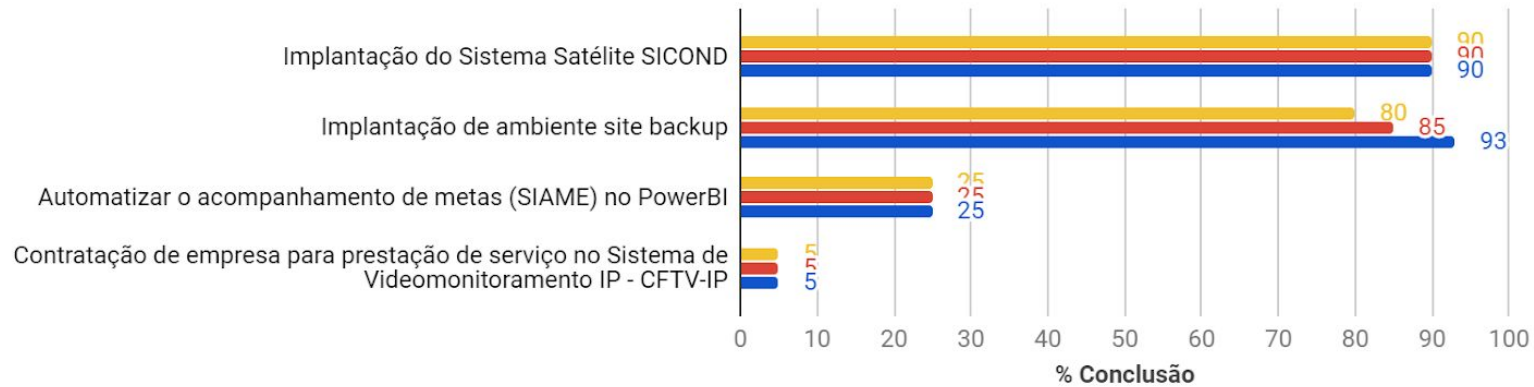

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	237	Implantação do Sistema Satélite SICOND	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Cancelado	Ação	22/01/2018	24/05/2019		24/05/2019	90	Projeto cancelado pelo demandante.
2	221	Implantação de ambiente site backup	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Em andamento	Projeto	30/11/2017	26/06/2019			93	A sala encontra-se operacional, com todos os subsistemas em funcionamento. Falta iniciar o processo de movimentação dos equipamentos que serão instalados na sala. Foi solicitado pela FONMART o recebimento provisório.

Relatório de Atividades da CTIC

Maio/2019


3	378	Automatizar o acompanhamento de metas (SIAME) no PowerBI	David Tedson Mendonca Ferreira	Suspensa	Ação	23/08/2018	30/08/2019			25	Projeto suspenso. Previsto para retomar em 10/06/2019. (EGP-TIC)
4	246	Contratação de empresa para prestação de serviço no Sistema de Videomonitoramento IP - CFTV-IP	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Suspensa	Contratação	16/02/2018	20/09/2019			5	Sem progresso no período.

4.3. Setor de Desenvolvimento de Sistemas

SDS

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

março/2019 abril/2019 maio/2019

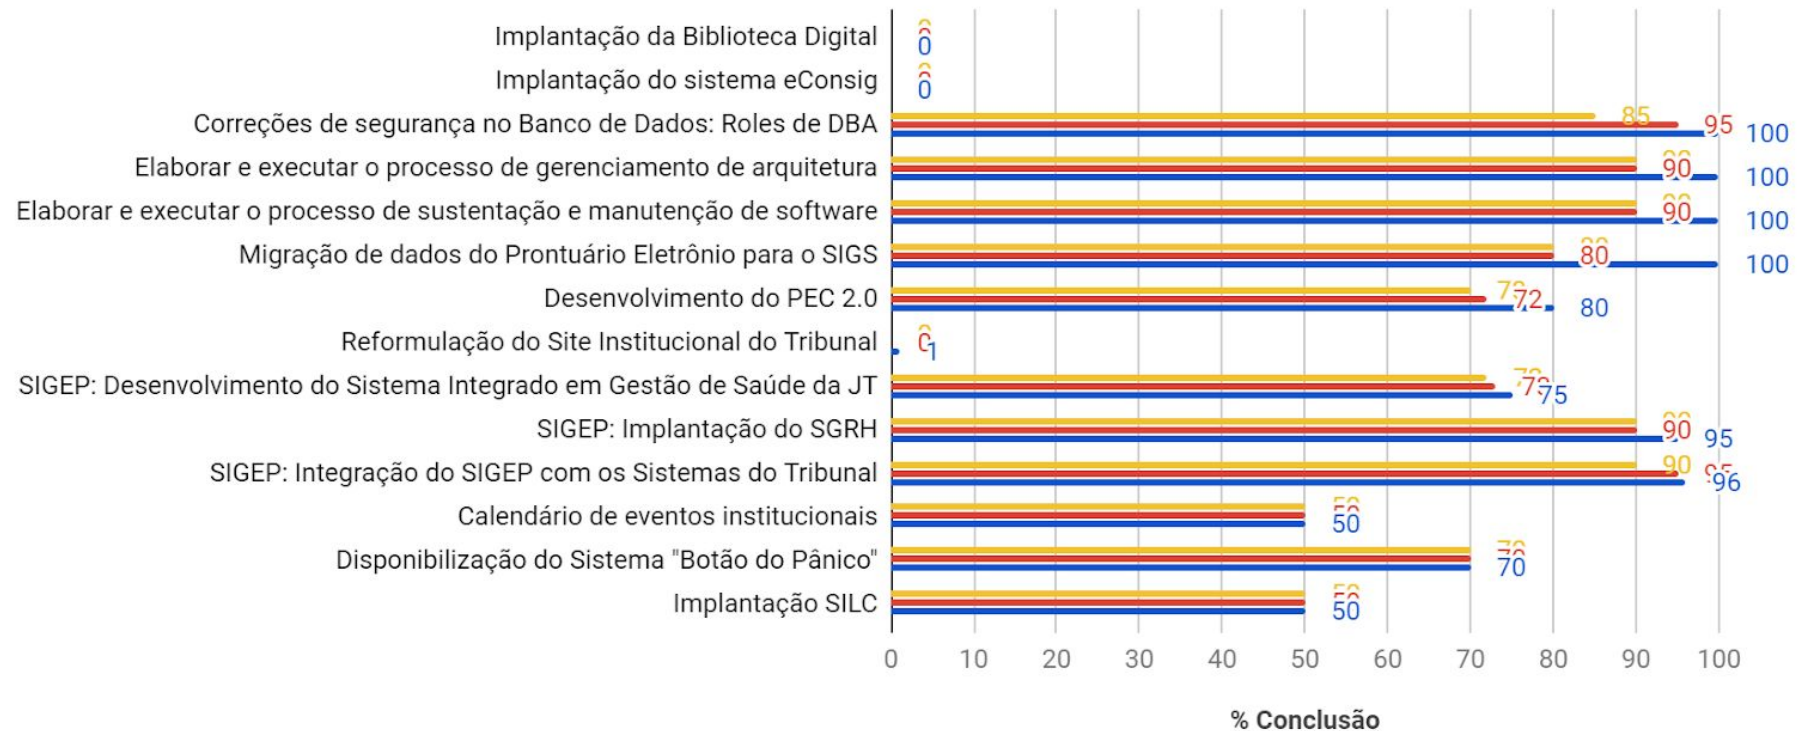

#	Id	Projeto	Gerente do	Status	Tipo	Data da	Fim	Início	Fim	%	Conclusão da RDS
---	----	---------	------------	--------	------	---------	-----	--------	-----	---	------------------

		projeto			demanda	previsto	realizado	realizado	Conclusão	
1	224	Implantação do sistema eConsig	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	06/12/2017	30/08/2019		0	Sem progresso no período. Aguardando a entrada da FolhaWeb em produção.
2	279	Implantação da Biblioteca Digital	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	01/01/2018	18/12/2020		0	Sem progressos no período. Projeto previsto para execução em 2020.
3	10	Correções de segurança no Banco de Dados: Roles de DBA	Andre Pereira Nunes	Concluído	Projeto	10/01/2017	31/05/2019	07/05/2019	100	Projeto encerrado formalmente.
4	376	Elaborar e executar o processo de sustentação e manutenção de software	Andre Pereira Nunes	Concluído	Projeto	02/08/2018	31/05/2019	07/05/2019	100	Projeto concluído parcialmente. Artefatos elaborados, porém não publicados. Eles foram utilizados no projeto de revisão da política de gerenciamento de software.
5	386	Elaborar e executar o processo de gerenciamento de arquitetura	Diogo Duailibe da Silva	Concluído	Projeto	27/08/2018	07/05/2019	07/05/2019	100	Projeto concluído parcialmente. Artefatos elaborados, porém não publicados. Eles foram utilizados no projeto de revisão da política de gerenciamento de software.
6	444	Migração de dados do Prontuário Eletrônico para o SIGS	Darlon José Coqueiro	Concluído	Projeto	12/11/2018	31/05/2019	12/11/2018 30/05/2019	100	Projeto concluído. Elaborado procedimentos de migração que serão executados através de chamado operacional.
7	32	SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	24/05/2018	30/08/2019		96	Identificado e realizado a adequação de esquemas do BD que acessam ao esquema do RH legado.
8	187	SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	Diogo Duailibe da Silva	Em andamento	Projeto	25/08/2017	01/12/2020		75	Implementado Auditoria via filtros. Inserção da anotação de auditoria nos métodos Ocupacionais e Assistenciais. Correção da consulta de Auditoria para contemplar as mudanças feitas pela implementação do filtro de Auditoria.


9	277	SIGEP: Implantação do SGRH	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	01/01/2018	30/08/2019			95	Realizado a carga definitiva em PRODUÇÃO no SGRH, a partir do Sistema de RH Legado. Resolução de 78 chamados (via Assyst), referente a correções para a carga, revisões de privilégios de acesso e atualização de versão.
10	280	Reformulação do Site Institucional do Tribunal	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	01/01/2018	31/12/2019	29/05/2019		1	Realizado o estudo de portais candidatos. Definida a infraestrutura necessária. Proposta de TAP aprovada na 4ª Reunião do CGovTIC.
11	354	Desenvolvimento do PEC 2.0	Ronny Paterson Cruz da Silva	Em andamento	Projeto	03/07/2018	24/01/2020			80	Evolução no desenvolvimento dos pacotes: <ul style="list-style-type: none"> • 100% - DAS • 95% - Pacote 01 - Atos Agrupados e Exibição de Participantes do Processo • 90% - Pacote 02 - Destinatários e Outros destinatários • 90% - Pacote 03 - Expedientes Fora do Fluxo • 50% - Pacote 04 - Edição e Assinatura de Atos de Comunicação • 0% - Pacote 05 - GIM e GIGS 0% para • 50% - PEC - Pacote 06 - Melhorias no PAC 2
12	19	Implantação SILC	Andre Pereira Nunes	Suspensão	Projeto	06/02/2018	31/07/2020			50	Projeto postergado para execução em 2020 conforme PDTIC. (EGP-TIC)
13	223	Calendário de eventos institucionais	Andre Pereira Nunes	Suspensão	Projeto	06/12/2017	30/06/2019			50	Sem progressos no período. Pendência no tratamento de problemas encontrados, e decisão acerca do novo portal.
14	446	Disponibilização do Sistema "Botão do Pânico"	Darlon José Coqueiro	Suspensão	Projeto	13/11/2018	15/07/2019			70	Sem progressos no período. Pendência da Infraestrutura.

4.4. Setor de Governança de TI

SGTI

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses


■ março/2019 ■ abril/2019 ■ maio/2019

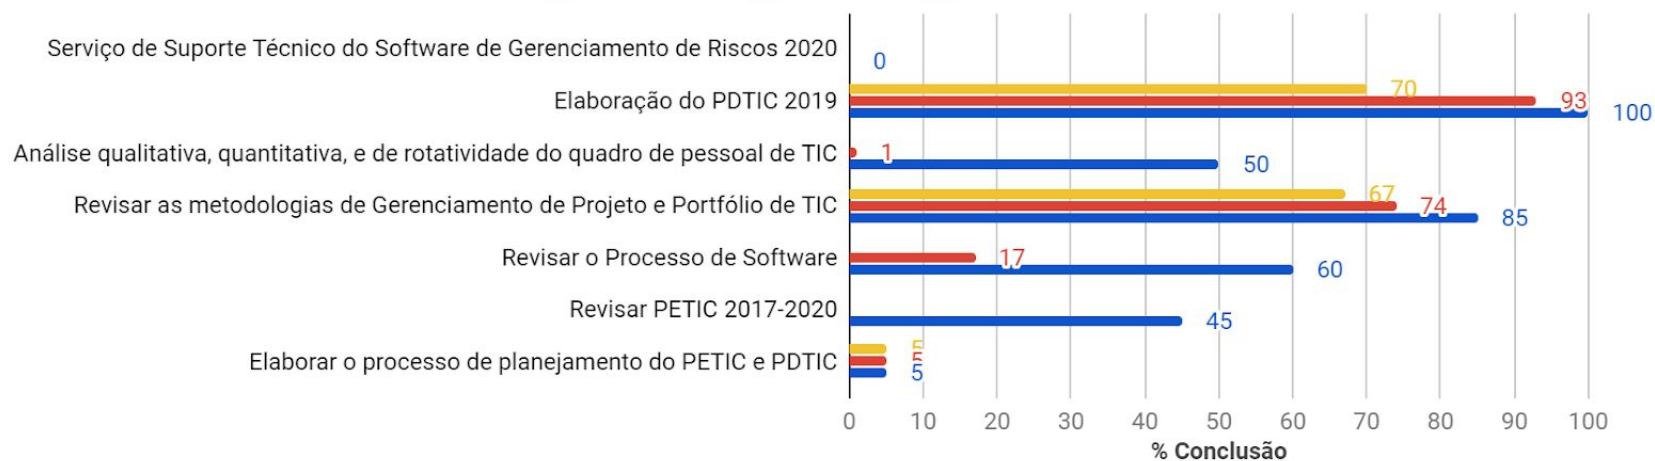

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	483	Serviço de Suporte Técnico do Software de Gerenciamento de Riscos 2020	Jose Augusto	A iniciar	Projeto	25/04/2019	31/12/2019			0	Sem progresso no período.
2	365	Elaboração do PDTIC 2019	Rafael Robinson de Sousa Neto	Concluído	Projeto	03/08/2018	15/05/2019		15/05/2019	100	Projeto concluído com êxito. O Plano Diretor de TIC 2019-2020 foi instituído pelo Tribunal através da Portaria GP N° 368/2019

3	392	Revisar as metodologias de Gerenciamento de Projeto e Portfólio de TIC	Maickel Roberto Neitzke	Em andamento	Projeto	24/09/2018	28/06/2019			85	Documento da MGP e fase de revisão. Minutas das portarias das políticas de gerenciamento de demandas, portfólio e projetos analisadas e aprovadas na 4ª Reunião do CGovTIC.
4	482	Análise qualitativa, quantitativa, e de rotatividade do quadro de pessoal de TIC	Jose Augusto	Em andamento	Projeto	24/04/2019	31/07/2019	29/04/2019		50	Análise quantitativa concluída. Mapeadas as competências das unidades: SGTI, SPJE, SDS, SRC e SSI.
5	484	Revisar o Processo de Software	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Ação	26/04/2019	21/06/2019	26/04/2019		60	Elaboração dos 4 fluxos do Processo Gerenciar Software: Desenvolver Software, Implantar Software, Sustentar Software e Desativar Software. Finalização da minuta cujo objetivo é instituir a Política de Gerenciamento de Software. Elaboração de 50% do Processo de Trabalho de Gerenciamento de Software.
6	486	Revisar PETIC 2017-2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Ação	13/05/2019	19/07/2019	14/05/2019		45	Planejamento da ação com a definição do cronograma de execução. Levantamento dos documentos de referência e realização do diagnóstico no PETIC atual. Definição do novo mapa estratégico e início da elaboração dos novos indicadores e metas.
7	372	Elaborar o processo de planejamento do PETIC e PDTIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	Suspensão	Projeto	10/08/2018	31/07/2019			5	Sem progresso no período.

4.5. Setor de Infraestrutura Computacional

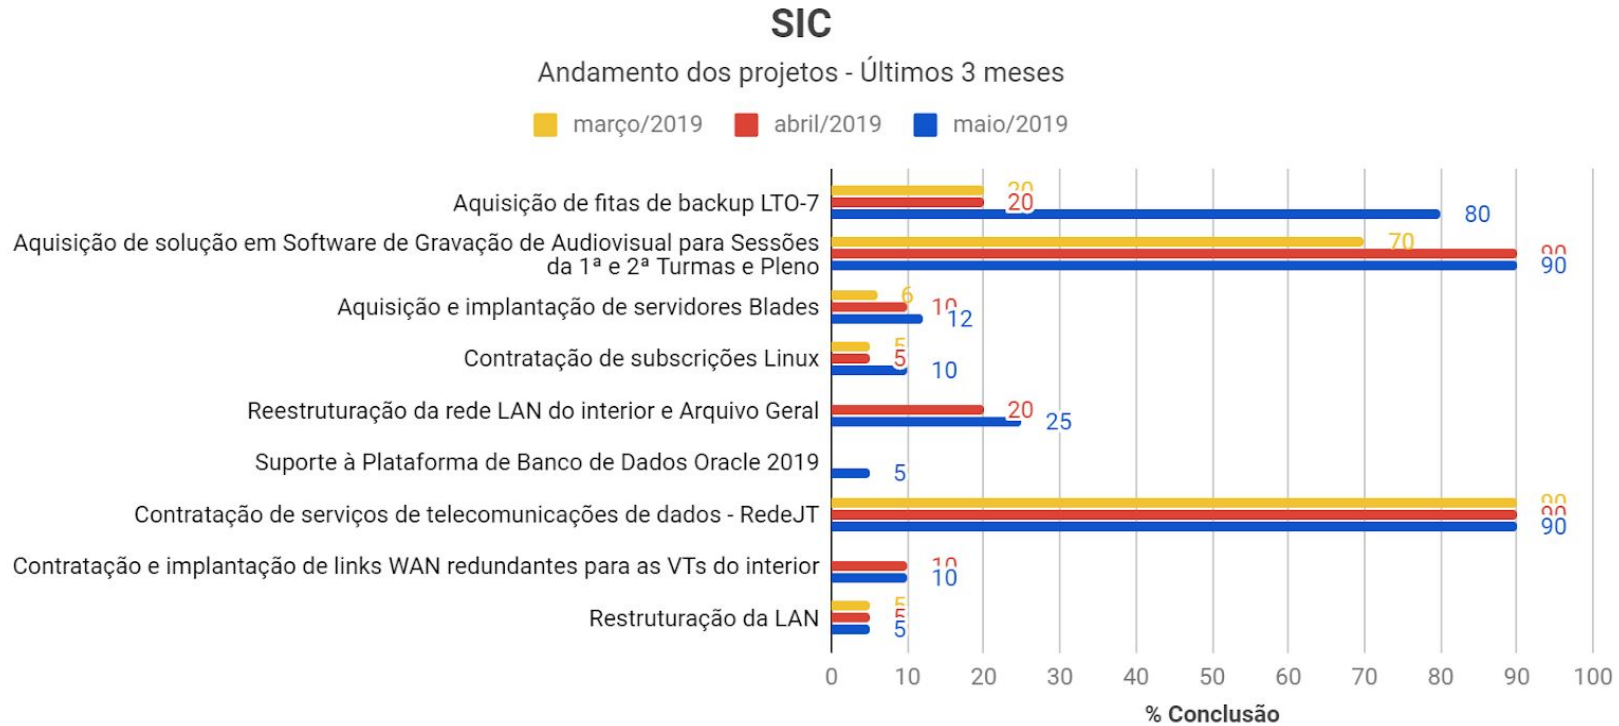

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	358	Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno	Pablo Teófilo Durans	Em andamento	Contratação	06/07/2018	31/07/2019			90	Sem progresso no período. Apesar de interações em busca de entendimento entre setores administrativos e técnicos.


2	455	Aquisição e implantação de servidores Blades	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	Projeto	15/01/2019	29/11/2019	31/01/2019		12	Despachado os quantitativos das unidades do item 9 da ARP. Minuta do contrato elaborada e repassada para o Setor de Contratos. Emissão de certidões do SICAF da empresa vencedora da licitação.
3	460	Aquisição de fitas de backup LTO-7	Aured de Freitas Costa Rodrigues	Em andamento	Projeto	29/01/2019	30/06/2019	30/01/2019		80	ARP com previsão para 30/05.
4	461	Contratação de subscrições Linux	Fernando Rola Ferreira Filho	Em andamento	Projeto	29/01/2019	31/08/2019	30/01/2019		10	Equipe de planejamento instituída. Iniciado o ETP com análise de viabilidade.
5	476	Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo Geral	Antonieli Magalhaes de Carvalho	Em andamento	Projeto	01/04/2019	23/08/2019	16/04/2019		25	Reestruturado a rede LAN da VT de Santa Inês.
6	485	Suporte à Plataforma de Banco de Dados Oracle 2019	Leonel Pereira	Em andamento	Contratação	02/05/2019	27/10/2019	17/05/2019		5	PGP elaborado, portaria da equipe de planejamento publicada, e elaboração do ETP iniciada.
7	233	Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT	Danilo Augusto Alves Leite	Suspensão	Contratação	12/01/2018	19/12/2019			90	Sem progresso no período.
8	442	Restruturação da LAN	Danilo Augusto Alves Leite	Suspensão	Projeto	17/10/2018	30/06/2019			5	Sem progresso no período.
9	480	Contratação e implantação de links WAN redundantes para as VTs do interior	Danilo Augusto Alves Leite	Suspensão	Contratação	15/04/2019	15/07/2020	08/03/2019		10	Sem progresso no período.

4.6. Seção de Apoio ao PJe

SPJE

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

março/2019 abril/2019 maio/2019

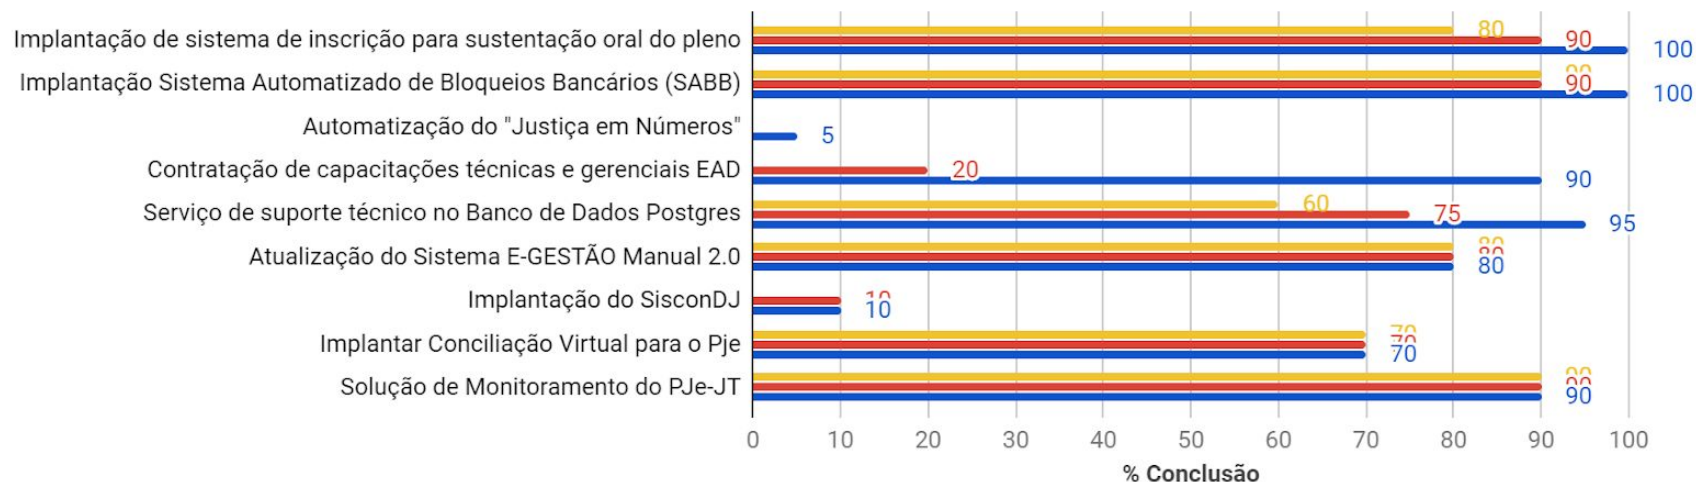

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	244	Implantação de sistema de inscrição para sustentação oral do pleno	Gilberto Cunha Filho	Concluído	Projeto	15/02/2018	16/05/2019		16/05/2019	100	Termo de entrega despachado e Projeto concluído;
2	396	Implantação Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários (SABB)	Gilberto Cunha Filho	Concluído	Projeto	28/09/2018	08/05/2019		08/05/2019	100	Projeto concluído.
3	463	Serviço de suporte técnico no Banco de Dados Postgres	Romulo Moura	Em andamento	Contratação	10/01/2019	28/06/2019	29/01/2019		95	Aditivo nº 04 do contrato nº 04/2016 assinado e juntado ao PA 5809/2015. Resta o encerramento formal do projeto.

Relatório de Atividades da CTIC

Maio/2019


4	474	Contratação de capacitações técnicas e gerenciais EAD	Gilberto Cunha Filho	Em andamento	Capacitação	28/03/2019	28/06/2019	29/03/2019		90	Envio de certidões de regularidade; Propostas atualizadas; Confirmação de dotação orçamentária;
5	481	Automatização do "Justiça em Números"	Djeison Rafael Neitzke	Em andamento	Ação	23/04/2019	19/07/2019	19/06/2019		5	Criado modelo de dados; Implementada a 1ª versão de desenvolvimento no Pentaho; Realizado teste com 3 itens do módulo produtividade.
6	56	Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0	Gilberto Cunha Filho	Suspenso	Projeto	06/04/2018	31/12/2019			80	Sem progresso no período;
7	175	Implantar Conciliação Virtual para o Pje	Gilberto Cunha Filho	Suspenso	Projeto	20/07/2017	31/07/2019			70	Sem progresso no período;
8	353	Solução de Monitoramento do PJe-JT	Romulo Moura	Suspenso	Contratação	21/06/2018	28/06/2019			90	Sem progresso no período.
9	477	Implantação do SisconDJ	Gilberto Cunha Filho	Suspenso	Ação	05/12/2018	08/07/2019			10	Sem progresso no período

4.7. Setor de Relacionamento com o Cliente

SRC

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

março/2019 abril/2019 maio/2019

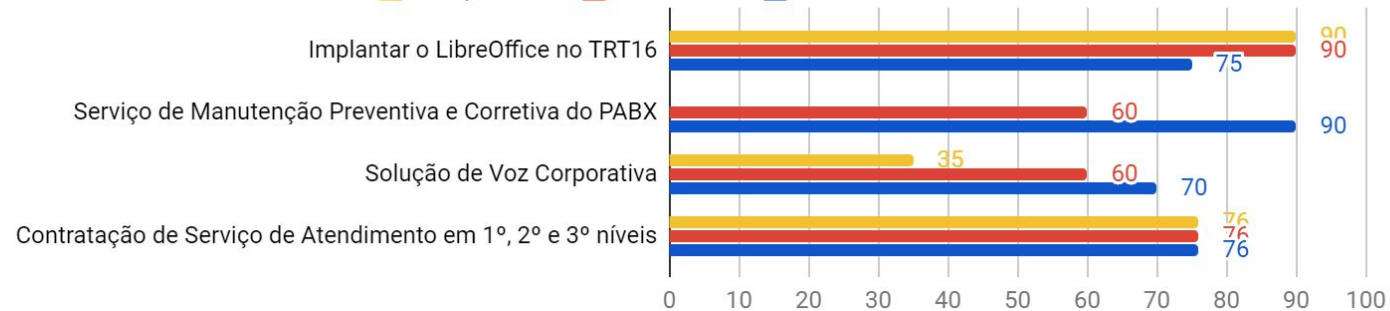

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	351	Implantar o LibreOffice no TRT16	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	25/06/2018	30/08/2019			75	Instalador do LibreOffice incluído nas máquinas do ponto em todas as VTs do Interior. Colocado em produção GPOs para 4 VT de interior. Realizado o ajuste no percentual de conclusão do projeto.
2	381	Solução de Voz Corporativa	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Contratação	27/08/2018	30/08/2019			70	Concluído o levantamento das especificações técnicas da solução, foram enviadas solicitações de propostas para empresas. Aguarda-se o retorno das empresas para concluir o ETP.

Relatório de Atividades da CTIC

Maio/2019


3	479	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do PABX	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Contratação	23/04/2019	01/07/2019	24/04/2019		90	ETP concluído recomendando um aditivo ao contrato vigente. Minuta do aditivo elaborado e verificado dotação orçamentária.
4	391	Contratação de Serviço de Atendimento em 1º, 2º e 3º níveis	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Suspenso	Contratação	19/09/2018	30/09/2019			76	Sem progresso no período. Priorização de outros projetos e atividades do setor.

4.8. Seção de Segurança da Informação

SSI

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

■ março/2019
 ■ abril/2019
 ■ maio/2019

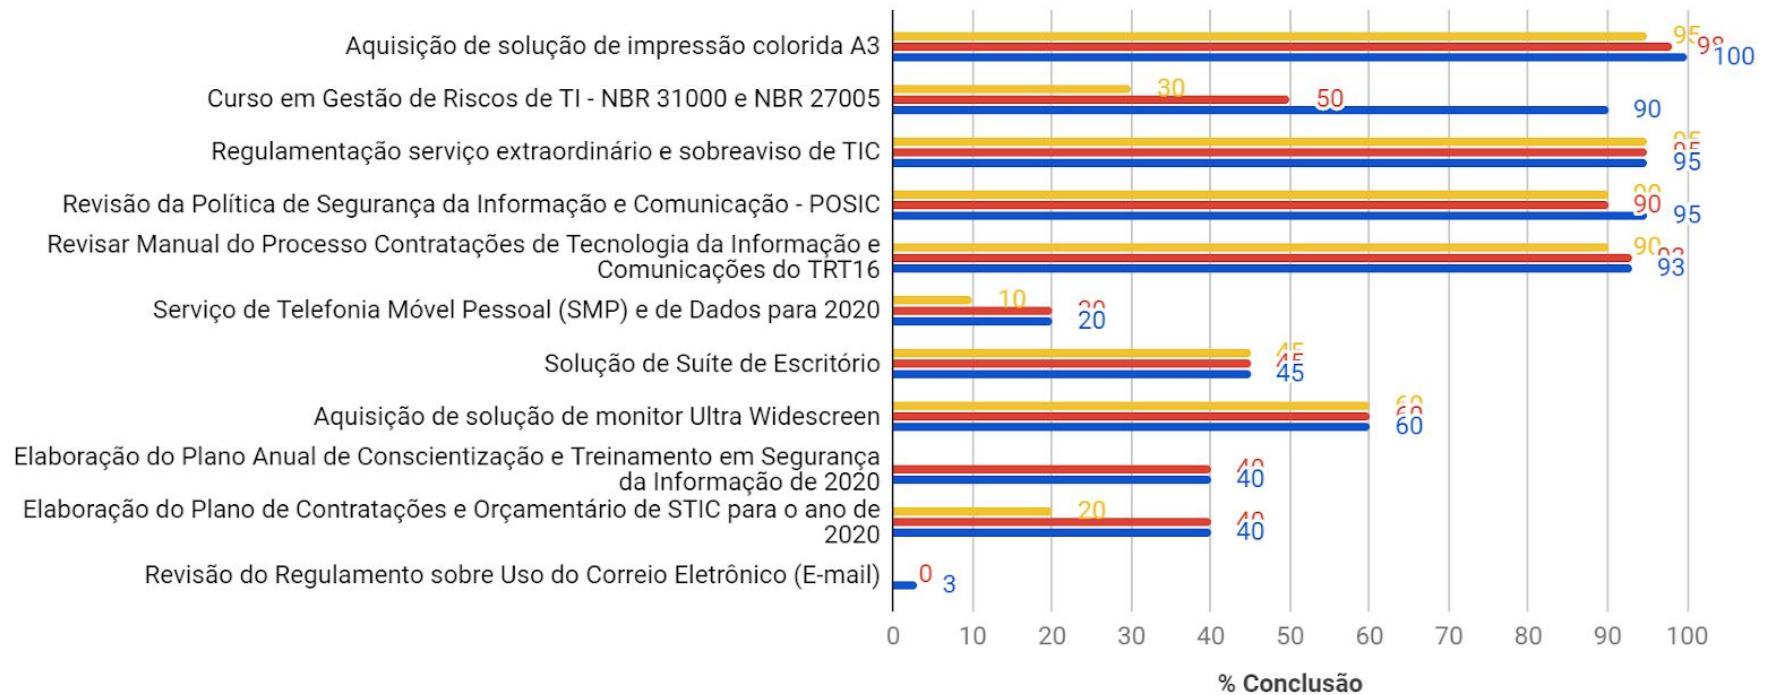

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
---	----	---------	--------------------	--------	------	-----------------	--------------	------------------	---------------	-------------	------------------

1	42	Aquisição de solução de impressão colorida A3	Stanley Araujo de Sousa	Concluído	Contratação	26/10/2017	31/05/2019	14/06/2018	21/05/2019	100	Projeto concluído.
2	39	Regulamentação serviço extraordinário e sobreaviso de TIC	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Ação	27/04/2018	28/06/2019			95	Minuta de regulamentação aprovada na 4ª Reunião do CGovTIC.
3	147	Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	09/05/2017	15/08/2019			93	Realizado ajustes no texto com sugestões da Diretoria-Geral.
4	168	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	28/06/2017	31/07/2019			95	Revisão da POSIC aprovada pela Presidência. Na Secretaria do Pleno para reunião administrativa.
5	450	Solução de Suíte de Escritório	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Contratação	21/11/2018	28/09/2019			45	Apresentado a solicitações de licenças pelas unidades do Tribunal na 4ª Reunião do CGovTIC. Recomendou-se consulta ao SOF sobre disponibilidade orçamentária.
6	457	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2020	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Contratação	22/01/2019	15/03/2019	15/03/2019		20	Apresentado as opções sobre o modelo de contrato na 4ª Reunião do CGovTIC. A decisão foi sobrestada.
7	472	Curso em Gestão de Riscos de TI - NBR 31000 e NBR 27005	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Ação	14/03/2019	21/06/2019	27/03/2019		90	Capacitação realizada no período de 27 a 31 de maio. Resta o pagamento e encerramento do projeto.

Relatório de Atividades da CTIC

Maio/2019

8	375	Aquisição de solução de monitor Ultra Widescreen	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Contratação	27/08/2018	31/08/2019			60	Sem progresso no período. Apenas melhorias no Termo de Referência por parte do CSJT.
9	454	Elaboração do Plano de Contratações e Orçamentário de STIC para o ano de 2020	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	04/01/2019	31/10/2019	04/01/2019		40	Sem progresso no período.
10	473	Elaboração do Plano Anual de Conscientização e Treinamento em Segurança da Informação de 2020	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	01/04/2019	24/09/2019	08/04/2019		40	Sem progresso no período;
11	475	Revisão do Regulamento sobre Uso do Correio Eletrônico (E-mail)	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	05/04/2019	30/09/2019			3	Sem progresso no período.
