



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 16ª REGIÃO

Relatório de Atividades da CTIC

Outubro/2019

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	REUNIÃO DOS COMITÊS DE TIC	3
3.	ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC	4
4.	PORTFÓLIO DE PROJETOS E AÇÕES DE TIC	5
4.1.	RESUMO DOS PROJETOS	6
4.1.1.	PROJETOS INCLUÍDOS NO PORTFÓLIO	7
4.1.2.	PROJETOS INICIADOS NO PERÍODO	7
4.1.3.	PROJETOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO	7
4.1.4.	PROJETOS CANCELADOS NO PERÍODO	8
4.2.	COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES	9
4.3.	SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	10
4.4.	SETOR DE GOVERNANÇA DE TI	13
4.5.	SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL	16
4.6.	SEÇÃO DE APOIO AO PJE	20
4.7.	SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE	22
4.8.	SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	24

1. Introdução

Este documento tem por objetivo apresentar as atividades realizadas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação e suas unidades subordinadas no mês de **Outubro de 2019**.

O relatório está estruturado pelos seguintes tópicos:

- Reunião dos comitês de TIC;
- Atendimento aos usuários de TIC;
- Portfólio de Projetos e Ações de TIC.




2. Reunião dos Comitês de TIC

No período de referência foram realizadas duas reuniões nos comitês relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação.

O **Comitê de Gestão de TIC** reuniu-se nos dias **03/10/2019** ([link para ata da reunião](#)) e **09/10/2019** ([link para ata da reunião](#)), tratando dos seguintes temas:

- Contratos de TIC;
- Serviço de monitoramento de 3º Nível;
- Relatório de transição da administração;
- Ações da Política de Gestão de Pessoas de TIC;
- Análise dos contratos de infraestrutura computacional;
- Gestão dos contratos.

3. Atendimento aos Usuários de TIC

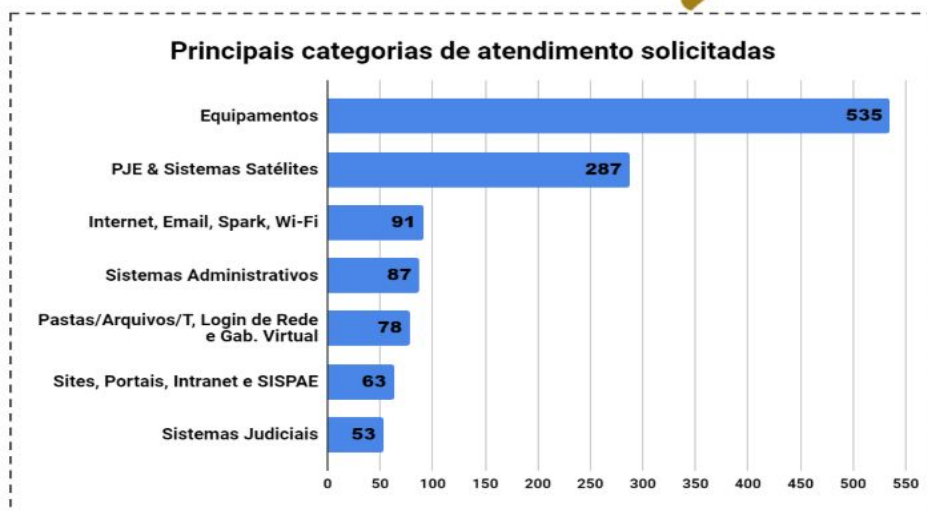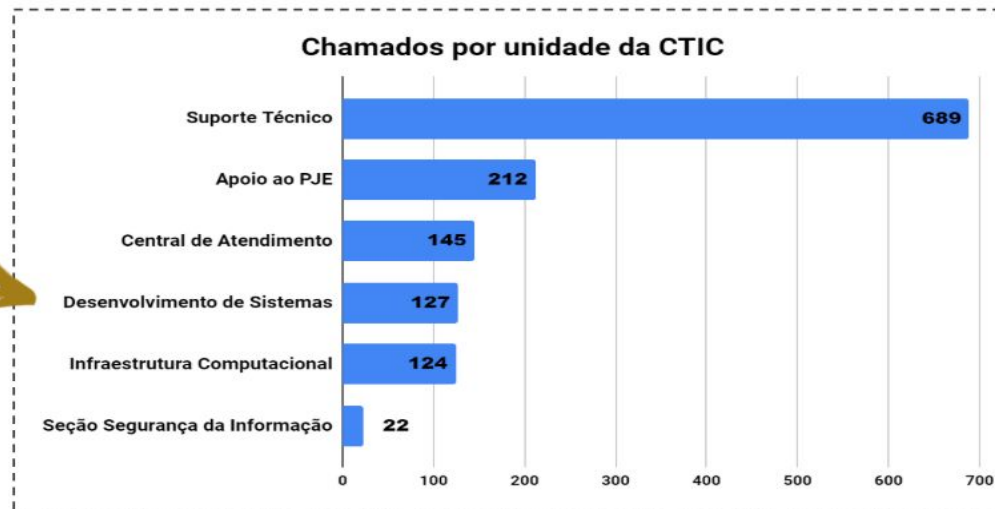

4. Portfólio de Projetos e Ações de TIC


Nesta seção são apresentadas as informações relativas aos projetos de TIC controlados pelo Escritório de Projetos de TIC.

Inicialmente, é exibida uma perspectiva geral dos projetos agrupados pela unidade na qual eles estão sendo gerenciados, e são listados os projetos iniciados, concluídos e cancelados no período.


Além do resumo do portfólio, para cada área de TIC são listados os projetos e suas respectivas evoluções no período de referência.

4.1. Resumo dos projetos


Quantidade de projetos nas unidades

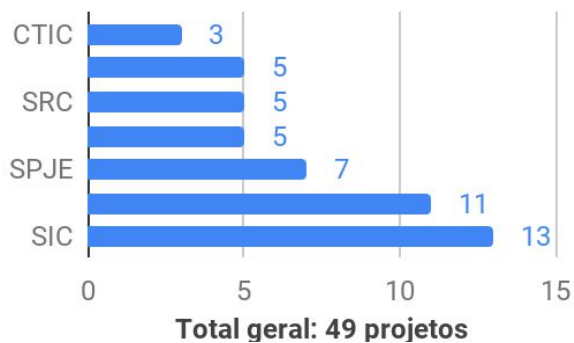

Complexidade dos projetos



Situação dos projetos

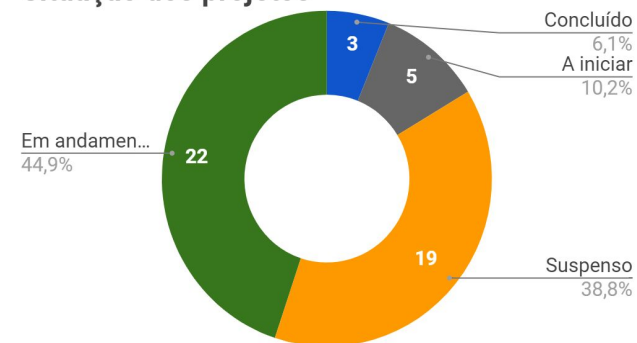

Situação dos projetos nas unidades



4.1.1. Projetos incluídos no portfólio

Id	Nome	Gerente do projeto	Unidade responsável	Tipo	Data da demanda	Início realizado	Fim realizado	Status
506	Implantação da Certidão Eletrônica de Ações Trabalhista	Gutemberg Pereira Vidal Santos	SPJE	Ação	27/09/2018	14/10/2019		Em andamento
507	Contratação de treinamento para Oracle 12c	Leonel Pereira	SIC	Ação	16/10/2019	16/10/2019		Em andamento
508	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC	Carlos Eduardo Ferreira Marins	SRC	Ação	17/10/2019	25/10/2019		Em andamento

4.1.2. Projetos iniciados no período

Id	Nome	Gerente do projeto	Unidade responsável	Tipo	Data da demanda	Início realizado	Fim realizado	Status
506	Implantação da Certidão Eletrônica de Ações Trabalhista	Gutemberg Pereira Vidal Santos	SPJE	Ação	27/09/2018	14/10/2019		Em andamento
507	Contratação de treinamento para Oracle 12c	Leonel Pereira	SIC	Ação	16/10/2019	16/10/2019		Em andamento
508	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC	Carlos Eduardo Ferreira Marins	SRC	Ação	17/10/2019	25/10/2019		Em andamento

4.1.3. Projetos concluídos no período


Id	Nome	Gerente do projeto	Unidade responsável	Tipo	Data da demanda	Início realizado	Fim realizado	Status
485	Suporte à Plataforma de Banco de Dados Oracle 2019	Leonel Pereira	SIC	Projeto	02/05/2019	17/05/2019	31/10/2019	Concluído
496	Treinamento para gerência de redes sem fio Aruba	Rodrigo Silveira Alexandre	SIC	Ação	25/07/2019	26/07/2019	31/10/2019	Concluído

501	Capacitação nas tecnologias Docker e Kubernetes	Gustavo Soares De Melo	SPJE	Ação	03/09/2019	05/09/2019	31/10/2019	Concluído
-----	---	------------------------	------	------	------------	------------	-------------------	------------------

4.1.4. Projetos cancelados no período

Id	Nome	Gerente do projeto	Unidade responsável	Tipo	Data da demanda	Início realizado	Fim realizado	Status	Justificativa
----	------	--------------------	---------------------	------	-----------------	------------------	---------------	--------	---------------


4.2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações

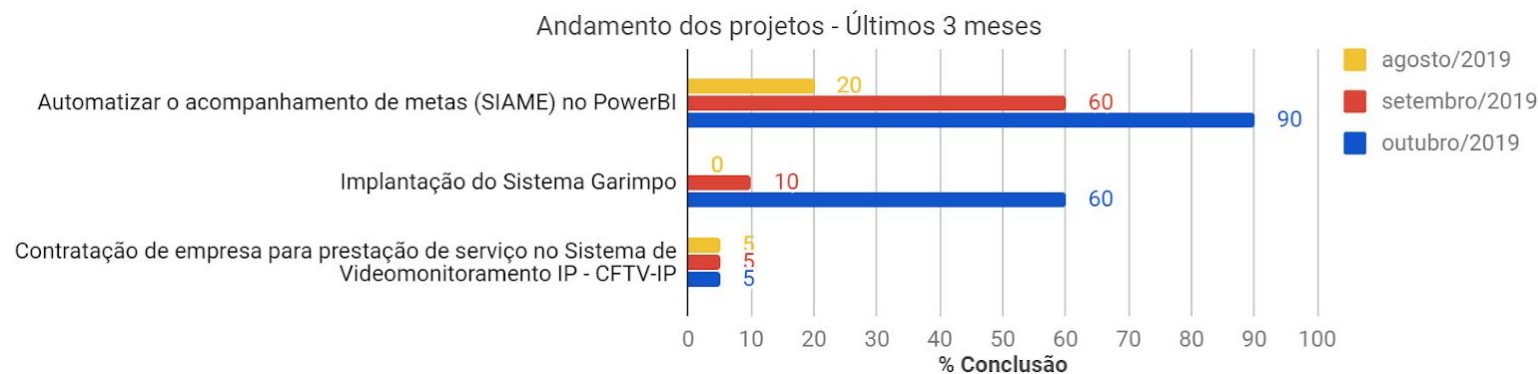

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	378	Automatizar o acompanhamento de metas (SIAME) no PowerBI	David Tedson Mendonca Ferreira	Em andamento	Ação	23/08/2018	19/12/2019			90	Conclusão de automatização de todas as metas, exceto a meta 7.
2	489	Implantação do Sistema Garimpo	David Tedson Mendonca Ferreira	Em andamento	Projeto	05/06/2019	19/12/2019			60	- Carga de dados, em homologação, dos arquivos do Banco do Brasil e CEF. - Criação de view para uso de consulta processual na aplicação. - Testes em ambiente de homologação.
3	246	Contratação de empresa para prestação de serviço no Sistema de Videomonitoramento IP - CFTV-IP	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Suspenso	Projeto	16/02/2018	31/10/2019			5	Sem progresso no período. Problema: Outras demandas priorizadas.

4.3. Setor de Desenvolvimento de Sistemas

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

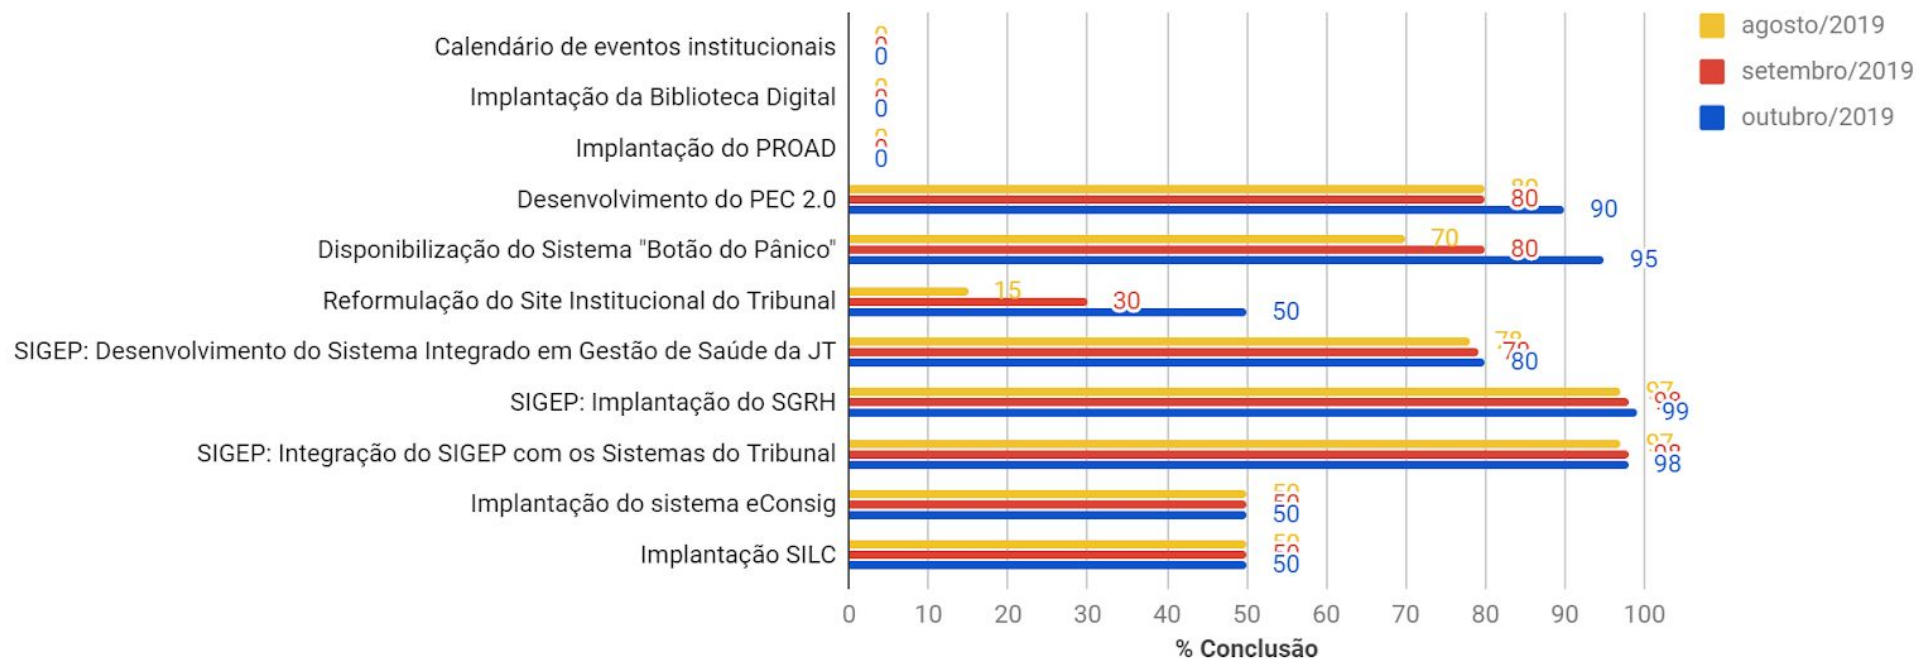


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	223	Calendário de eventos institucionais	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	06/12/2017	27/12/2019			0	TAP aprovado. Há previsão de recursos disponíveis para iniciar o projeto em novembro/2019.
2	279	Implantação da Biblioteca Digital	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	01/01/2018	18/12/2020			0	Sem progressos no período. Projeto previsto para execução em 2020 de acordo com o PDTIC 2019/2020.

3	499	Implantação do PROAD	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	28/02/2019	30/06/2020	28/08/2019		0	Sem progressos no período. Pendência: falta de recursos disponíveis para iniciar o projeto, equipe alocada nos demais projetos vigentes.
4	32	SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	24/05/2018	31/12/2019			98	Realizados ajustes relativos ao eGestão: alterados os scripts dos itens (trt2); tratados os objetos sem constraints que armazenam código de servidor do legado; Virada definitiva dos satélites prevista para após o fechamento da folha de novembro.
5	187	SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	Diogo Duailibe da Silva	Em andamento	Projeto	25/08/2017	01/12/2020			80	- Desenvolvimento de novas funcionalidades do NGS1; - Criação do protótipo de cadastro de Programas de Saúde; - Correção de Bugs.
6	277	SIGEP: Implantação do SGRH	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	01/01/2018	31/12/2020			99	Implantação do SGRH está concluída, pois o Módulo Principal e a FolhaWeb estão em ambiente de PRODUÇÃO, em utilização plena. Folha de Outubro/2019 foi paga pela FolhaWeb em produção (Sistemas legados continuarão em paralelo apenas por segurança até dezembro/2019); Resolução de 37 chamados de incidentes (via Assyst), sendo 28 de SGRH e 09 de FolhaWeb; Pendente do encerramento formal do projeto.
7	280	Reformulação do Site Institucional do Tribunal	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	01/01/2018	27/12/2019	29/05/2019		50	Evolução nos entregáveis 3 e 4. Entregável 1 - Mapeamento de Conteúdo e Configurações Iniciais: Fechada 100% Entregável 2 - Desenvolvimento do Template da Página Inicial: Fechada 100% Entregável 3 - Criação e configuração das áreas de publicação: Fechada, de 90% para 100% Entregável 4 - Migração do conteúdo estático do site: Fechada, de 90% para 100% Entregável 5 - Migração do conteúdo dinâmico do site: Em andamento, de 0% para 80%

											Entregável 6 - Definição dos setores responsáveis pela publicação dos conteúdos do site: Em andamento, de 0% para 50% Entregável 7 - Treinamento dos setores responsáveis pela publicação dos conteúdos do site: Nova 0% Entregável 8 - Homologação do Novo Portal Institucional: Nova 0%
8	354	Desenvolvimento do PEC 2.0	Ronny Paterson Cruz da Silva	Em andamento	Projeto	03/07/2018	24/01/2020			90	Evolução nos entregáveis: Entregável 01 - Cadastro de Atos Agrupados e Exibição de Participantes do Processo 95% Entregável 02 - Cadastro de Destinatários, Outros destinatários e Signatários de Expedientes e Comunicações 90% Entregável 03 - PEC Fora do Fluxo e Impressão de Expedientes e Comunicações Físicos 95% Entregável 04 - Cadastro de Endereços em Expedientes e Comunicações 90% Entregável 05 - Integração com o GIM 74% Entregável 06 - Finalização de Expedientes e Comunicações 90%
9	446	Disponibilização do Sistema "Botão do Pânico"	Darlon José Coqueiro	Em andamento	Projeto	13/11/2018	30/11/2019			95	Realizada reunião de apresentação do Sistema de Botão do Pânico com o demandante (Setor de Segurança e Inteligência Institucional). Foi apresentado o tanto a parte desktop quanto a parte web. O funcionamento do sistema foi aprovado pelo setor demandante.
10	19	Implantação SILC	Andre Pereira Nunes	Suspenso	Projeto	06/02/2018	31/07/2020			50	Sem progressos no período. Projeto postergado para execução em 2020 conforme PDTIC.
11	224	Implantação do sistema eConsig	Andre Pereira Nunes	Suspenso	Projeto	06/12/2017	31/10/2019			50	Sem progresso no período.

4.4. Setor de Governança de TI

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

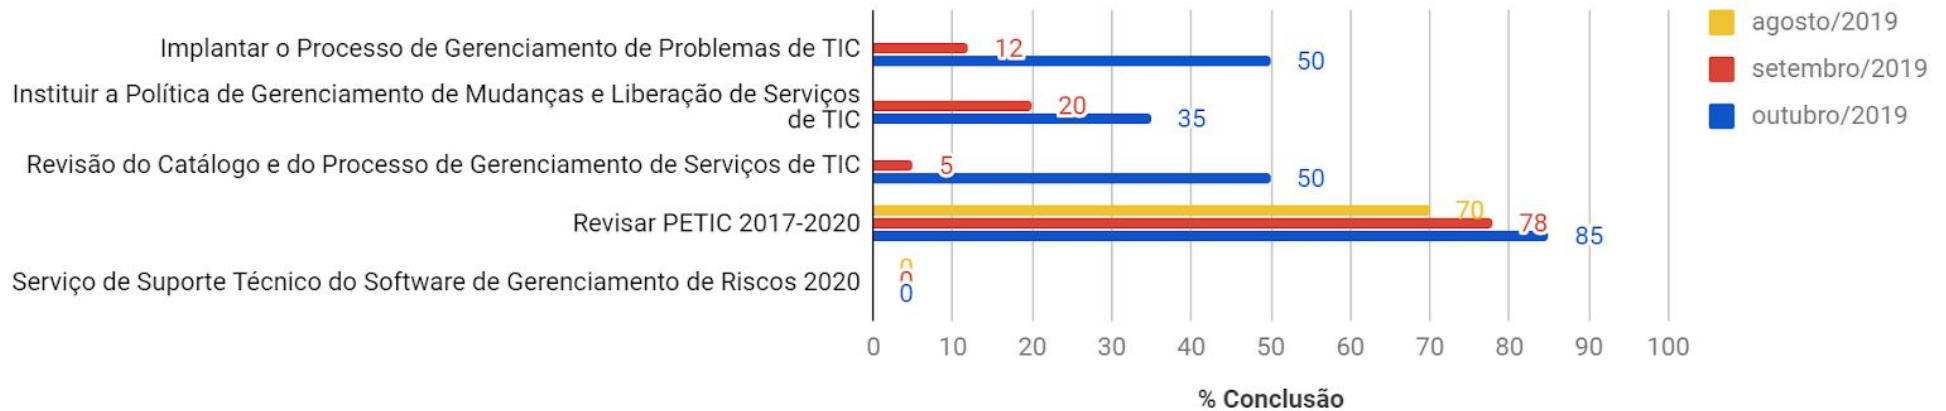


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	486	Revisar PETIC 2017-2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Ação	13/05/2019	19/12/2019	14/05/2019		85	- Minuta de revisão do PETIC encontra-se na Secretaria do Pleno para apreciação. A previsão é que no final de novembro a matéria seja pautada. - Elaboração do relatório de análise dos indicadores referentes aos anos de 2017 e 2018- Em andamento - De 40% para 70%.
2	502	Revisão do Catálogo e do Processo de Gerenciamento de Serviços de TIC	Jose Augusto	Em andamento	Ação	09/09/2019	29/11/2019	30/09/2019		50	Evolução nos entregáveis: - Entregável 1. Elaboração da Minuta do Catálogo de Serviços de TIC; Em andamento; De 30% para 90% - Entregável 2. Elaboração da Minuta do Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC; Em andamento; De 0% para 50%

											<ul style="list-style-type: none"> -Entregável 3. Portaria da Política de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC; Nova; 0% - Entregável 4. Deliberação pelo CGovTIC da Política, do Processo e do Catálogo; Nova; 0% - Entregável 5. Publicação pela Presidência da Política e do Catálogo; Nova; 0% - Entregável 6. Publicação pela CTIC da Política e Processo de gerenciamento do catálogo; Nova; 0%
3	503	Instituir a Política de Gerenciamento de Mudanças e Liberação de Serviços de TIC	Maickel Roberto Neitzke	Em andamento	Ação	09/09/2019	13/12/2019	10/09/2019		35	<p>Evolução nos entregáveis do projeto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fluxo do Gerenciamento de Mudança e Liberação de Serviços de TIC Em andamento de 60% para 90% 2. Implantação do Processo na ferramenta Assyst Em andamento de 30% para 50% 3. Processo de Gerenciamento de Mudança e Liberação de Serviços de TIC Em andamento 10% 4. Política de Gerenciamento de Mudança e Liberação de Serviços de TIC Nova 0% 5. Deliberação pelo CGovTIC da Política Nova 0% 6. Publicação pela Presidência da Política Nova 0% 7. Política e Processo distribuído para a CTIC Nova 0%
4	505	Implantar o Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Ação	17/09/2019	20/12/2019	30/09/2019		50	<p>Evolução nos entregáveis:</p> <p>Entregável 1. Fluxo do Gerenciamento de Problemas de TIC Em andamento - De 60% para 90%</p> <p>Entregável 2. Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC Em andamento - De 0% para 80%</p>

											<p>Entregável 3. Política de Gerenciamento de Problemas de TIC Em andamento - De 0% para 90%</p> <p>Entregável 4. Implantação do Processo na ferramenta Assyst Em andamento - De 0% para 20%</p> <p>Entregável 5. Deliberação pelo CGovTIC da Política Nova 0%</p> <p>Entregável 6. Publicação pela Presidência da Política Nova 0%</p> <p>Entregável 7. Política e Processo distribuído para a CTIC Nova 0%</p>
5	483	Serviço de Suporte Técnico do Software de Gerenciamento de Riscos 2020	Jose Augusto	Suspensão	Projeto	25/04/2019	31/12/2019			0	Sem progresso no período. Aguardando decisão da Coordenação da CTIC.

4.5. Setor de Infraestrutura Computacional

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

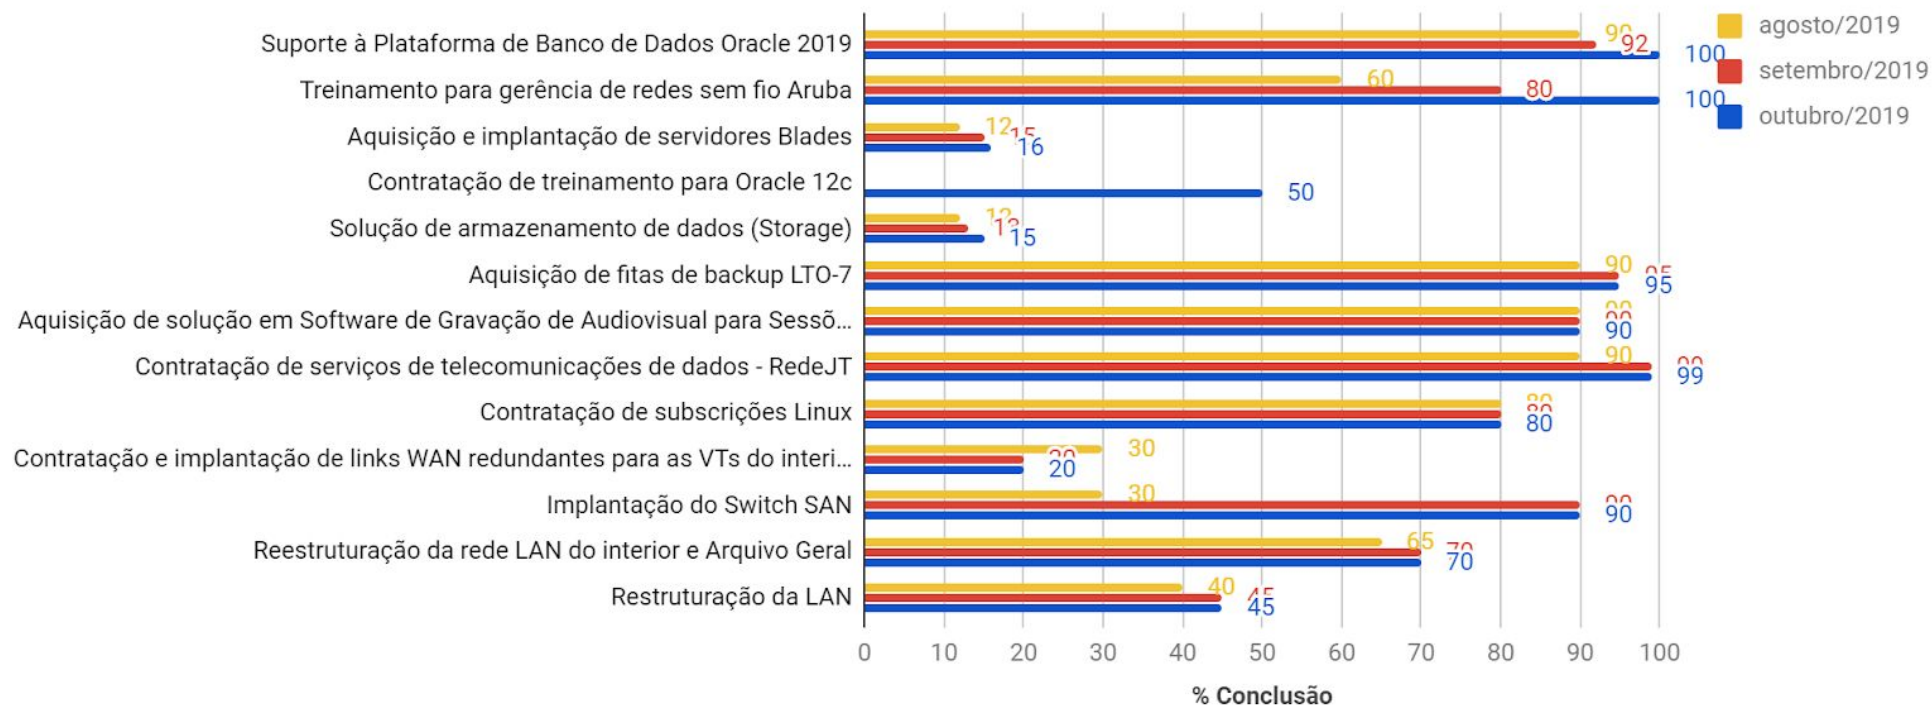

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	485	Suporte à Plataforma de Banco de Dados Oracle 2019	Leonel Pereira	Concluído	Projeto	02/05/2019	27/10/2019	17/05/2019	31/10/2019	100	Elaborada assinada pelas partes o 4º Termo Aditivo ao Contrato 16/2016. Projeto concluído.
2	496	Treinamento para gerência de redes sem fio Aruba	Rodrigo Silveira Alexandre	Concluído	Ação	25/07/2019	18/10/2019	26/07/2019	31/10/2019	100	Treinamento realizado com a presença de dois servidores do Apoio de Infraestrutura


											computacional, assim como foi realizado o pagamento.
3	455	Aquisição e implantação de servidores Blades	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	Projeto	15/01/2019	31/12/2019	31/01/2019		16	<ul style="list-style-type: none"> - Anulado o empenho 2019NE000884 pela S.O.F emitido em favor da empresa ZOOM TECNOLOGIA LTDA, devido a assinatura do termo de rescisão do contrato nº 20/2019; - Reconhecimento do recebimento provisório e definitivo referente à aquisição e instalação de racks de 19pol, decorrente do Contrato TRT16 nº 21/2019; - Atesto de nota fiscal nº 2.945, no valor bruto integral de R\$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais) referente à aquisição e instalação de racks de 19pol, decorrente do Contrato TRT16 nº 21/2019; - Efetuado o pagamento da nota fiscal nº 2.945 do Contrato TRT16 nº 21/2019; <p>Riscos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uma nova aquisição foi iniciada por meio do PA 6051/2019, a Contratada pode atrasar a entrega do equipamento; - A migração do ambiente virtualizado deverá ser planejada a partir da entrega do equipamento, respeitando a disponibilidade dos recursos humanos;
4	490	Solução de armazenamento de dados (Storage)	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	Projeto	18/06/2019	31/12/2019	18/06/2019		15	<ul style="list-style-type: none"> - Notas de empenho emitidas: 2019NE001314 e 2019NE001315; - Minuta do contrato elaborada pela SADM e remetida, aprovada pelo SAJ com adequações sugeridas pela DG; - O Contrato nº 32/2019 foi assinado pela Desembargadora Presidente; <p>Riscos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Devido à falta de recursos de armazenamento, a prestação de novos serviços poderá ficar prejudicada;

											- A ausência futura do recurso de armazenamento (storage) poderá ocasionar em indisponibilidade dos serviços de TI nos Tribunais
5	507	Contratação de treinamento para Oracle 12c	Leonel Pereira	Em andamento	Ação	16/10/2019	30/11/2019	16/10/2019		50	Realização do Estudo Técnico Preliminar e acompanhamento do processo de contratação.
6	233	Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT	Danilo Augusto Alves Leite	Suspensão	Projeto	12/01/2018	31/12/2020	19/01/2018		99	Sem reporte do gerente de projeto. (EGP-TIC)
7	358	Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno	Pablo Teofilo Durans	Suspensão	Projeto	06/07/2018	16/12/2019	22/10/2018		90	Sem reporte do gerente de projeto. (EGP-TIC)
8	442	Reestruturação da LAN	Danilo Augusto Alves Leite	Suspensão	Projeto	17/10/2018	31/12/2019			45	Sem reporte do gerente de projeto. (EGP-TIC)
9	460	Aquisição de fitas de backup LTO-7	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspensão	Projeto	29/01/2019	30/11/2019	30/01/2019		95	Sem progresso no período. O fornecedor das fitas LTO solicitou a prorrogação do prazo de entrega até o dia 19/11/2019.
10	461	Contratação de subscrições Linux	Fernando Rola Ferreira Filho	Suspensão	Projeto	29/01/2019	06/12/2019	30/01/2019		80	Sem progresso no período. Pendência: realização do pregão organizado pelo TRT5.
11	476	Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo Geral	Antoniél Magalhaes de Carvalho	Suspensão	Projeto	01/04/2019	31/10/2019	16/04/2019		70	Sem reporte do gerente de projeto. (EGP-TIC)
12	480	Contratação e implantação de links WAN redundantes para as VTs do interior	Danilo Augusto Alves Leite	Suspensão	Projeto	15/04/2019	31/12/2020	08/03/2019		20	Sem reporte do gerente de projeto. (EGP-TIC)

13	493	Implantação do Switch SAN	Danilo Augusto Alves Leite	Suspenso	Ação	02/07/2019	30/10/2019			90	Sem reporte do gerente de projeto. (EGP-TIC)
----	-----	---------------------------	----------------------------	----------	------	------------	------------	--	--	----	--

4.6. Seção de Apoio ao PJe

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

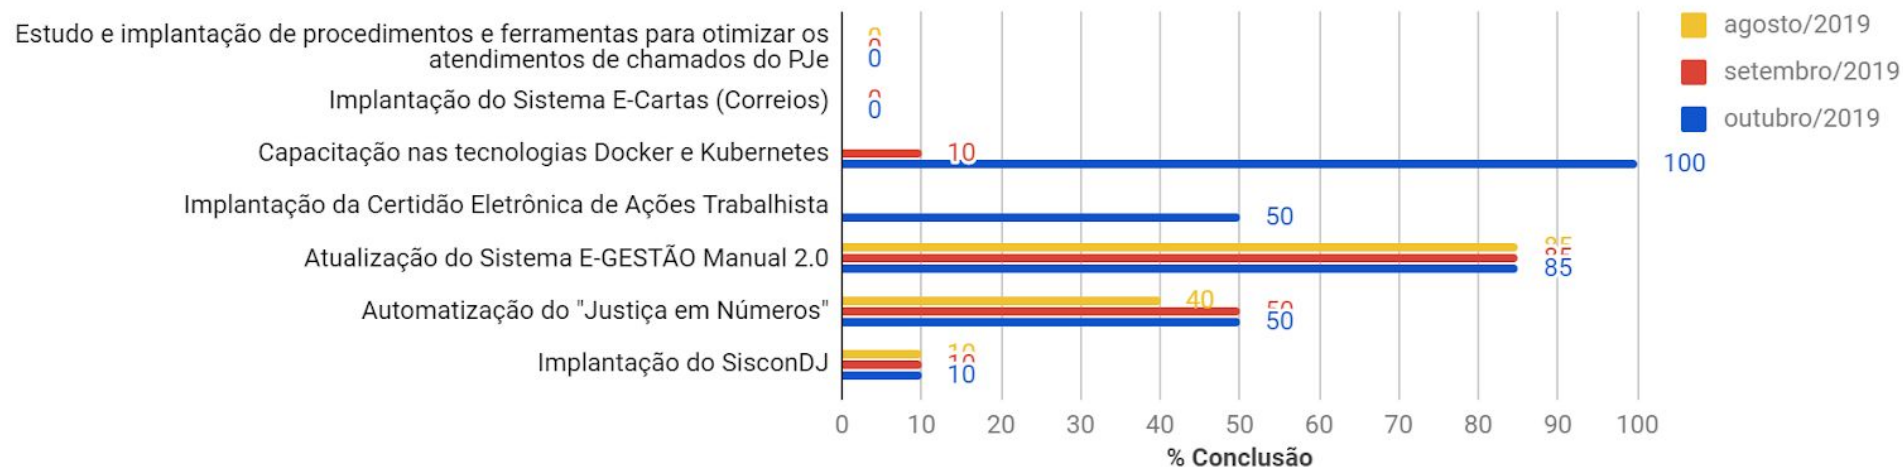


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	492	Estudo e implantação de procedimentos e ferramentas para otimizar os atendimentos de chamados do PJe	Gilberto Cunha Filho	A iniciar	Projeto	18/06/2019	30/12/2019			0	Sem progresso no período. Projeto não iniciado.
2	504	Implantação do Sistema E-Cartas (Correios)	Gutemberg Pereira Vidal Santos	A iniciar	Ação	10/09/2019	02/03/2020			0	Projeto não iniciado. Problema: acúmulo de funções de atividades no setor de Apoio ao PJe.
3	501	Capacitação nas tecnologias Docker e Kubernetes	Gustavo Soares De Melo	Concluído	Ação	03/09/2019	31/10/2019	05/09/2019	31/10/2019	100	Foi realizado treinamento nas tecnologias Docker e Kubernetes, durante os dias 10 e 11 de outubro de 2019 na sede do TST, conforme planejado anteriormente.

4	506	Implantação da Certidão Eletrônica de Ações Trabalhista	Gutemberg Pereira Vidal Santos	Em andamento	Ação	27/09/2018	30/12/2019	14/10/2019		50	- Ajustes na aplicação para a realidade local, para consulta a processos do PJe; - Desabilitando consulta a processos legados do TRT 3; - Implantação em máquina local para teste do sistema;
5	56	Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0	Djeison Rafael Neitzke	Suspense	Projeto	06/04/2018	19/12/2019			85	Sem progresso no período.
6	477	Implantação do SisconDJ	Gilberto Cunha Filho	Suspense	Ação	05/12/2018	30/12/2019			10	Sem progresso no período. Pendência de recursos humanos da SIC. Risco efetivado: perda do prazo de suporte com a equipe do BB;
7	481	Automatização do "Justiça em Números"	Djeison Rafael Neitzke	Suspense	Ação	23/04/2019	19/12/2019	19/06/2019		50	Sem progresso no período.

4.7. Setor de Relacionamento com o Cliente


Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

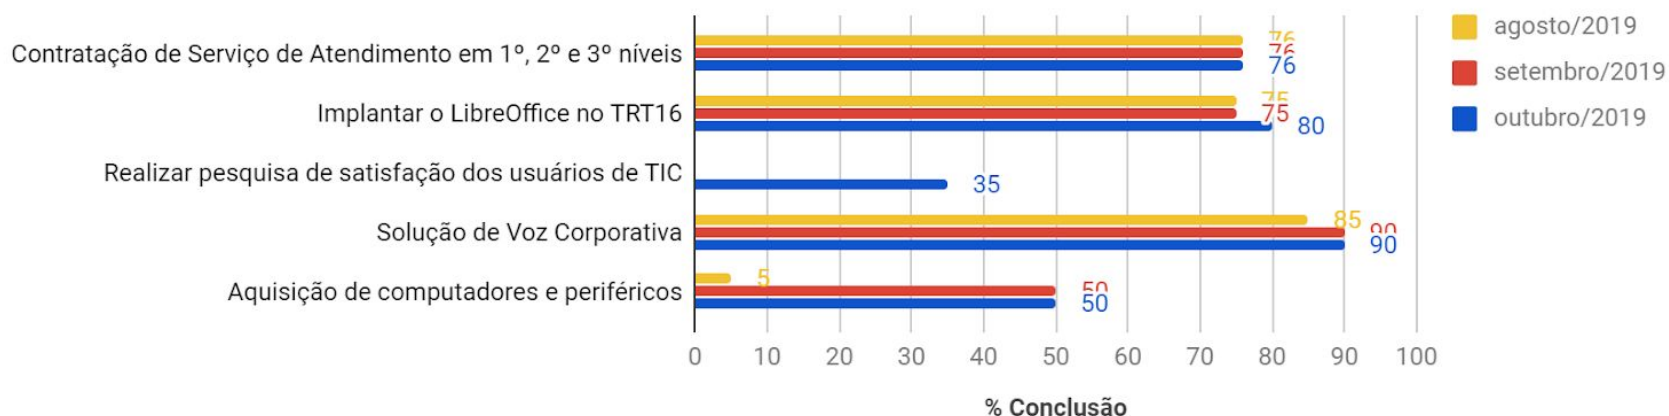

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	351	Implantar o LibreOffice no TRT16	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	25/06/2018	31/01/2020			80	Continuação da instalação do LibreOffice no interior; Reavaliação de GPO's em algumas localidades devido a não instalação; 1 e 2 V.T. de Imperatriz, V.T. São João dos Patos; As GPO's de Bacabal e Pedreiras, apresentaram um singelo progresso, entretanto se faz necessário analisar a baixa taxa de instalação nessas V.T.'s; Estatística Localidades Porcentual Instalado 1 VT de Imperatriz 80,00% 2 VT de Imperatriz 65,00% Distribuição do FMAMR 100,00% VT de Acailandia 93,33% VT de Bacabal 11,76% VT de Balsas 81,25% VT de Barra do Corda 66,67% VT de Barreirinhas 70,59% VT de Caxias 100,00% VT de

											Chapadina 62,50%VT de Estreito 88,24%VT de Pedreiras 26,67%VT de Pinheiro 88,24%VT de Presidente Dutra 75,00%VT de Santa Ines 87,50%VT de Sao Joao dos Patos 62,50%VT de Timon 87,50%
2	381	Solução de Voz Corporativa	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	27/08/2018	19/12/2019			90	- Em fase de Julgamento das Propostas após a realização da licitação. Riscos: - Risco de impugnação da licitação. - Riscos associados ao eventual não pagamento dos equipamentos e serviços em 2019, gerando restos a pagar para 2020.
3	391	Contratação de Serviço de Atendimento em 1º, 2º e 3º níveis	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	19/09/2018	20/12/2019			76	-Alterado o escopo do projeto com a inclusão do 3º nível de atendimento com um dos objetos da contratação. -Reiniciado o processo com a abertura de novo DOD.
4	508	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Ação	17/10/2019	06/01/2020	25/10/2019		35	Entregável 1. Formulário de Pesquisa / Em andamento - 70% Entregável 2. Divulgação da Pesquisa / Em andamento - 80% Entregável 3. Pesquisa aplicada / Nova 0% Entregável 4. Relatório elaborado e publicado / Nova 0%
5	500	Aquisição de computadores e periféricos	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Suspensão	Projeto	05/08/2019	31/01/2020	05/08/2019		50	Sem progresso no período. Aguardando definição orçamentária e de oportunidade para a aquisição dos microcomputadores.

4.8. Seção de Segurança da Informação

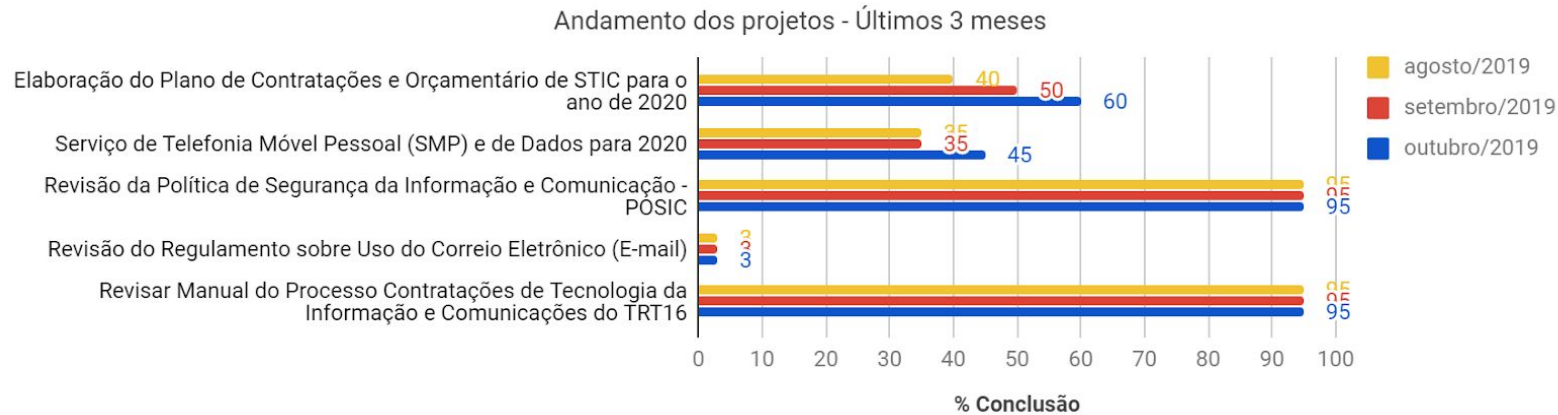

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	454	Elaboração do Plano de Contratações e Orçamentário de STIC para o ano de 2020	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	04/01/2019	15/11/2019	04/01/2019		60	Finalizada a minuta do plano.
2	457	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2020	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	22/01/2019	16/03/2020	15/03/2019		45	Evolução na elaboração do ETP e TR.
3	147	Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	09/05/2017	20/12/2019			95	Sem progresso no período. Pedido de vista regimental pela Desembargadora Ilka Esdra Silva Araújo.
4	168	Revisão da Política de Segurança da	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	28/06/2017	20/12/2019			95	Sem progresso no período. Pedido de vista regimental pelos Desembargadores James

		Informação e Comunicação - POSIC									Magno Araújo Farias e Ilka Esdra Silva Araújo.
5	475	Revisão do Regulamento sobre Uso do Correio Eletrônico (E-mail)	Stanley Araujo de Sousa	Suspense	Projeto	05/04/2019	27/12/2019			3	Sem progresso no período. Problema: Alocação dos recursos humanos para outras demandas mais prioritárias.
