



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 16ª REGIÃO

Relatório de Atividades da CTIC

Novembro/2019

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	REUNIÃO DOS COMITÊS DE TIC	3
3.	ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC	4
4.	PORTFÓLIO DE PROJETOS E AÇÕES DE TIC	5
4.1.	RESUMO DOS PROJETOS	6
4.1.1.	PROJETOS INCLUÍDOS NO PORTFÓLIO	7
4.1.2.	PROJETOS INICIADOS NO PERÍODO	7
4.1.3.	PROJETOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO	7
4.2.	COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES	8
4.3.	SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	9
4.4.	SETOR DE GOVERNANÇA DE TI	12
4.5.	SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL	15
4.6.	SEÇÃO DE APOIO AO PJE	18
4.7.	SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE	20
4.8.	SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	22

1. Introdução

Este documento tem por objetivo apresentar as atividades realizadas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação e suas unidades subordinadas no mês de **Novembro de 2019**.

O relatório está estruturado pelos seguintes tópicos:

- Reunião dos comitês de TIC;
- Atendimento aos usuários de TIC;
- Portfólio de Projetos e Ações de TIC.

2. Reunião dos Comitês de TIC

No período de referência foram realizadas duas reuniões nos comitês relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação.




○ **Comitê de Governança de TIC** reuniu-se nos dias **08/11/2019** ([link para ata da reunião](#)), tratando dos seguintes temas:

- Acompanhamento do Orçamento de TIC 2019;
- Plano Orçamentário de TIC 2020;
- Política de Gerenciamento de Problemas de TIC;
- Política de Gerenciamento de Catálogo de TIC;
- Resultado do iGovTIC-JUD 2019;
- Portfólio de Projeto de TIC.

○ **Comitê de Gestão de TIC** reuniu-se nos dias **27/11/2019** ([link para ata da reunião](#)), tratando do seguinte tema:

- Acompanhamento do PAC 2019.

3. Atendimento aos Usuários de TIC

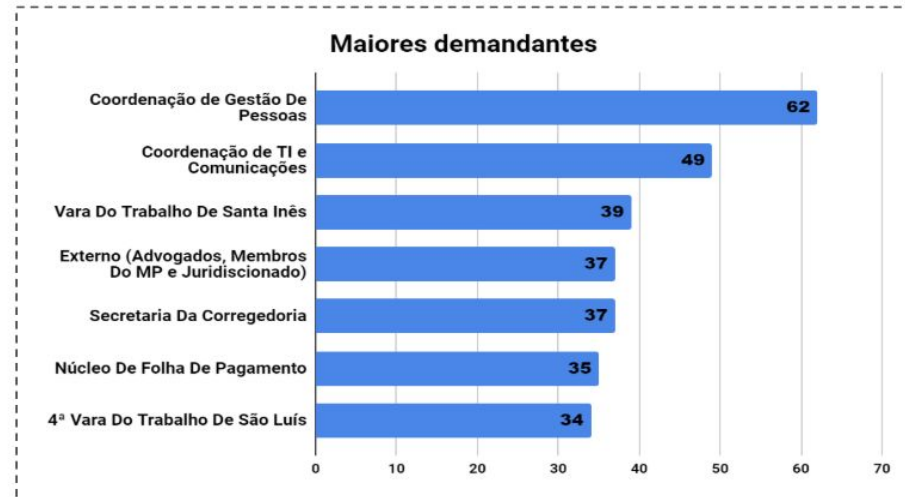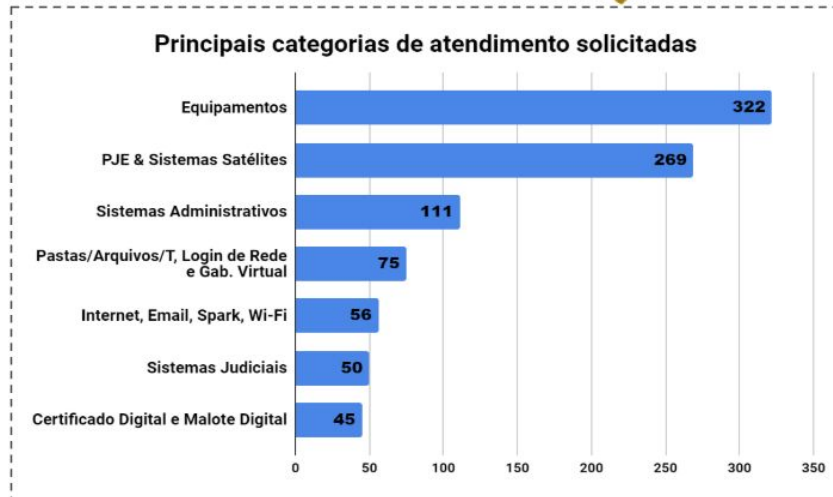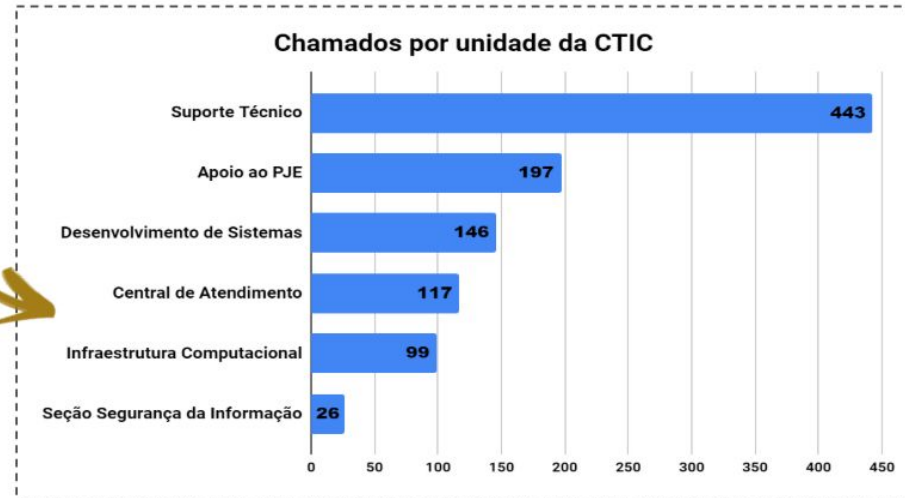

4. Portfólio de Projetos e Ações de TIC

Nesta seção são apresentadas as informações relativas aos projetos de TIC controlados pelo Escritório de Projetos de TIC.

Inicialmente, é exibida uma perspectiva geral dos projetos agrupados pela unidade na qual eles estão sendo gerenciados, e são listados os projetos iniciados, concluídos e cancelados no período.


Além do resumo do portfólio, para cada área de TIC são listados os projetos e suas respectivas evoluções no período de referência.

4.1. Resumo dos projetos


Quantidade de projetos nas unidades



Complexidade dos projetos

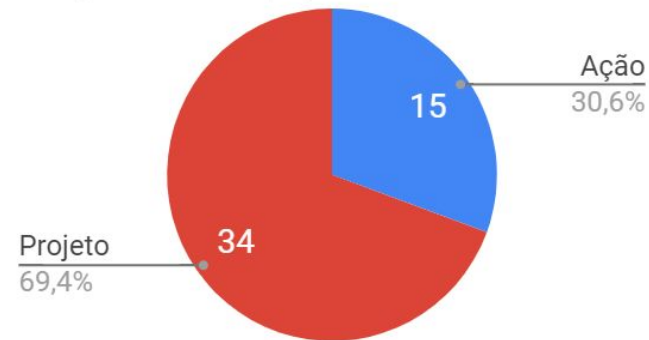

Situação dos projetos

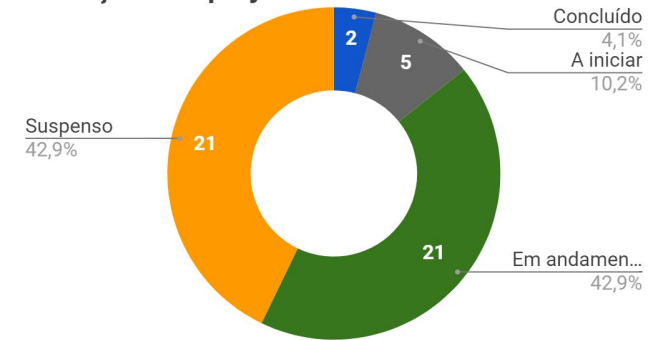

Situação dos projetos nas unidades



4.1.1. Projetos incluídos no portfólio

Id	Nome	Gerente do projeto	Unidade responsável	Tipo	Data da demanda	Início realizado	Fim realizado	Status
509	Revisar PDTIC 2019/2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	SGTI	Ação	14/11/2019	14/11/2019		Em andamento
510	Elaboração do Plano Anual de Capacitação 2020	Jose Augusto	SGTI	Ação	23/10/2019	25/11/2019		Em andamento
511	Contratação de treinamento em VMWare	Rodrigo Silveira Alexandre	SIC	Ação	27/11/2019	27/11/2019		Em andamento


4.1.2. Projetos iniciados no período

Id	Nome	Gerente do projeto	Unidade responsável	Tipo	Data da demanda	Início realizado	Fim realizado	Status
509	Revisar PDTIC 2019/2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	SGTI	Ação	14/11/2019	14/11/2019		Em andamento
510	Elaboração do Plano Anual de Capacitação 2020	Jose Augusto	SGTI	Ação	23/10/2019	25/11/2019		Em andamento
511	Contratação de treinamento em VMWare	Rodrigo Silveira Alexandre	SIC	Ação	27/11/2019	27/11/2019		Em andamento

4.1.3. Projetos concluídos no período

Id	Nome	Gerente do projeto	Unidade responsável	Tipo	Data da demanda	Início realizado	Fim realizado	Status
454	Elaboração do Plano de Contratações e Orçamentário de STIC para o ano de 2020	Stanley Araujo de Sousa	SSI	Projeto	04/01/2019	04/01/2019	29/11/2019	Concluído
505	Implantar o Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	SGTI	Ação	17/09/2019	30/09/2019	28/11/2019	Concluído


4.2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações

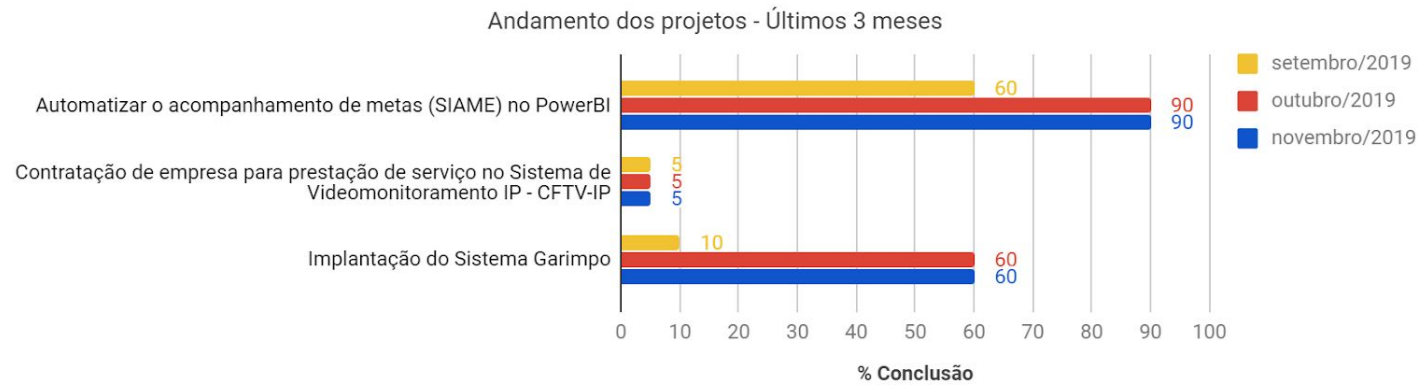

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	246	Contratação de empresa para prestação de serviço no Sistema de Videomonitoramento IP - CFTV-IP	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Suspense	Projeto	16/02/2018	31/10/2019			5	Sem progresso no período.
2	378	Automatizar o acompanhamento de metas (SIAME) no PowerBI	David Tedson Mendonca Ferreira	Suspense	Ação	23/08/2018	19/12/2019			90	Sem progresso no período.
3	489	Implantação do Sistema Garimpo	David Tedson Mendonca Ferreira	Suspense	Projeto	05/06/2019	19/12/2019			60	Sem progresso no período. Aguardando treinamento negocial que acontecerá no dia 04/12/2019.

4.3. Setor de Desenvolvimento de Sistemas

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

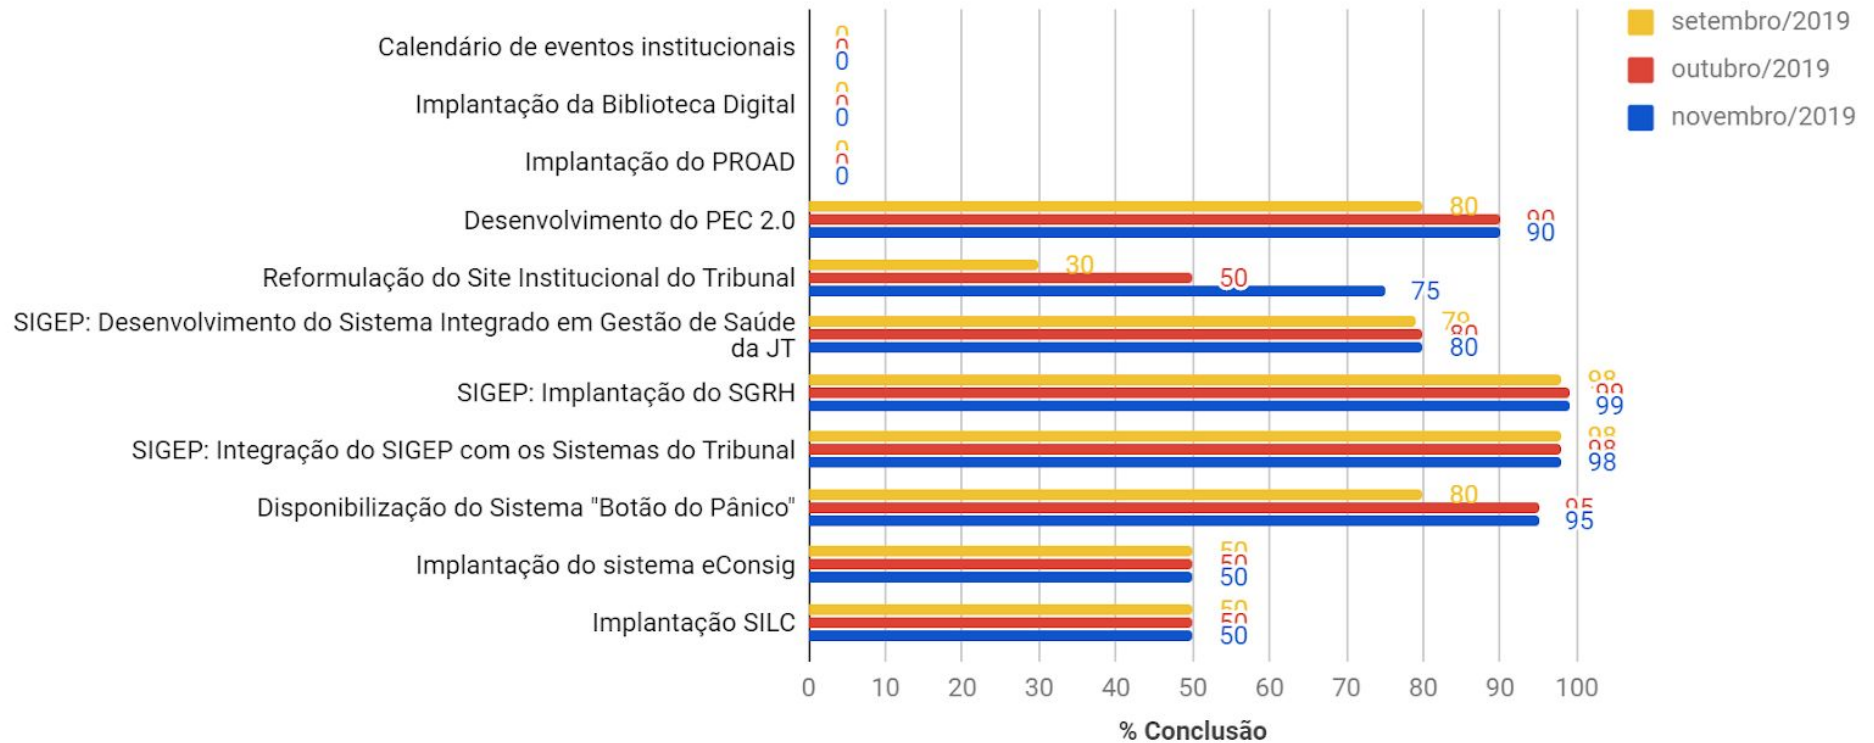


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	223	Calendário de eventos institucionais	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	06/12/2017	27/12/2019			0	Sem progresso no período. Previsão para iniciar em Dezembro.

2	279	Implantação da Biblioteca Digital	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	01/01/2018	18/12/2020			0	Sem progressos no período. Projeto previsto para execução em 2020 de acordo com o PDTIC 2019/2020.
3	499	Implantação do PROAD	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	28/02/2019	30/06/2020	28/08/2019		0	Sem progressos no período. Pendência: falta de recursos disponíveis para iniciar o projeto, equipe alocada nos demais projetos vigentes.
4	32	SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	24/05/2018	31/12/2019			98	Realizados ajustes relativos ao eGestão: - Foi criada nova procedure de atualização de pessoas baseada no pentaho enviado pelo TRT2 para buscar dados do SGRH; - Data de virada dos satélites prevista para 9 de dezembro de 2019:
5	187	SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	Diogo Duailibe da Silva	Em andamento	Projeto	25/08/2017	01/12/2020			80	- Resolução de Bugs; - Ajuste de funcionalidades já implementadas; - Continuação da criação dos protótipos dos Programas de Saúde.
6	277	SIGEP: Implantação do SGRH	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	01/01/2018	31/12/2019			99	- Sistemas legados continuam em paralelo apenas por segurança até dezembro/2019; - Resolução de 60 chamados de incidentes (via Assyst), sendo 29 de SGRH e 31 de FolhaWeb; - Projeto pendente apenas da tarefa de instalação do conector do eSocial (https://redmine.trt16.jus.br/issues/2888)
7	280	Reformulação do Site Institucional do Tribunal	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	01/01/2018	27/12/2019	29/05/2019		75	Conclusão dos entregáveis 5 e 6, e evolução no entregável 7. Entregável 1 - Mapeamento de Conteúdo e Configurações Iniciais: Fechada 100% Entregável 2 - Desenvolvimento do Template da Página Inicial: Fechada 100% Entregável 3 - Criação e configuração das áreas de publicação: Fechada, de 90% para 100% Entregável 4 - Migração do conteúdo estático do site: Fechada, de 90% para 100% Entregável 5 - Migração do conteúdo dinâmico do site: Fechada, de 80% para 100%

											Entregável 6 - Definição dos setores responsáveis pela publicação dos conteúdos do site: Fechada, de 50% para 100% Entregável 7 - Treinamento dos setores responsáveis pela publicação dos conteúdos do site: Em andamento 30% Entregável 8 - Homologação do Novo Portal Institucional: Nova 0%
8	354	Desenvolvimento do PEC 2.0	Ronny Paterson Cruz da Silva	Em andamento	Projeto	03/07/2018	24/01/2020			90	Evolução nos entregáveis: Entregável 01 - Cadastro de Atos Agrupados e Exibição de Participantes do Processo 95% para 97% Entregável 02 - Cadastro de Destinatários, Outros destinatários e Signatários de Expedientes e Comunicações 90% para 95% Entregável 03 - PEC Fora do Fluxo e Impressão de Expedientes e Comunicações Físicos 95% para 97% Entregável 04 - Cadastro de Endereços em Expedientes e Comunicações 90% para 95% Entregável 05 - Integração com o GIM 74% para 95% Entregável 06 - Finalização de Expedientes e Comunicações 90% para 95%
9	19	Implantação SILC	Andre Pereira Nunes	Suspensão	Projeto	06/02/2018	31/07/2020			50	Sem progressos no período. Projeto postergado para execução em 2020 conforme PDTIC.
10	224	Implantação do sistema eConsig	Andre Pereira Nunes	Suspensão	Projeto	06/12/2017	31/01/2019			50	Sem progressos no período. Pendências: - O Núcleo de Folha de Pagamento deve solicitar que os bancos enviem o histórico de consignações para a ZetraSoft; - O Núcleo de Folha de Pagamento ficou de solicitar treinamento à ZetraSoft para utilizar eConsig;
11	446	Disponibilização do Sistema "Botão do Pânico"	Darlon José Coqueiro	Suspensão	Projeto	13/11/2018	31/12/2019			95	Sem progresso no período. Pendência: Setor de Segurança resolver sobre a disponibilidade de Chefes e Diretores de Vara utilizarem o sistema.

4.4. Setor de Governança de TI

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

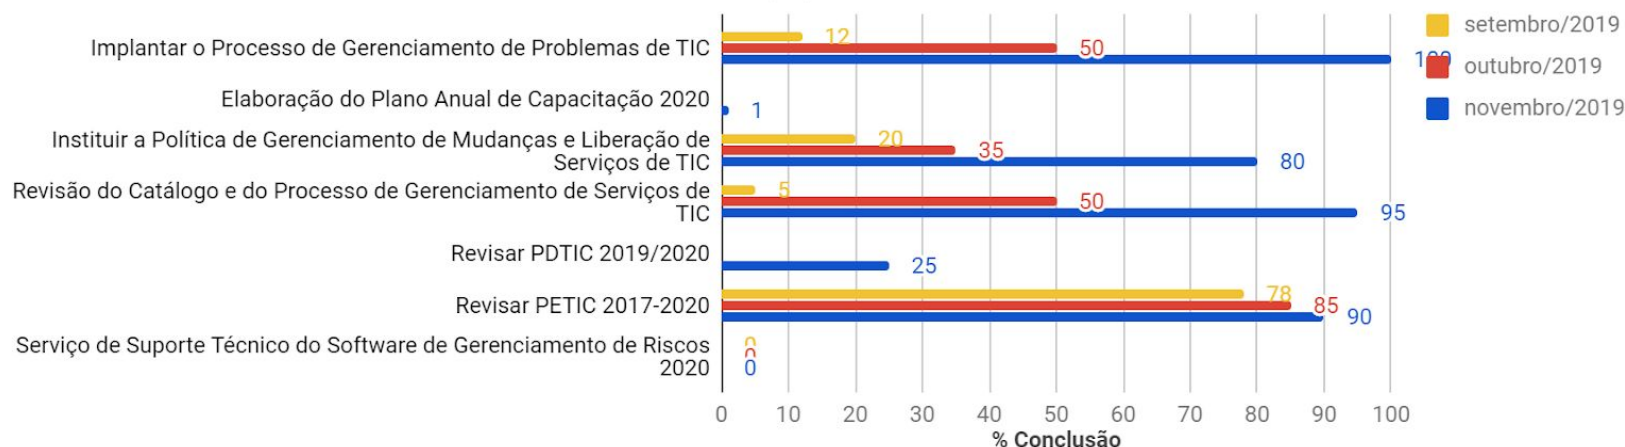


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	505	Implantar o Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	Concluído	Ação	17/09/2019	20/12/2019	30/09/2019	28/11/2019	100	Projeto finalizado com sucesso. As seguintes entregas foram realizadas pelo projeto: - Fluxo do Gerenciamento de Problemas de TIC; - Minuta do Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC; - Minuta da Política de Gerenciamento de Problemas de TIC; - Política deliberada pelo CGovTIC; - Política publicada pela Presidência (ATO REGULAMENTAR GP Nº 16/2019/TRT16, https://www.trt16.jus.br/site/conteudo/publicacoes/pub_inteiro_teor.php?id=56781);

											<ul style="list-style-type: none"> - Processo implantado na ferramenta Assyst; - Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC instituído (https://governancatic.trt16.jus.br/images/processo/Processo-de-Gerenciamento-de-Problemas-de-TIC.pdf) - Política distribuída para a equipe da CTIC.
2	486	Revisar PETIC 2017-2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Ação	13/05/2019	19/12/2019	14/05/2019		90	<ul style="list-style-type: none"> - Finalizada a elaboração do relatório de análise dos indicadores referentes aos anos de 2017 e 2018. - Previsto para o dia 09/12/2019 a análise pelo Tribunal Pleno da versão revista do PETIC 2017/2020.
3	502	Revisão do Catálogo e do Processo de Gerenciamento de Serviços de TIC	Jose Augusto	Em andamento	Ação	09/09/2019	03/12/2019	30/09/2019		95	<p>Finalização dos entregáveis. Pendência de encerramento formal do projeto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entregável 1. Elaboração da Minuta do Catálogo de Serviços de TIC; Fechado; de 90% para 100% - Entregável 2. Elaboração da Minuta do Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC; Fechado; De 5% para 100% - Entregável 3. Portaria da Política de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC; Fechado; De 0% para 100% - Entregável 4. Deliberação pelo CGovTIC da Política, do Processo e do Catálogo; Fechado; De 0% para 100% - Entregável 5. Publicação pela Presidência da Política e do Catálogo; Nova; Fechado; De 0% para 100% - Entregável 6. Publicação pela CTIC da Política e Processo de gerenciamento do catálogo; Fechado; De 0% para 100%

4	503	Instituir a Política de Gerenciamento de Mudanças e Liberação de Serviços de TIC	Maickel Roberto Neitzke	Em andamento	Ação	09/09/2019	13/12/2019	10/09/2019		80	Evolução nos entregáveis do projeto: 1. Fluxo do Gerenciamento de Mudança e Liberação de Serviços de TIC Fechado de 90% para 100% 2. Implantação do Processo na ferramenta Assyst Em andamento de 50% para 90% 3. Processo de Gerenciamento de Mudança e Liberação de Serviços de TIC Fechado de 10% para 100% 4. Política de Gerenciamento de Mudança e Liberação de Serviços de TIC Fechado de 0% para 100% 5. Deliberação pelo CGovTIC da Política Nova 0% 6. Publicação pela Presidência da Política Nova 0% 7. Política e Processo distribuído para a CTIC Nova 0%
5	509	Revisar PDTIC 2019/2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Ação	14/11/2019	31/01/2020	14/11/2019		25	Evolução nos entregáveis: - Avaliação do resultado das metas e ações previstas para 2019 - Em andamento 50% - Necessidades mapeadas e priorizadas para 2020 - Em andamento 40% - Minuta da nova versão do PDTIC elaborada - Nova 0% - Nova versão do PDTIC apreciada pelo CGovTIC - Nova 0% - Nova versão do PDTIC publicada pela Presidência - Nova 0%
6	510	Elaboração do Plano Anual de Capacitação 2020	Jose Augusto	Em andamento	Ação	23/10/2019	31/01/2020	25/11/2019		1	Projeto iniciado no final do período com a elaboração do TAP.
7	483	Serviço de Suporte Técnico do Software de Gerenciamento de Riscos 2020	Jose Augusto	Suspensão	Projeto	25/04/2019	31/12/2019			0	Sem progresso no período. Aguardando decisão da Coordenação da CTIC.

4.5. Setor de Infraestrutura Computacional

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

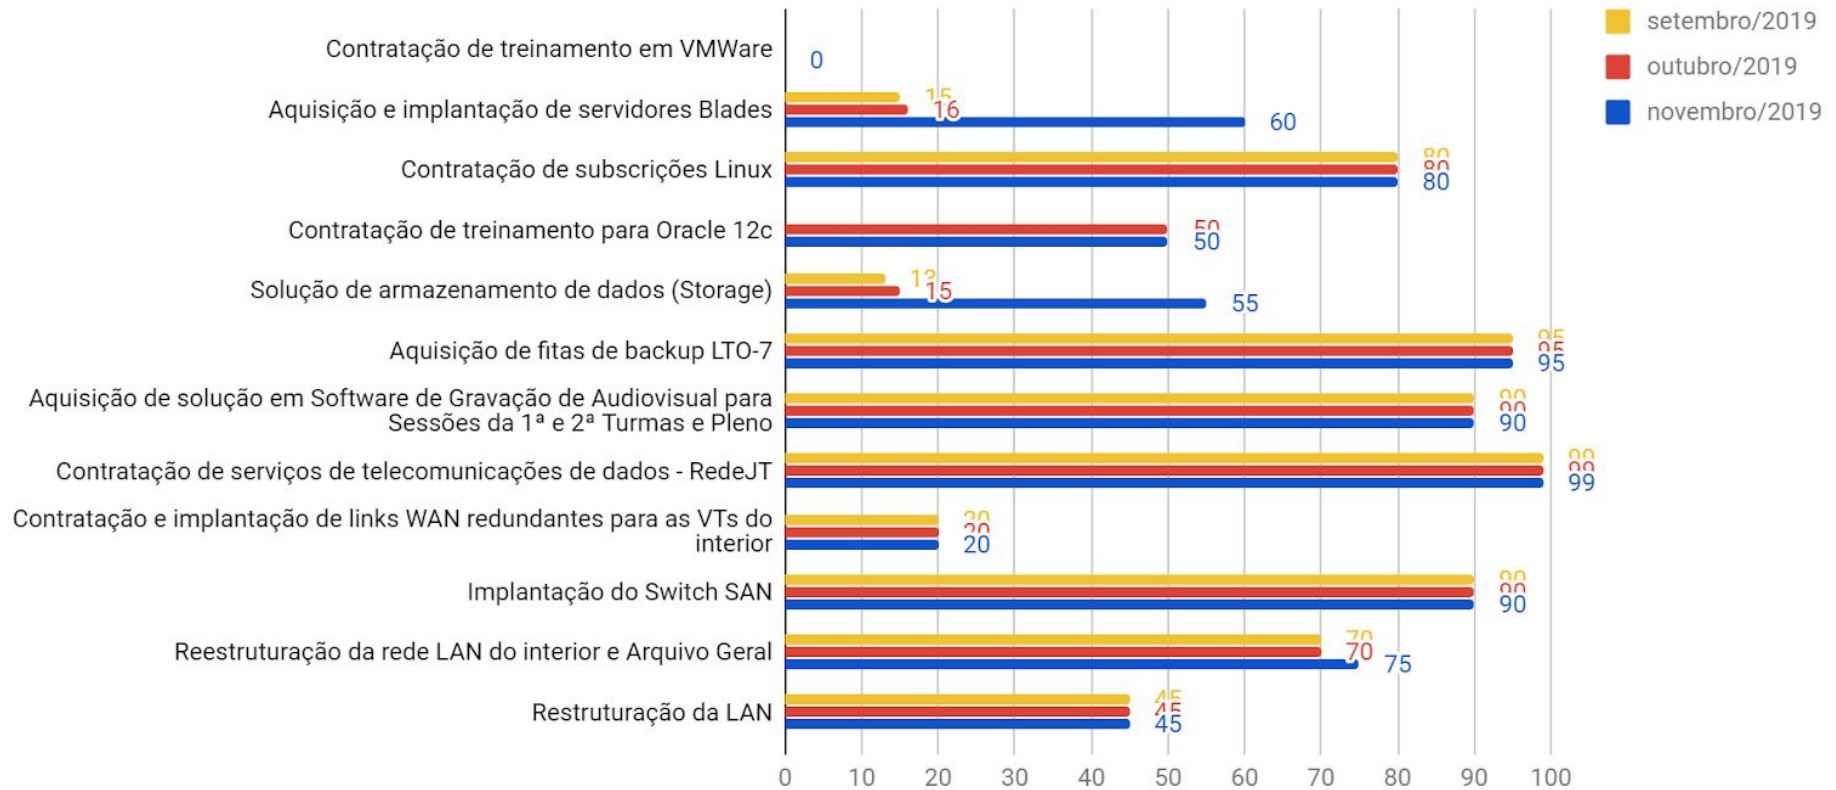


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	511	Contratação de treinamento em VMWare	Rodrigo Silveira Alexandre	Em andamento	Ação	27/11/2019	31/12/2019	27/11/2019		0	Sem reporte do gerente de projeto. (EGP-TIC)

2	455	Aquisição e implantação de servidores Blades	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	Projeto	15/01/2019	31/01/2020	31/01/2019		60	Evolução nos trâmites da aquisição dos equipamentos.
3	461	Contratação de subscrições Linux	Fernando Rola Ferreira Filho	Em andamento	Projeto	29/01/2019	10/01/2020	30/01/2019		80	Pregão eletrônico 030/19 do TRT 5 em andamento.
4	490	Solução de armazenamento de dados (Storage)	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	Projeto	18/06/2019	31/12/2019	18/06/2019		55	- Publicado no extrato do DOU o processo e remetido para SOF; - Registros contábeis efetuados no SIAFI; - Previsão de entrega dos storages até 15/12/2019. A instalação física e a configuração inicial do equipamento serão realizadas em dezembro de 2019, as atividades de configuração, migração e treinamento serão desenvolvidas no início de 2020.
5	507	Contratação de treinamento para Oracle 12c	Leonel Pereira	Em andamento	Ação	16/10/2019	09/12/2019	16/10/2019		50	- Realizada a solicitação das diárias. - Em 13/nov/19, a Bertini informou o cancelamento da turma por falta de quórum. - Nova turma com data prevista para os dias 09 e 10 de dezembro. - Enviado ofício solicitando que a realização do curso na data prevista fosse confirmada até 02/dez/19, sob pena de cancelamento da nota de empenho.
6	233	Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspensão	Projeto	12/01/2018	31/12/2020	19/01/2018		99	Sem reporte do gerente de projeto. (EGP-TIC)
7	358	Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para	Pablo Teofilo Durans	Suspensão	Projeto	06/07/2018	16/12/2019	22/10/2018		90	Sem reporte do gerente de projeto. (EGP-TIC)

		Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno									
8	442	Reestruturação da LAN	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspenso	Projeto	17/10/2018	31/12/2019			45	Sem reporte do gerente de projeto. (EGP-TIC)
9	460	Aquisição de fitas de backup LTO-7	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspenso	Projeto	29/01/2019	30/11/2019	30/01/2019		95	Sem reporte do gerente de projeto. (EGP-TIC)
10	476	Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo Geral	Antoniél Magalhaes de Carvalho	Suspenso	Projeto	01/04/2019	19/12/2019	16/04/2019		75	Sem progresso no período. Ausência de pessoal relacionado ao projeto no Setor de Infraestrutura.
11	480	Contratação e implantação de links WAN redundantes para as VTs do interior	Danilo Augusto Alves Leite	Suspenso	Projeto	15/04/2019	31/12/2020	08/03/2019		20	Sem reporte do gerente de projeto. (EGP-TIC)
12	493	Implantação do Switch SAN	Pablo Teofilo Durans	Suspenso	Ação	02/07/2019	30/10/2019			90	Sem reporte do gerente de projeto. (EGP-TIC)

4.6. Seção de Apoio ao PJe

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

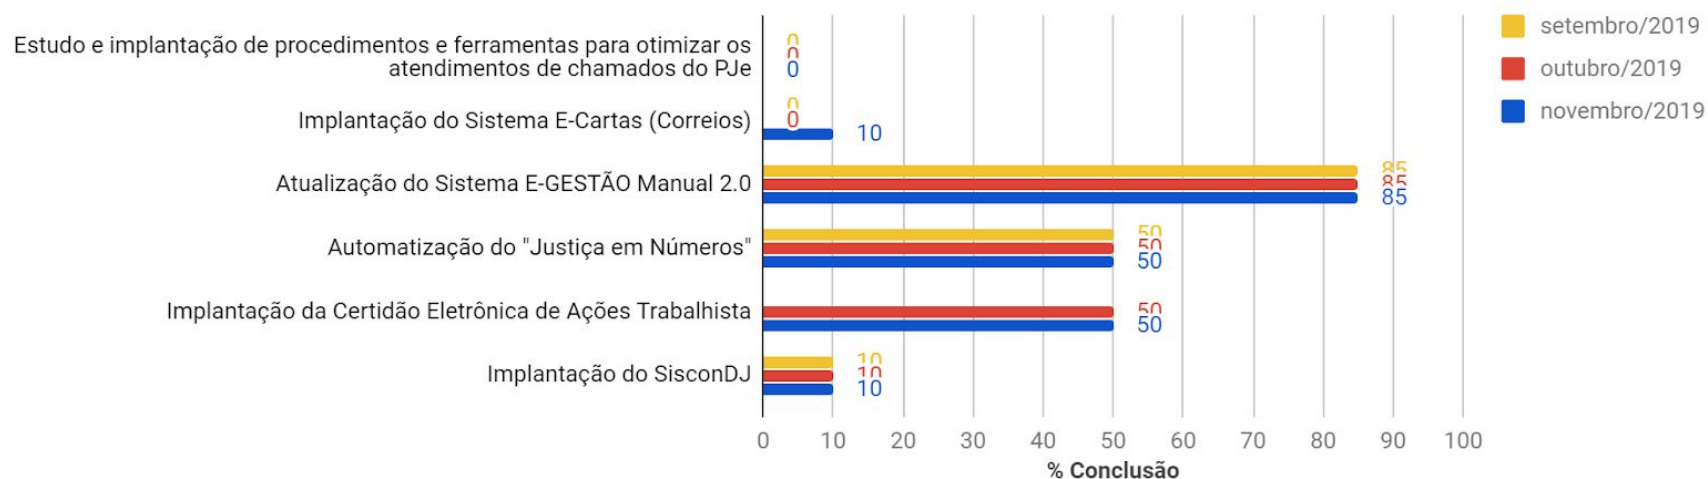


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	492	Estudo e implantação de procedimentos e ferramentas para otimizar os atendimentos de chamados do PJe	Gilberto Cunha Filho	A iniciar	Projeto	18/06/2019	30/04/2020			0	Sem progresso no período. Projeto não iniciado.
2	504	Implantação do Sistema E-Cartas (Correios)	Gutemberg Pereira Vidal Santos	Em andamento	Ação	10/09/2019	02/03/2020			10	- Contato realizado com a demandante; - Estudo do documento de contratação do eCarta;
3	56	Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0	Djeison Rafael Neitzke	Suspensão	Projeto	06/04/2018	19/12/2019			85	Sem progresso no período.

4	477	Implantação do SisconDJ	Gilberto Cunha Filho	Suspensão	Ação	05/12/2018	30/12/2019			10	Sem progresso no período. Pendência de recursos humanos da SIC. Risco efetivado: perda do prazo de suporte com a equipe do BB;
5	481	Automatização do "Justiça em Números"	Djeison Rafael Neitzke	Suspensão	Ação	23/04/2019	19/12/2019	19/06/2019		50	Sem progresso no período.
6	506	Implantação da Certidão Eletrônica de Ações Trabalhista	Gutemberg Pereira Vidal Santos	Suspensão	Ação	27/09/2018	28/02/2020	14/10/2019		50	Sem progresso no período. Sem recurso humano de Infraestrutura para execução das tarefas de criação do ambiente de homologação.

4.7. Setor de Relacionamento com o Cliente

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

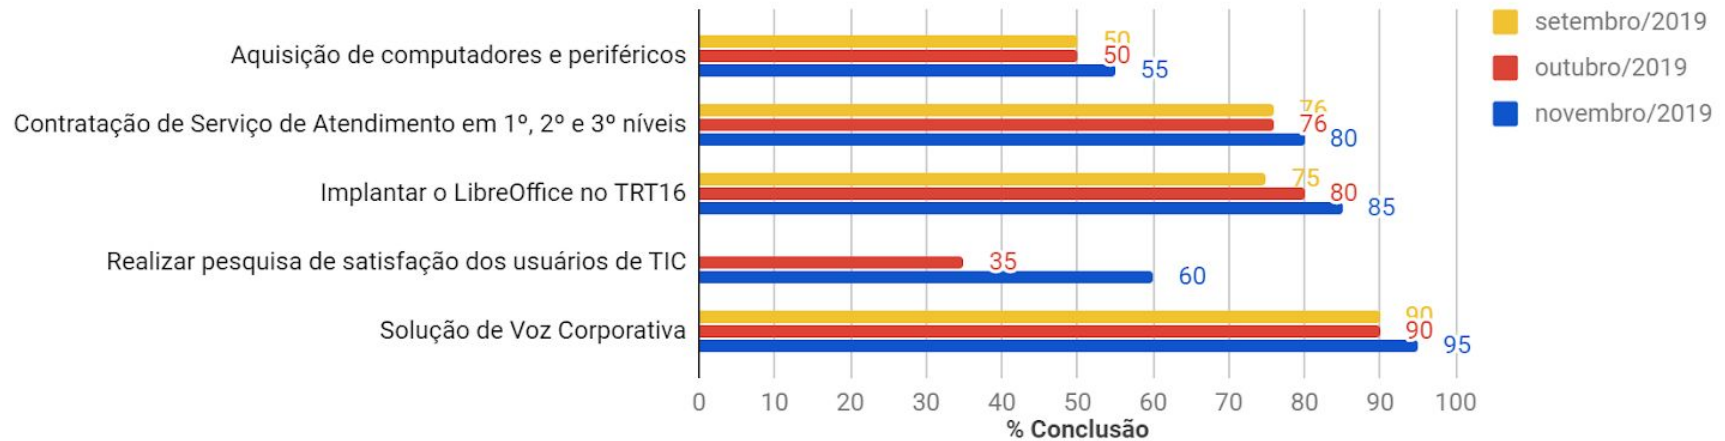


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	351	Implantar o LibreOffice no TRT16	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	25/06/2018	31/01/2020			85	<p>As instalações do LibreOffice continuam a ser realizadas lentamente via GPO. O progresso das instalações está demonstrado na tabela abaixo:</p> <p>Estatística Localidades Porcentual Instalado 1 VT de Imperatriz 95,00% 2 VT de Imperatriz 85,00% Distribuicao do FMAMR 100,00% VT de Acailandia 93,33% VT de Bacabal 17,65% VT de Balsas 86,67% VT de Barra do Corda 72,22% VT de Barreirinhas 70,59% VT de Caxias 100,00% VT de Chapadinha 68,75% VT de Estreito 100,00% VT de Pedreiras 26,67% VT de Pinheiro 94,12% VT de Presidente Dutra 75,00% VT</p>

											de Santa Ines 87,50% VT de Sao Joao dos Patos 62,50% VT de Timon 100,00%
2	381	Solução de Voz Corporativa	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	27/08/2018	31/12/2019			95	- Licitação ocorrida. Recursos foram analisados pelo Coordenador da CTIC, sendo emitidas as respectivas respostas fundamentadas. - Aguarda-se a homologação do vencedor da licitação para emissão de empenho e assinatura do contrato.
3	391	Contratação de Serviço de Atendimento em 1º, 2º e 3º níveis	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	19/09/2018	31/01/2020			80	Continuidade ao estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência com a alteração de alguns pontos estratégicos da contratação.
4	500	Aquisição de computadores e periféricos	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	05/08/2019	31/12/2019	05/08/2019		55	Preparados os artefatos da contratação, mas a sua efetivação só será possível mediante disponibilidade orçamentária. Pendência: sem recursos orçamentários até o momento.
5	508	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Ação	17/10/2019	31/12/2019	25/10/2019		60	- Realizado o planejamento e divulgação da pesquisa que está em execução até o dia 11/12/2019. - O resultado deve ser divulgado no dia 17/12/2019.

4.8. Seção de Segurança da Informação

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

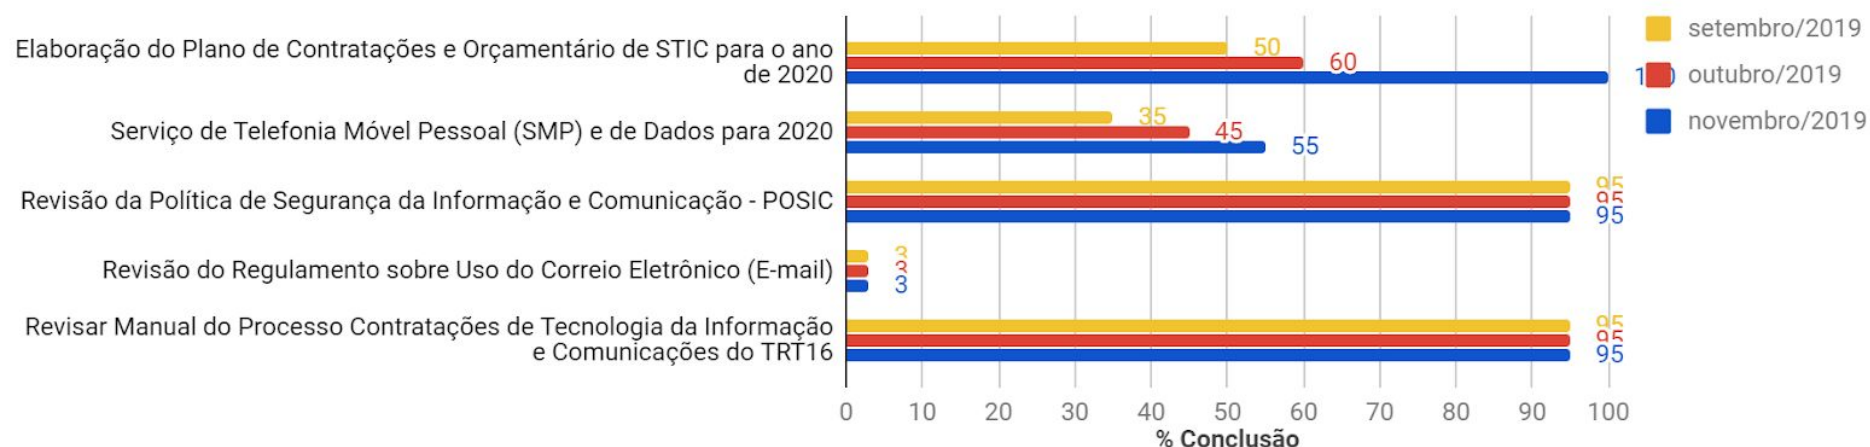

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	454	Elaboração do Plano de Contratações e Orçamentário de STIC para o ano de 2020	Stanley Araujo de Sousa	Concluído	Projeto	04/01/2019	22/11/2019	04/01/2019	29/11/2019	100	Projeto finalizado: - Revisão da Minuta pelo Coordenador da CTIC; - Aprovação da Minuta pelo CGovTIC na 7ª reunião de 2019; - Aprovação e publicação pela Presidência (PORTARIA GP N° 854/2019);
2	457	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2020	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	22/01/2019	14/04/2020	15/03/2019		55	Evolução na elaboração do ETP e TR. Elevação do risco de não conclusão do processo antes do dia 14 de abril de 2019. Eventual necessidade de prorrogação excepcional.
3	147	Revisar Manual do Processo Contratações	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	09/05/2017	31/03/2020			95	Sem progresso no período. Pedido de vista regimental pela Desembargadora Ilka

		de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16									Esdra Silva Araújo.
4	168	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	28/06/2017	31/03/2020			95	Sem progresso no período. Pedido de vista regimental pelos Desembargadores James Magno Araújo Farias e Ilka Esdra Silva Araújo.
5	475	Revisão do Regulamento sobre Uso do Correio Eletrônico (E-mail)	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	05/04/2019	30/04/2020			3	Sem progresso no período. Problema: Alocação dos recursos humanos para outras demandas mais prioritárias.
