



**TRT-16ª REGIÃO**

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

# **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CTIC**

**MARÇO/2020**

## SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	REUNIÃO DOS COMITÊS DE TIC	3
3.	ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC	4
4.	PORTFÓLIO DE PROJETOS E AÇÕES DE TIC	5
4.1.	RESUMO DOS PROJETOS	6
4.1.1.	PROJETOS INCLUÍDOS NO PORTFÓLIO	7
4.1.2.	PROJETOS INICIADOS	7
4.1.3.	PROJETOS CONCLUÍDOS	7
4.1.4.	PROJETOS CANCELADOS	7
5.	COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES	8
6.	SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	10
7.	SETOR DE GOVERNANÇA DE TI	14
8.	SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL	16
9.	SEÇÃO DE APOIO AO PJE	19
10.	SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE	21
11.	SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	23

## 1. INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo apresentar as atividades realizadas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação e suas unidades subordinadas no mês de Março de 2020.

O relatório está estruturado pelos seguintes tópicos:

- Reunião dos comitês de TIC;
- Atendimento aos usuários de TIC;
- Portfólio de Projetos e Ações de TIC.

## 2. REUNIÃO DOS COMITÊS DE TIC

No período de referência foi realizado uma reunião nos comitês relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação.

O Comitê de Gestão de TIC reuniu-se no dia 03/03/2020 ([link para ata da reunião](#)), tratando dos seguintes temas:

- Teletrabalho;
- PAC 2020.

### 3. ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC



#### **4. PORTFÓLIO DE PROJETOS E AÇÕES DE TIC**

Nesta seção são apresentados as informações relativas aos projetos de TIC controlados pelo Escritório de Projetos de TIC.

Inicialmente, é exibida uma perspectiva geral dos projetos agrupados pela unidade na qual eles estão sendo gerenciados, e são listados os projetos iniciados, concluídos e cancelados no período.


Além do resumo do portfólio, para cada área de TIC são listados os projetos e suas respectivas evoluções no período de referência.

### 4.1. RESUMO DOS PROJETOS


Quantidade de projetos nas unidades




Complexidade dos projetos

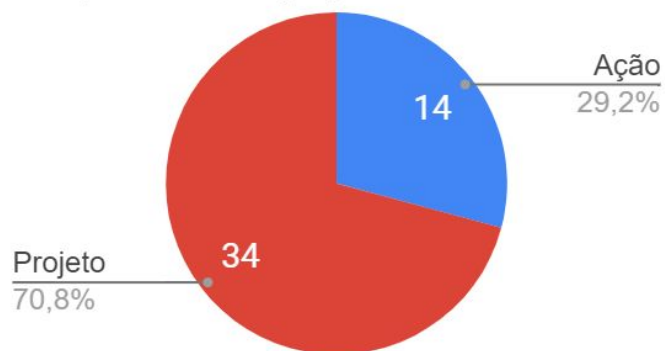

Situação dos projetos

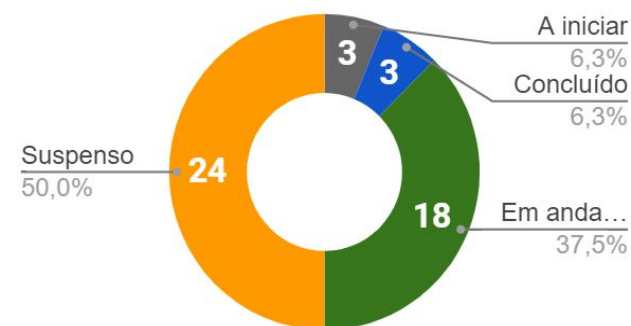

Situação dos projetos nas unidades

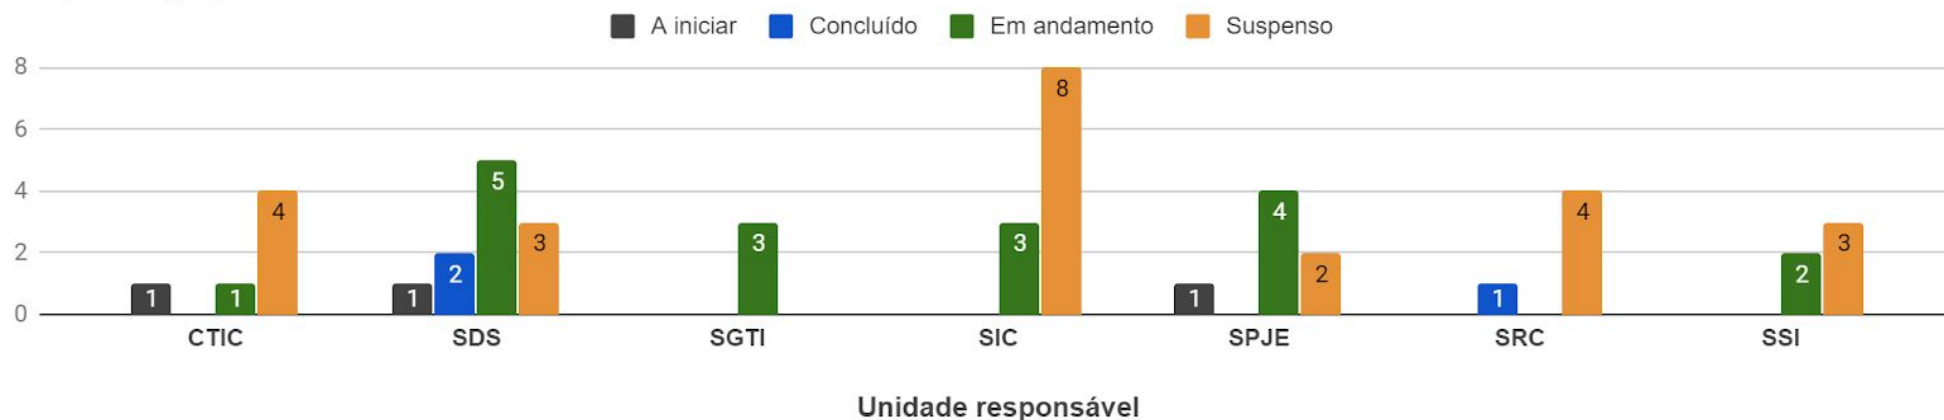

#### 4.1.1. PROJETOS INCLUÍDOS NO PORTFÓLIO

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
526	Contratação de Treinamento em DevOps	Andre Pereira Nunes	SDS	Ação	12/03/2020	18/03/2020		Em andamento
527	Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária AJ/JT	Stanley Araujo de Sousa	CTIC	Ação	27/02/2020			A iniciar

#### 4.1.2. PROJETOS INICIADOS

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
526	Contratação de Treinamento em DevOps	Andre Pereira Nunes	SDS	Ação	12/03/2020	18/03/2020		Em andamento

#### 4.1.3. PROJETOS CONCLUÍDOS


<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
277	SIGEP: Implantação do SGRH	Andre Pereira Nunes	SDS	Projeto	28/04/2015	28/04/2015	06/03/2020	Concluído
508	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC	Carlos Eduardo Ferreira Marins	SRC	Ação	17/10/2019	25/10/2019	30/03/2020	Concluído
520	Renovação do Contrato de Serviço de SMS Corporativo	Andre Pereira Nunes	SDS	Ação	15/01/2020	21/01/2020	31/03/2020	Concluído

#### 4.1.4. PROJETOS CANCELADOS

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>

## 4.2. COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

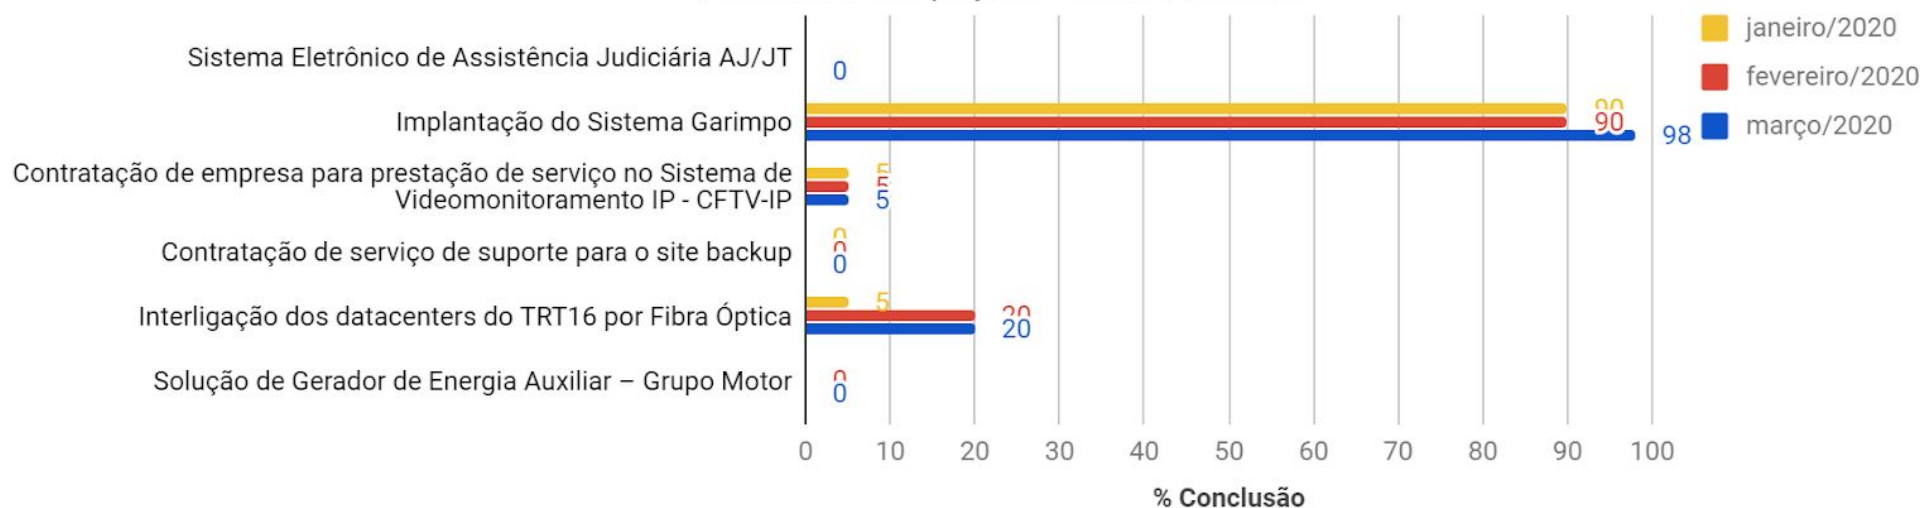


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	527	Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária AJ/JT	Stanley Araujo de Sousa	<b>A iniciar</b>	Ação	27/02/2020	30/09/2020			0	Sem progresso no período. Em contato com a unidade de Orçamento e Finanças do TST, foi informado que haverá dilação do prazo estipulado na RES CNJ 247/2019.
2	489	Implantação do Sistema Garimpo	David Tedson Mendonca Ferreira	<b>Em andamento</b>	Projeto	05/06/2019	28/03/2020	01/09/2019		98	Sistema disponibilizado em produção. Pendência do encerramento formal do projeto.
3	246	Contratação de empresa para prestação de serviço no Sistema de Videomonitoramento IP - CFTV-IP	Stanley Araujo de Sousa	<b>Suspensão</b>	Projeto	16/02/2018	31/08/2019	16/02/2018		5	Sem reporte do gerente. (EGP-TIC)



4	519	Contratação de serviço de suporte para o site backup	Stanley Araujo de Sousa	<b>Suspensão</b>	Projeto	15/01/2020	30/06/2020			0	Sem reporte do gerente. (EGP-TIC)
5	521	Interligação dos datacenters do TRT16 por Fibra Óptica	Stanley Araujo de Sousa	<b>Suspensão</b>	Projeto	15/01/2020	30/08/2020	21/01/2020		20	Sem reporte do gerente. (EGP-TIC)
6	522	Solução de Gerador de Energia Auxiliar – Grupo Motor	Stanley Araujo de Sousa	<b>Suspensão</b>	Projeto	15/01/2020	30/09/2020			0	Sem reporte do gerente. (EGP-TIC)

### 4.3. SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

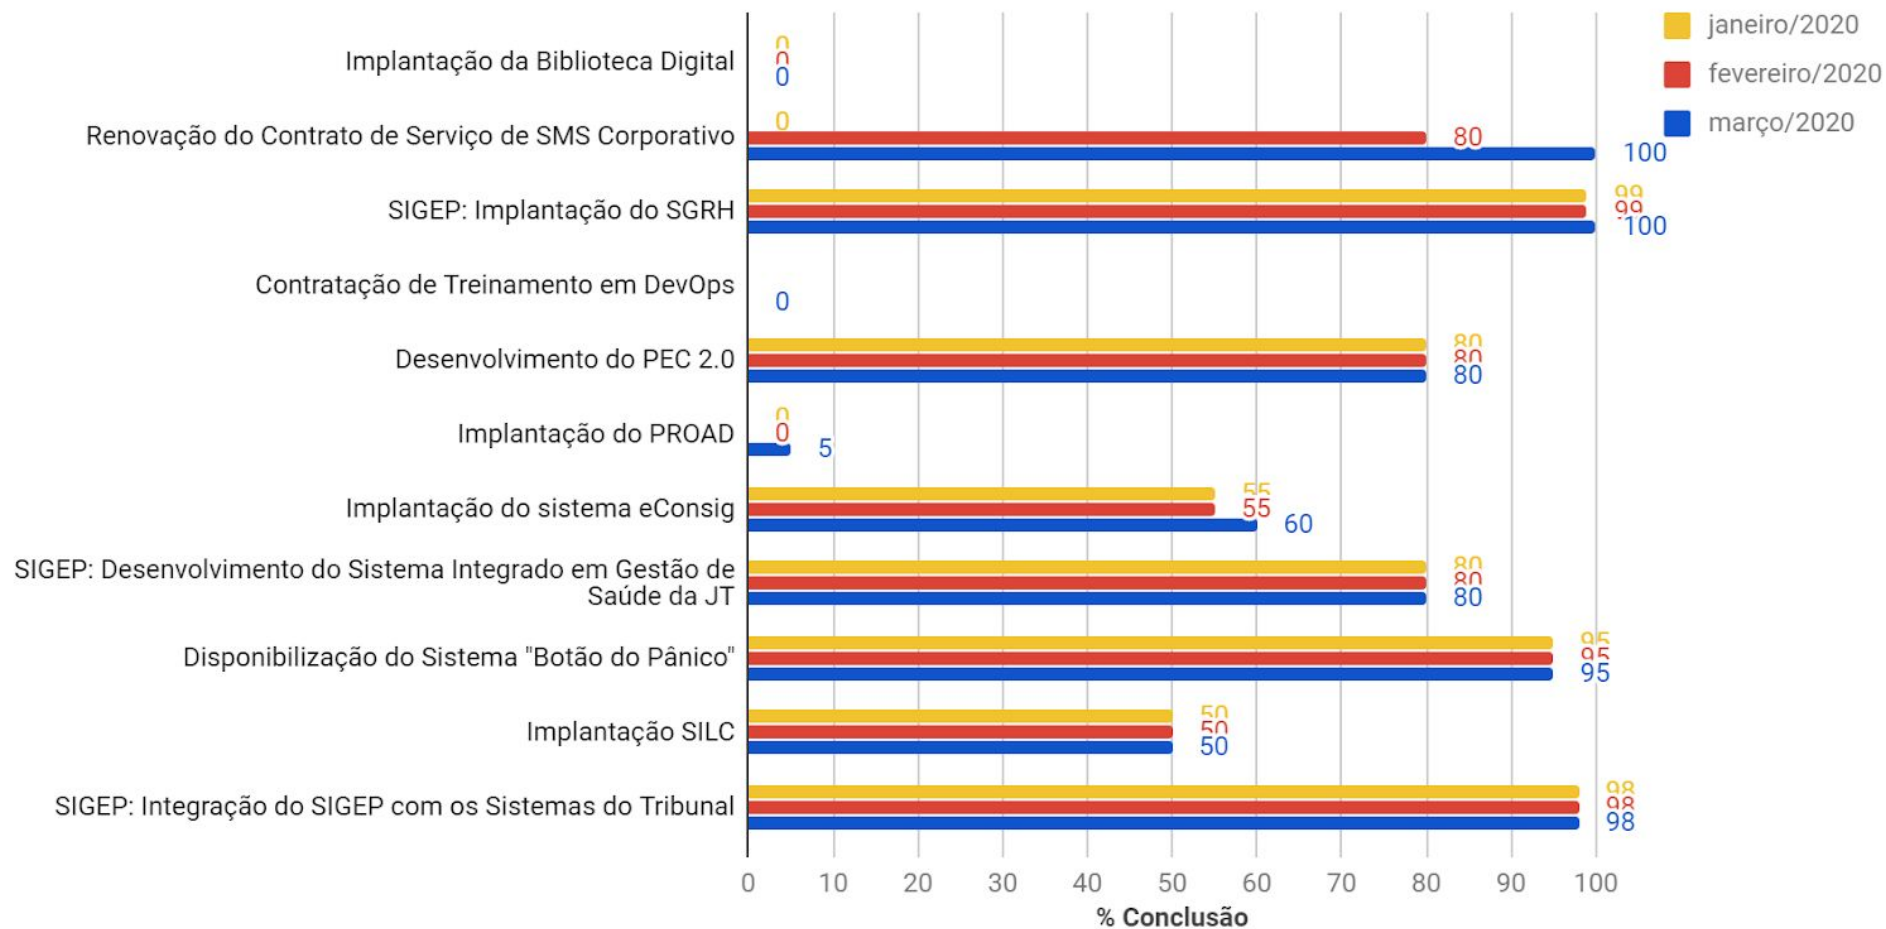


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	279	Implantação da Biblioteca Digital	Andre Pereira Nunes	<b>A iniciar</b>	Projeto	01/01/2018	18/12/2020			0	Sem progressos no período. Projeto previsto para execução no segundo semestre de 2020.
2	277	SIGEP: Implantação do SGRH	Andre Pereira Nunes	<b>Concluído</b>	Projeto	28/04/2015	06/03/2020	28/04/2015	06/03/2020	100	Projeto concluído. TEF e TEP produzidos e aprovados pelos demandantes (anexados o PA do projeto).
3	520	Renovação do Contrato de Serviço de SMS Corporativo	Andre Pereira Nunes	<b>Concluído</b>	Ação	15/01/2020	31/03/2020	21/01/2020	31/03/2020	100	Projeto concluído com as entregas: - 3o Aditivo de Contrato devidamente assinado entre as partes (tribunal e empresa prestadora do serviço); - Empenho emitido pela SOF; - Contrato formalmente renovado e continuidade do serviço garantida;
4	187	SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	Diogo Duailibe da Silva	<b>Em andamento</b>	Projeto	25/08/2017	01/12/2020	29/08/2017		80	Resolução de BUGS em virtude da atualização da versão do Angular em Front-end para a versão 9; Resolução de BUGS em virtude de abertura de chamados pelos regionais; Início da sprint 20 com resolução de demandas nacionais (bugfixies e solicitações) e inclusão do módulo de Programas de Saúde.
5	224	Implantação do sistema eConsig	Andre Pereira Nunes	<b>Em andamento</b>	Projeto	06/12/2017	30/04/2020	12/07/2019		60	- Recebidas e tratadas as respostas aos questionamentos feitos sobre o laytot dos arquivos. - Arquivos de histórico de consignações e de margem consignável enviados ao setor de folha de pagamento. - Aguardando validação dos arquivos pela Folha de Pagamento junto à ZetraSoft.

6	354	Desenvolvimento do PEC 2.0	Ronny Paterson Cruz da Silva	<b>Em andamento</b>	Projeto	03/07/2018	30/06/2020	02/07/2018		80	<p>Com todas as histórias devidamente integradas, o progresso no período consistiu na finalização da estabilização do PEC, com a correção de defeitos ainda existentes, a serem integrados na versão 2.5.5.</p> <p>Entregável 01 - Cadastro de Atos Agrupados e Exibição de Participantes do Processo 100%</p> <p>Entregável 02 - Cadastro de Destinatários, Outros destinatários e Signatários de Expedientes e Comunicações 100%</p> <p>Entregável 03 - PEC Fora do Fluxo e Impressão de Expedientes e Comunicações Físicos 100%</p> <p>Entregável 04 - Cadastro de Endereços em Expedientes e Comunicações 100%</p> <p>Entregável 05 - Integração com o GIM 100%</p> <p>Entregável 06 - Finalização de Expedientes e Comunicações 100%</p> <p>Entregável 08 - Integração com o GIGS 0%</p> <p>Entregável 09 - Integração com o eCarta 0%</p> <p>Entregável 10 - Integração com as Cartas Precatórias 0%</p>
7	499	Implantação do PROAD	Andre Pereira Nunes	<b>Em andamento</b>	Projeto	28/02/2019	31/07/2020	28/08/2019		5	<p>Evolução dos entregáveis:</p> <p>ENTREGA 1: Preparação da Infraestrutura Em andamento 10% 30/04/2020</p> <p>- Iniciada a subarefa: Instalar o PROAD em ambiente de desenvolvimento (Em andamento 50%):</p> <p>ENTREGA 2: Acordo de Cooperação Técnica com o TRT12 Nova</p> <p>ENTREGA 3: Configuração do Sistema Nova</p> <p>ENTREGA 4: Adequação do SUAP e SISPAE Nova</p> <p>ENTREGA 5: Visita Técnica e Treinamento Nova</p> <p>ENTREGA 6: PROAD e PROAD-OUV em Produção Nova</p>

8	526	Contratação de Treinamento em DevOps	Andre Pereira Nunes	<b>Em andamento</b>	Ação	12/03/2020	30/06/2020	18/03/2020		0	Projeto formalmente aprovado e iniciado. Risco: provável adiamento do treinamento in company devido à pandemia.
9	19	Implantação SILC	Andre Pereira Nunes	<b>Suspensão</b>	Projeto	06/02/2018	18/12/2020	23/04/2018		50	Sem progressos no período. Projeto previsto para execução no segundo semestre de 2020.
10	32	SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	Andre Pereira Nunes	<b>Suspensão</b>	Projeto	24/05/2018	30/06/2020	04/06/2018		98	Sem progressos no período. Projeto suspenso até a efetivação da data de virada, prevista para ocorrer em 01/06/2020, mediante autorização do setor de folha de pagamento.
11	446	Disponibilização do Sistema "Botão do Pânico"	Darlon José Coqueiro	<b>Suspensão</b>	Projeto	13/11/2018	31/12/2019	13/11/2018		95	Sem progresso no período. Pendência: Setor de Segurança resolver sobre a disponibilidade de Chefes e Diretores de Vara utilizarem o sistema.

#### 4.4. SETOR DE GOVERNANÇA DE TI

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

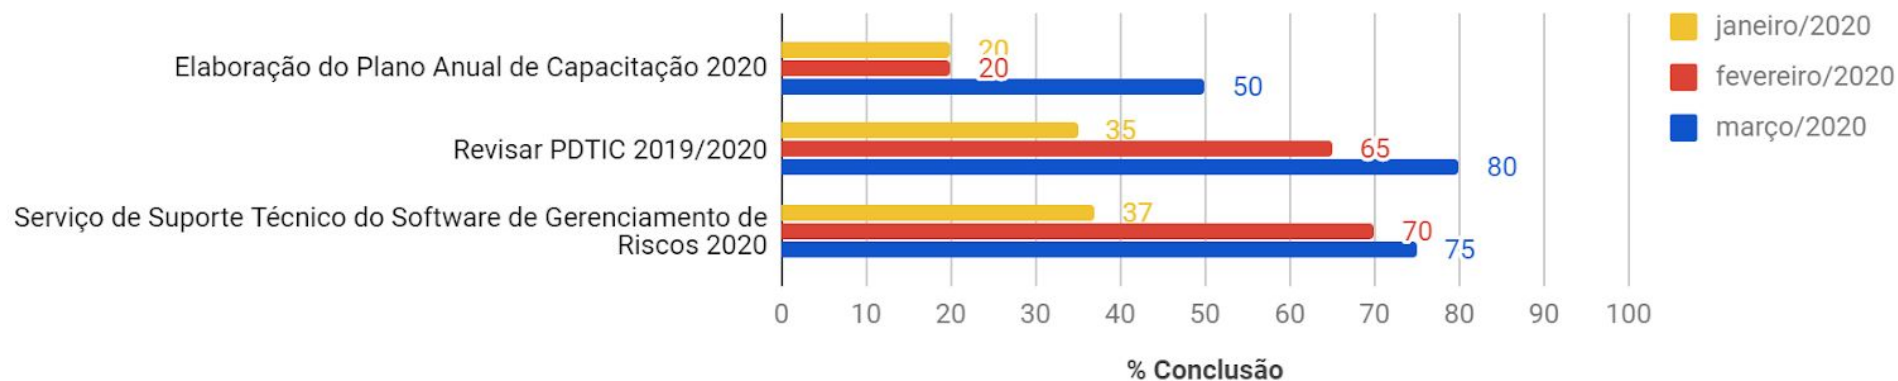


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	483	Serviço de Suporte Técnico do Software de Gerenciamento de Riscos 2020	Jose Augusto	Em andamento	Ação	25/04/2019	30/04/2020	16/01/2020		75	Evolução dos entregáveis: 1 Preparação Fechada 100% 2 Estudo Técnico Preliminar Fechado 100% 3 Termo de Referência Fechado 100% 4 Contratação Em andamento 40%
2	509	Revisar PDTIC 2019/2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Ação	04/11/2019	30/04/2020	14/11/2019		80	Finalizada a minuta da nova versão do PDTIC; Iniciadas as tratativas para aprovação da minuta no CGovTIC; Evolução nos entregáveis: - Avaliação do resultado das metas e ações previstas para 2019 - Concluída 100% - Necessidades mapeadas e priorizadas para 2020 - Concluída 100% - Minuta da nova versão do PDTIC elaborada - Concluída 100% - Nova versão do PDTIC apreciada pelo

											CGovTIC - Em andamento 50% - Nova versão do PDTIC publicada pela Presidência - Nova 0%
3	510	Elaboração do Plano Anual de Capacitação 2020	Jose Augusto	<b>Em andamento</b>	Ação	23/10/2019	30/04/2020	25/11/2019		50	Evolução nos entregáveis: 1 Lista de documentos de referência Fechada 100% 2 Lista de cursos aprovados Em andamento 75% 3 Minuta da portaria do plano Nova 0% 4 Minuta do PAC Em andamento 50%

### 4.5. SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

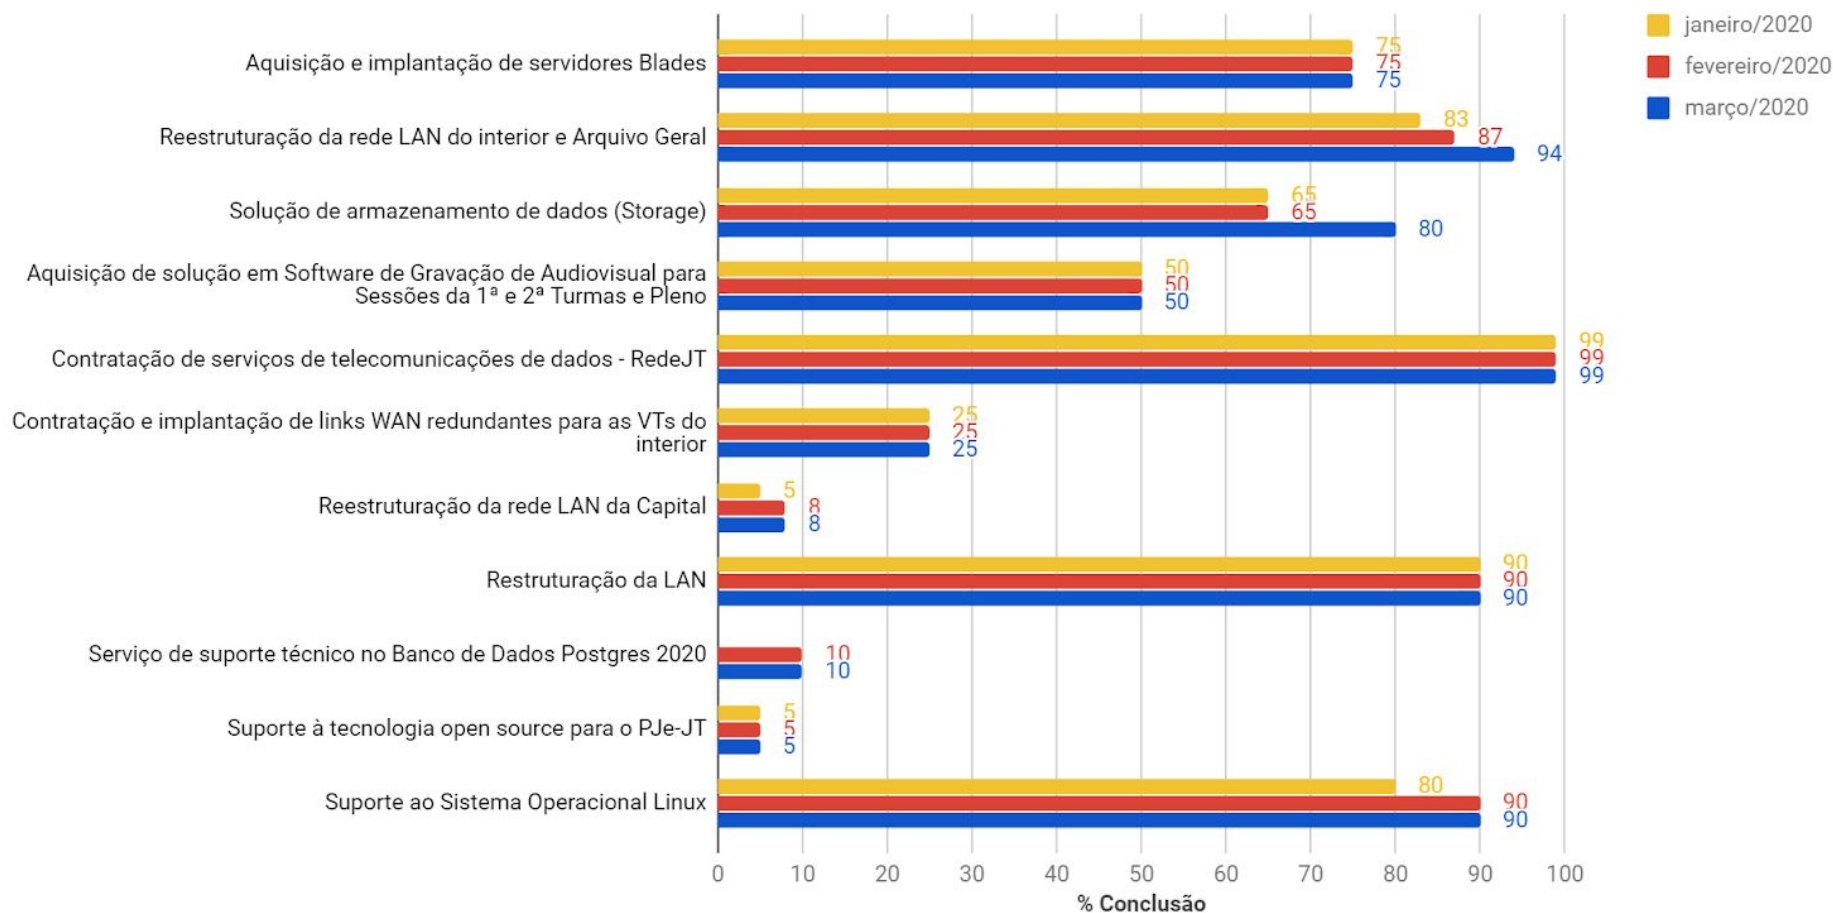




#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	455	Aquisição e implantação de servidores Blades	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	Projeto	15/01/2019	19/05/2020	31/01/2019		75	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O preposto técnico emitiu o relatório final de configuração lógica dos aparelhos;</li> <li>- A gerente do projeto emitiu o termo de garantia dos equipamentos, conforme definido no contrato;</li> <li>- A HPE comprometeu-se a emitir um laudo técnico para explicar a ocorrência de falhas de hardware em três lâminas do tipo full;</li> <li>- A Administração foi informada sobre o Recebimento Definitivo pelo integrante da Comissão de Recebimento (doc.089), contudo, até o momento, o pagamento não foi realizado.</li> </ul>
2	476	Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo Geral	Antoniél Magalhaes de Carvalho	Em andamento	Projeto	01/04/2019	30/07/2020	16/04/2019		94	Corrigido o WiFi (está funcionando a Rede Institucional) nas VTs de Bacabal (agora os 2 APS estão up), Barra do Corda, Barreirinhas, Chapadinha. Pendência de visita técnica em algumas VTs.
3	490	Solução de armazenamento de dados (Storage)	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	Projeto	18/06/2019	13/05/2020	18/06/2019		80	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segundo treinamento realizado na data agendada pela Contratada;</li> <li>- Serviço de Migração realizado. O Banco de Produção do PJe está no novo storage.</li> <li>- Atesto técnico dos serviços e solicitação de pagamento da Nota Fiscal encaminhados para a Diretoria Geral (DOC.073)</li> </ul>
4	233	Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspensão	Projeto	12/01/2018	28/02/2020	19/01/2018		99	Sem reporte do gerente. (EGP-TIC)
5	358	Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno	Pablo Teofilo Durans	Suspensão	Projeto	06/07/2018	29/10/2020	22/10/2018		50	Sem progresso no período. Projeto está programado para retornar em Julho. Mas devido o aumento da demanda de teletrabalho, houve sobrecarga do Apoio à Infraestrutura Computacional, sendo que o projeto anterior do gerente (Implantação de Práticas Ágeis à Infraestrutura Computacional) está 15 dias atrasado quanto a seu início. O atraso até o momento consumiu o contingente do próprio

											projeto, mas se a demanda continuar alta (espera-se que a demanda início seja maior, mas que enquanto durarem as ações de contenção da mobilidade, a demanda será mais alta que o normal) pode resultar no atraso de ambos os projetos.
6	442	Reestruturação da LAN	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspenso	Projeto	17/10/2018	30/04/2020	01/11/2018		90	Sem reporte do gerente. (EGP-TIC)
7	461	Suporte ao Sistema Operacional Linux	Fernando Rola Ferreira Filho	Suspenso	Projeto	29/01/2019	30/04/2020	30/01/2019		90	Sem progresso no período. Problemas no PJE ocupou a equipe.
8	480	Contratação e implantação de links WAN redundantes para as VTs do interior	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspenso	Projeto	15/04/2019	31/12/2020	08/03/2019		25	Sem reporte do gerente. (EGP-TIC)
9	517	Suporte à tecnologia open source para o PJe-JT	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspenso	Projeto	09/12/2019	30/04/2020	09/12/2019		5	Sem reporte do gerente. (EGP-TIC)
10	518	Reestruturação da rede LAN da Capital	Antoniél Magalhaes de Carvalho	Suspenso	Projeto	13/01/2020	02/12/2020	27/01/2020		8	Sem progresso no período. Situação dos entregáveis: - Switches do Bloco C Em andamento 50% - Switches do Bloco B Nova 0% - Switches do Bloco A Nova 0% - Switches do Forum Astolfo Serra Nova 0% - Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e Storages do FAS Nova 0% - Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e Storages Sede Nova 0% - Alteração dos IPs de Servidores Sede Nova 0%
11	523	Serviço de suporte técnico no Banco de Dados Postgres 2020	Fernando Rola Ferreira Filho	Suspenso	Ação	06/02/2020	31/05/2020	06/02/2020		10	Sem progresso no período. Problemas no PJE ocupou a equipe.

#### 4.6. SEÇÃO DE APOIO AO PJE


Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

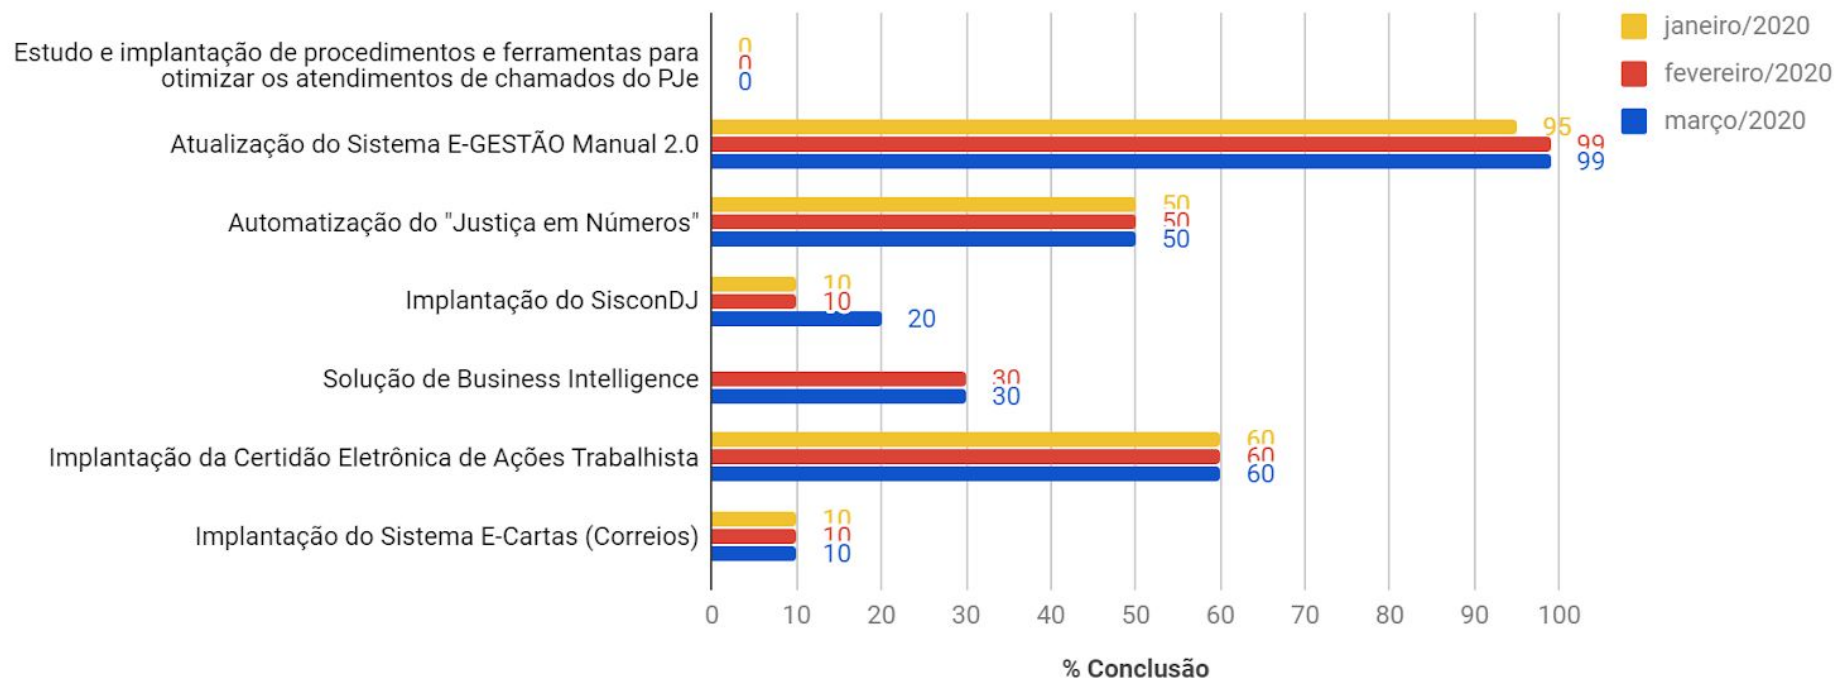

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	492	Estudo e implantação de procedimentos e ferramentas para otimizar os atendimentos de chamados do PJe	Gilberto Cunha Filho	<b>A iniciar</b>	Projeto	18/06/2019	31/03/2020			0	Sem progresso no período. Projeto será cancelado. Aguardando o aceite do cancelamento pelo demandante.
2	56	Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0	Djeison Rafael Neitzke	<b>Em andamento</b>	Projeto	06/04/2018	20/03/2020	06/04/2018		99	Executados os scripts de desabilitação dos itens do Egestão Legado - #1244. Pendência: formalizar o encerramento do projeto.

3	477	Implantação do SisconDJ	Gilberto Cunha Filho	<b>Em andamento</b>	Ação	05/12/2018	30/04/2020	01/04/2019		20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acesso e estudo da documentação;</li> <li>- Recebimento dos arquivos de instalação;</li> <li>- Início do progresso de instalação do servidor de aplicação de homologação;</li> <li>- Criação base de dados de homologação;</li> </ul>
4	481	Automatização do "Justiça em Números"	Djeison Rafael Neitzke	<b>Em andamento</b>	Ação	23/04/2019	30/06/2020	19/06/2019		50	Análise e captura de todo material disponível para adequar o gerador xml à edição 2020 do prêmio, resultando no registro da tarefa #6611.
5	524	Solução de Business Intelligence	Gutemberg Pereira Vidal Santos	<b>Em andamento</b>	Ação	12/02/2020	29/05/2020	12/02/2020		30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Empresa não manifestou interesse em renovar o contrato atual.</li> <li>- Desse modo, o ETP e o TR estão sendo elaborados para ver a melhor modalidade de licitação.</li> </ul>
6	504	Implantação do Sistema E-Cartas (Correios)	Gutemberg Pereira Vidal Santos	<b>Suspensão</b>	Ação	10/09/2019	30/04/2020	01/11/2019		10	Sem progresso no período. Elaborado o TEF recomendando o cancelamento do projeto. Aguardando a manifestação do demandante.
7	506	Implantação da Certidão Eletrônica de Ações Trabalhista	Gutemberg Pereira Vidal Santos	<b>Suspensão</b>	Ação	27/09/2018	30/04/2020	14/10/2019		60	<p>Sem progresso no período. Sugestão de cancelamento do projeto considerando que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A versão 2.5 do PJe veio com a funcionalidade objetiva deste sistema no que diz respeito aos processos eletrônicos;</li> <li>- O TRT 16 recebeu o selo de 100% PJe;</li> </ul>

#### 4.7. SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

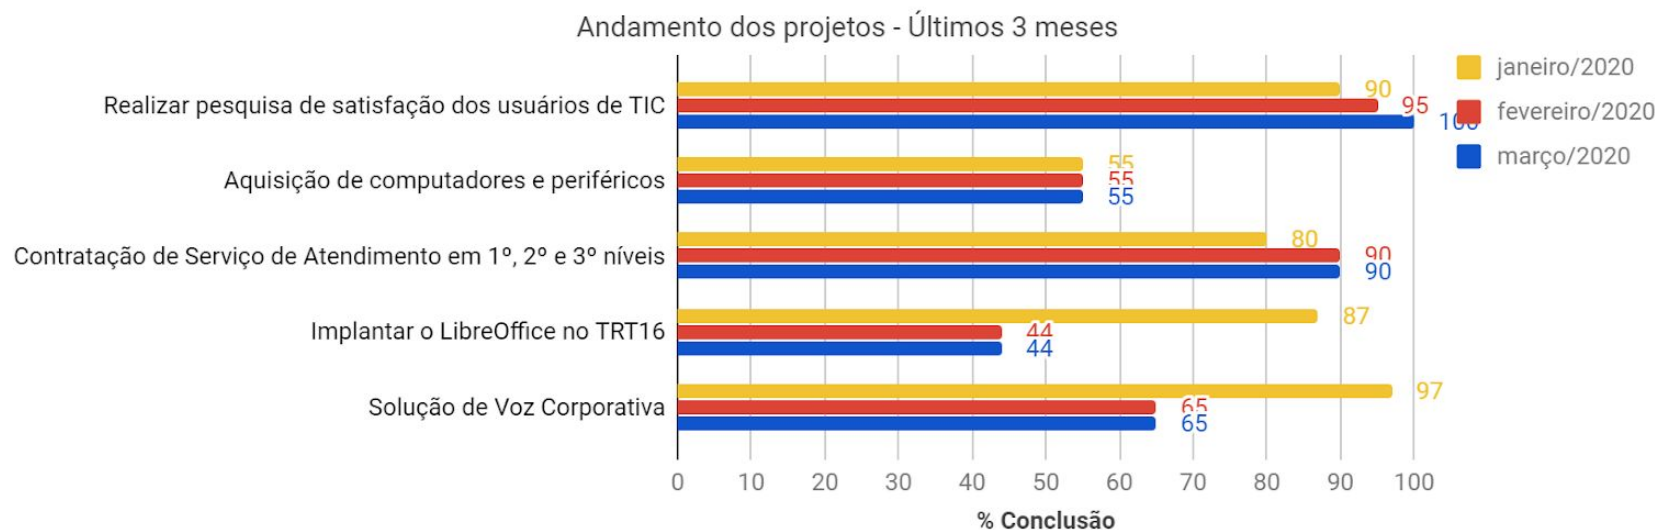


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	508	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Concluído	Ação	17/10/2019	30/03/2020	25/10/2019	30/03/2020	100	Projeto concluído. O relatório foi revisado e publicado no portal da Governança de TIC, também foi encaminhada solicitação para publicação no portal do TRT16.
2	351	Implantar o LibreOffice no TRT16	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Suspensão	Projeto	25/06/2018	30/04/2020	25/06/2018		44	Sem reporte do gerente. (EGP-TIC)
3	381	Solução de Voz Corporativa	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Suspensão	Projeto	27/08/2018	30/05/2020	31/08/2018		65	Sem progresso no período. Devido crises geradas pelas falhas do PJe e pelas ações de prevenção ao Corona Vírus, a equipe da infraestrutura não conseguiu dar vazão aos requisitos necessários para a implantação da solução.

4	391	Contratação de Serviço de Atendimento em 1º, 2º e 3º níveis	Carlos Eduardo Ferreira Marins	<b>Suspensão</b>	Projeto	19/09/2018	30/04/2020	21/09/2018		90	Sem reporte do gerente. (EGP-TIC)
6	500	Aquisição de computadores e periféricos	Carlos Eduardo Ferreira Marins	<b>Suspensão</b>	Projeto	05/08/2019	10/04/2020	05/08/2019		55	Sem progresso no período. Elaborada a RDM #6596 propondo a alteração do escopo do projeto, possibilitando assim o seu encerramento.

#### 4.8. SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

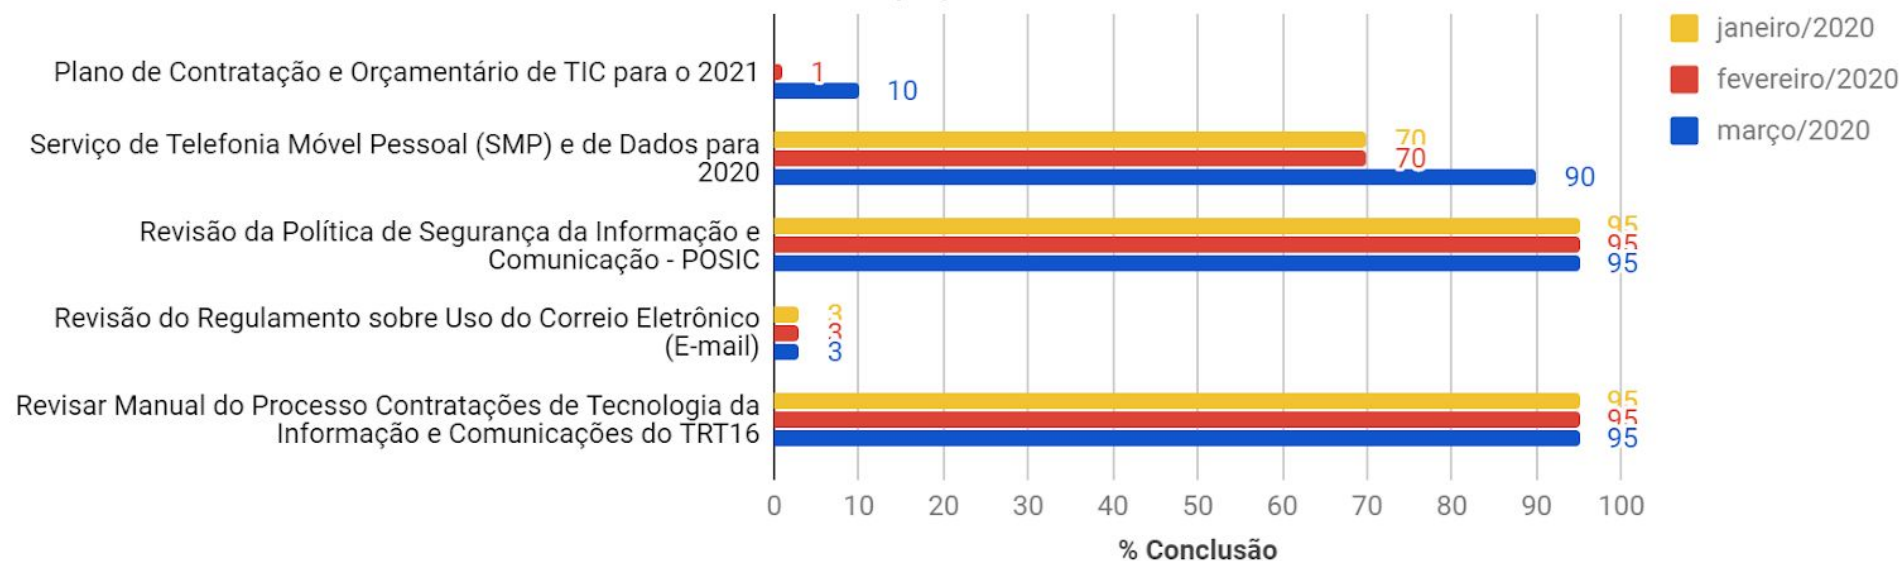

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	457	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2020	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	22/01/2019	14/04/2020	15/03/2019		90	Licitação realizada com sucesso no dia 30/03/2020.
2	525	Plano de Contratação e Orçamentário de TIC para o 2021	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Ação	18/02/2020	30/09/2020	18/02/2020		10	Levantamento das contratação junto as unidades da CTIC.
3	147	Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	09/05/2017	29/05/2020	09/05/2019		95	Sem progresso no período. Pedido de vista regimental pela Desembargadora Ilka Esdra Silva Araújo.

4	168	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC	Stanley Araujo de Sousa	<b>Suspensão</b>	Projeto	28/06/2017	29/05/2020	28/06/2017		95	Sem progresso no período. Pedido de vista regimental pelos Desembargadores James Magno Araújo Farias e Ilka Esdra Silva Araújo.
5	475	Revisão do Regulamento sobre Uso do Correio Eletrônico (E-mail)	Stanley Araujo de Sousa	<b>Suspensão</b>	Projeto	05/04/2019	31/07/2020	26/04/2019		3	Sem reporte do gerente. (EGP-TIC)
