



TRIBUNAL REGIONAL DO  
TRABALHO DA 16ª REGIÃO

---

# **Relatório de Atividades da CTIC**

**Julho/2019**

---

## Sumário

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	REUNIÃO DOS COMITÊS DE TIC	3
3.	ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC	4
4.	PORTFÓLIO DE PROJETOS E AÇÕES DE TIC	5
4.1.	RESUMO DOS PROJETOS	6
4.1.1.	PROJETOS INICIADOS NO PERÍODO	7
4.1.2.	PROJETOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO	7
4.1.3.	PROJETOS CANCELADOS NO PERÍODO	7
4.2.	COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES	8
4.3.	SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	9
4.4.	SETOR DE GOVERNANÇA DE TI	14
4.5.	SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL	16
4.6.	SEÇÃO DE APOIO AO PJE	19
4.7.	SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE	21
4.8.	SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	22

## 1. Introdução

Este documento tem por objetivo apresentar as atividades realizadas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação e suas unidades subordinadas no mês de **Julho de 2019**.

O relatório está estruturado pelos seguintes tópicos:

- Reunião dos comitês de TIC;
- Atendimento aos usuários de TIC;
- Portfólio de Projetos e Ações de TIC.

## 2. Reunião dos Comitês de TIC

No período de referência foram realizadas duas reuniões nos comitês relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação.


○ **Comitê de Governança de TIC** reuniu-se no dia **24/07/2019** ([link para ata da reunião](#)) e tratou do seguinte tema:

- Uso do Recurso Orçamentário excedente referente ao Plano Orçamentário de TIC.

○ **Comitê de Gestão de TIC** reuniu-se no dia **04/07/2019** ([link para ata da reunião](#)) e tratou do seguinte tema:

- Demanda de trabalho na SIC.

## 3. Atendimento aos Usuários de TIC

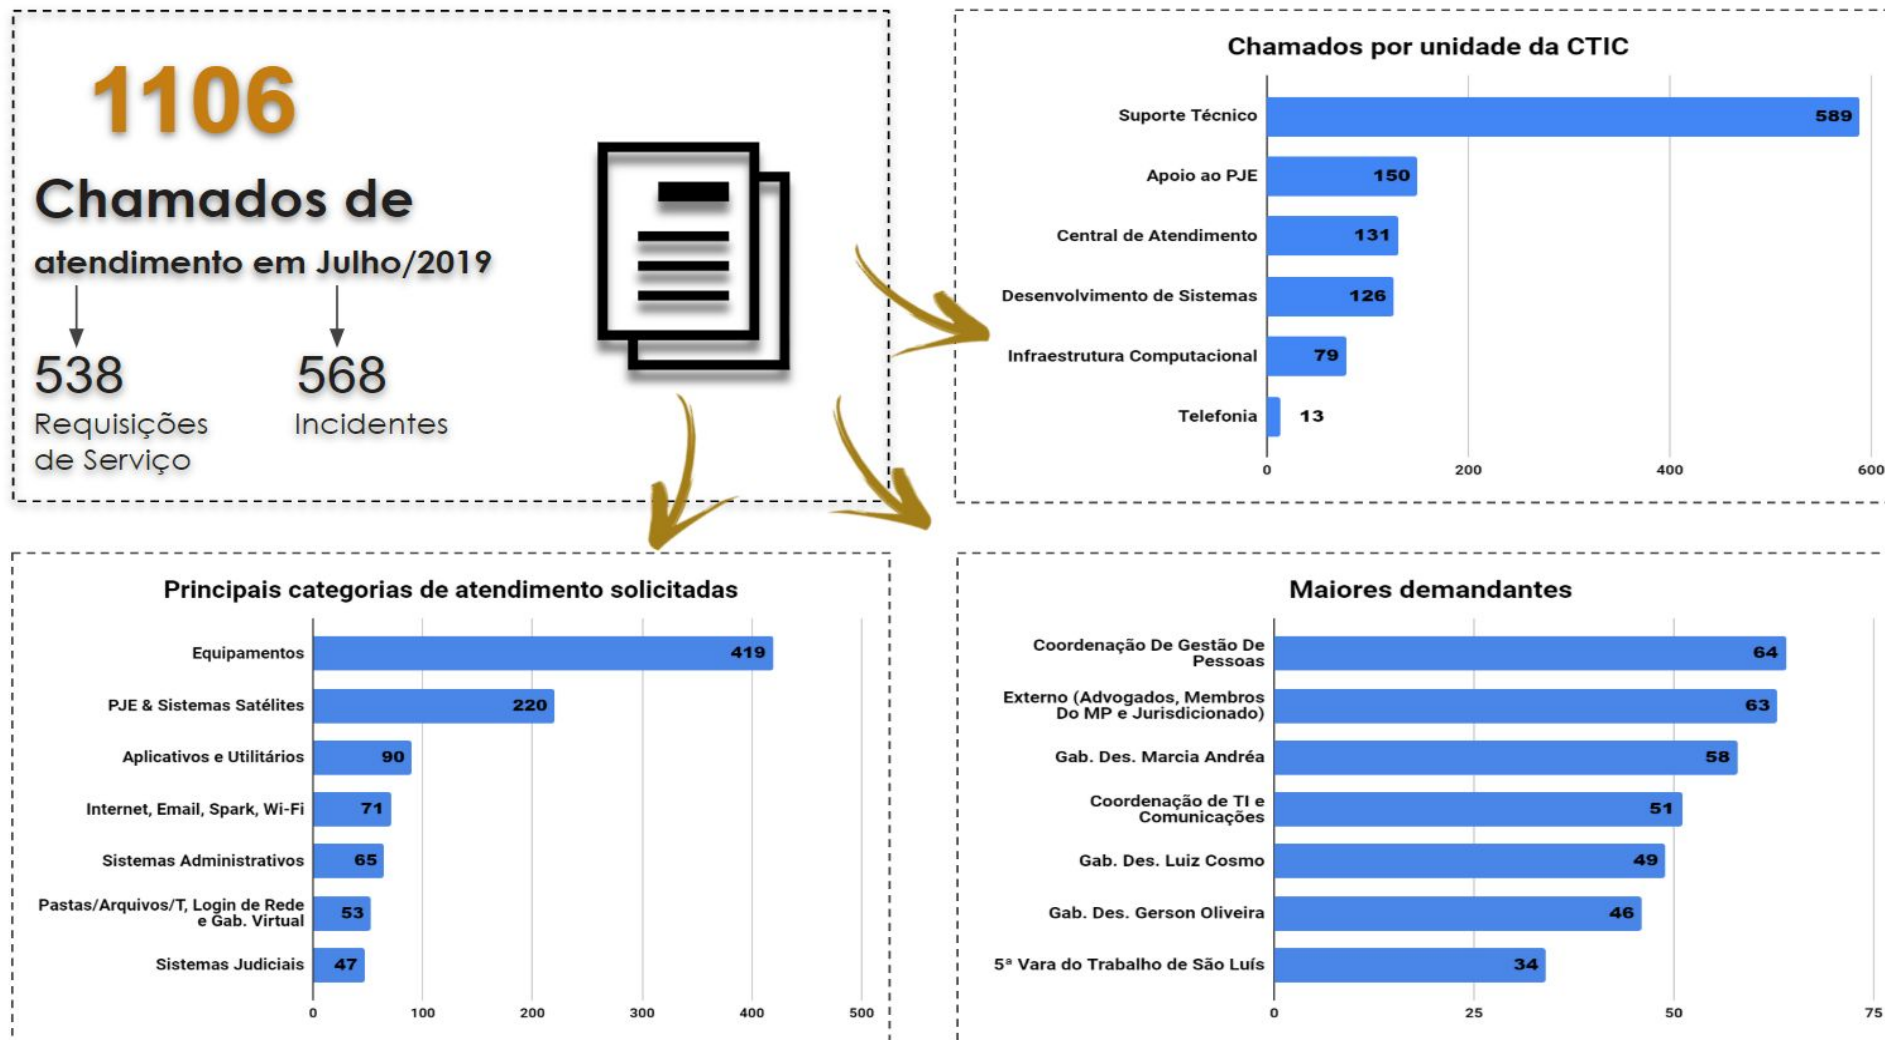

---

## 4. Portfólio de Projetos e Ações de TIC

Nesta seção são apresentadas as informações relativas aos projetos de TIC controlados pelo Escritório de Projetos de TIC.

Inicialmente, é exibida uma perspectiva geral dos projetos agrupados pela unidade na qual eles estão sendo gerenciados, e são listados os projetos iniciados, concluídos e cancelados no período.


Além do resumo do portfólio, para cada área de TIC são listados os projetos e suas respectivas evoluções no período de referência.

## 4.1. Resumo dos projetos


Quantidade de projetos nas unidades




Complexidade dos projetos



Situação dos projetos

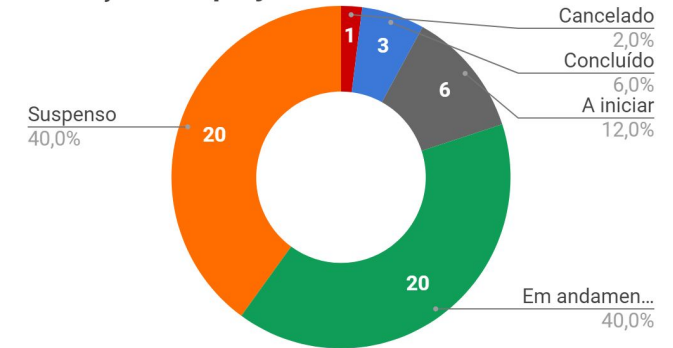

Situação dos projetos nas unidades

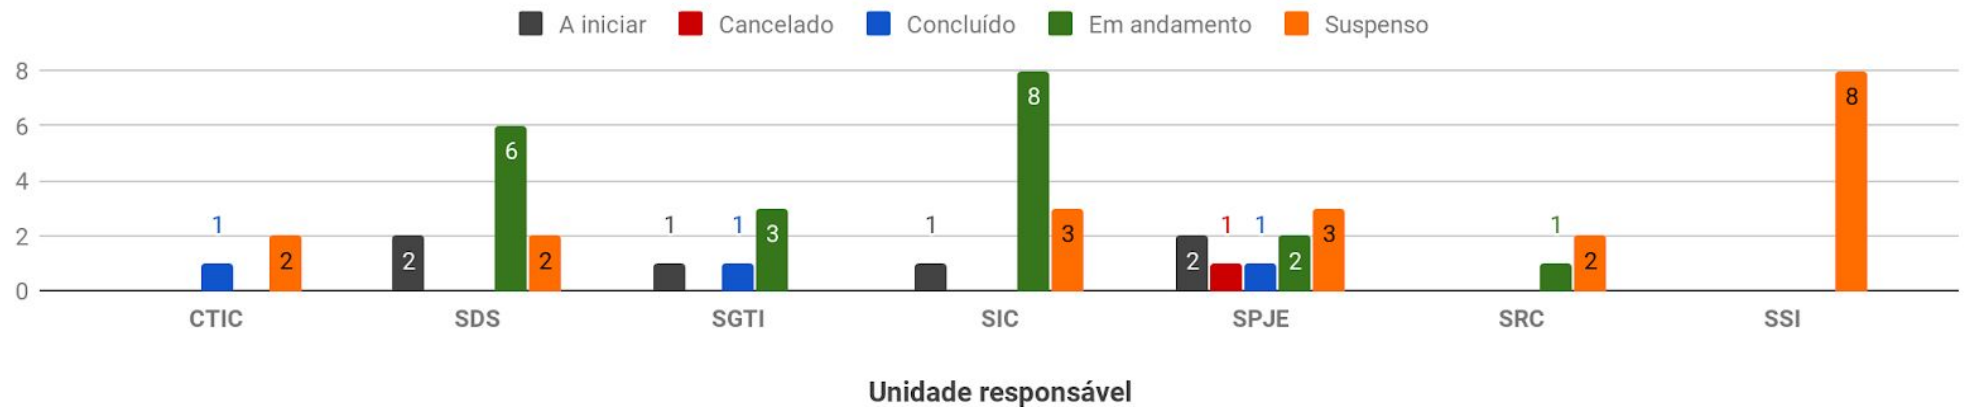

## 4.1.1. Projetos iniciados no período

Id	Nome	Gerente do projeto	Unidade responsável	Tipo	Data da demanda	Início realizado	Fim realizado	Status
496	Treinamento para gerência de redes sem fio Aruba	Danilo Augusto Alves Leite	SIC	Ação	25/07/2019	26/07/2019		Em andamento

## 4.1.2. Projetos concluídos no período


Id	Nome	Gerente do projeto	Unidade responsável	Tipo	Data da demanda	Início realizado	Fim realizado	Status
474	Contratação de capacitações técnicas e gerenciais EAD	Gilberto Cunha Filho	SPJE	Ação	28/03/2019	29/03/2019	02/07/2019	Concluído
392	Revisar as metodologias de Gerenciamento de Projeto e Portfólio de TIC	Maickel Roberto Neitzke	SGTI	Projeto	24/09/2018		23/07/2019	Concluído
221	Implantação de ambiente site backup	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	CTIC	Projeto	30/11/2017		31/07/2019	Concluído

## 4.1.3. Projetos cancelados no período

Id	Nome	Gerente do projeto	Unidade responsável	Tipo	Data da demanda	Início realizado	Fim realizado	Status	Justificativa
175	Implantar Conciliação Virtual para o Pje	Gilberto Cunha Filho	SPJE	Projeto	20/07/2017		11/07/2019	Cancelado	Projeto cancelado. Motivo: implantação de sistema que estará em não-conformidade com a política de nacionalização do sistema Pje-JT e de seus módulos satélites.

## 4.2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

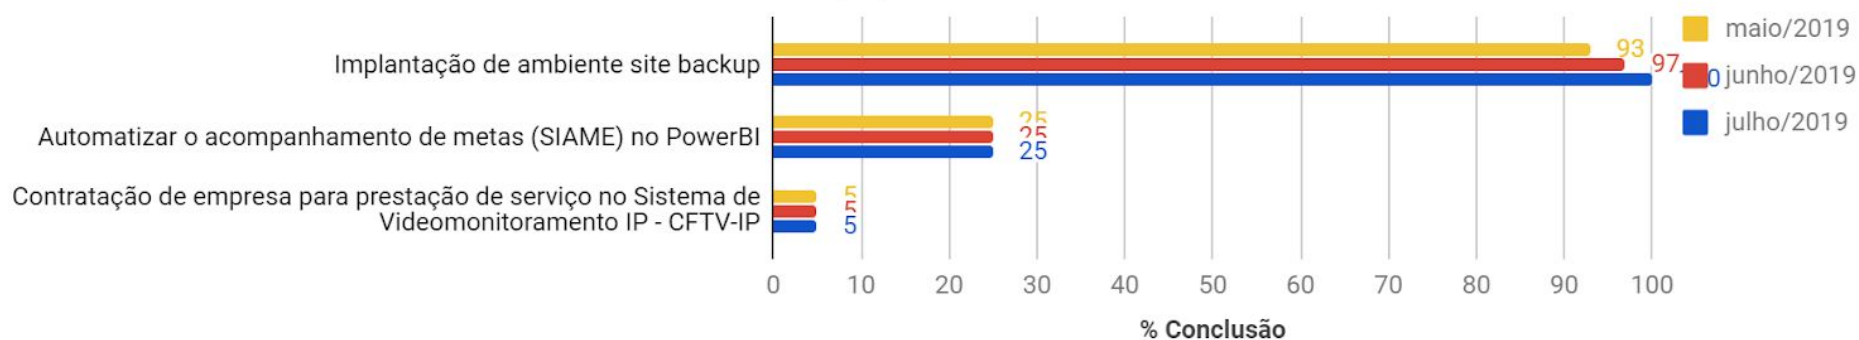


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	221	Implantação de ambiente site backup	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Concluído	Projeto	30/11/2017	26/06/2019		31/07/2019	100	Projeto concluído. Recebimento definitivo realizado e pagamento efetuado.
2	246	Contratação de empresa para prestação de serviço no Sistema de Videomonitoramento IP - CFTV-IP	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Suspensão	Projeto	16/02/2018	20/09/2019			5	Sem progresso no período.
3	378	Automatizar o acompanhamento de metas (SIAME) no PowerBI	David Tedson Mendonca Ferreira	Suspensão	Ação	23/08/2018	30/08/2019			25	Sem reporte do Gerente do Projeto. (EGP-TIC)



## 4.3. Setor de Desenvolvimento de Sistemas

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

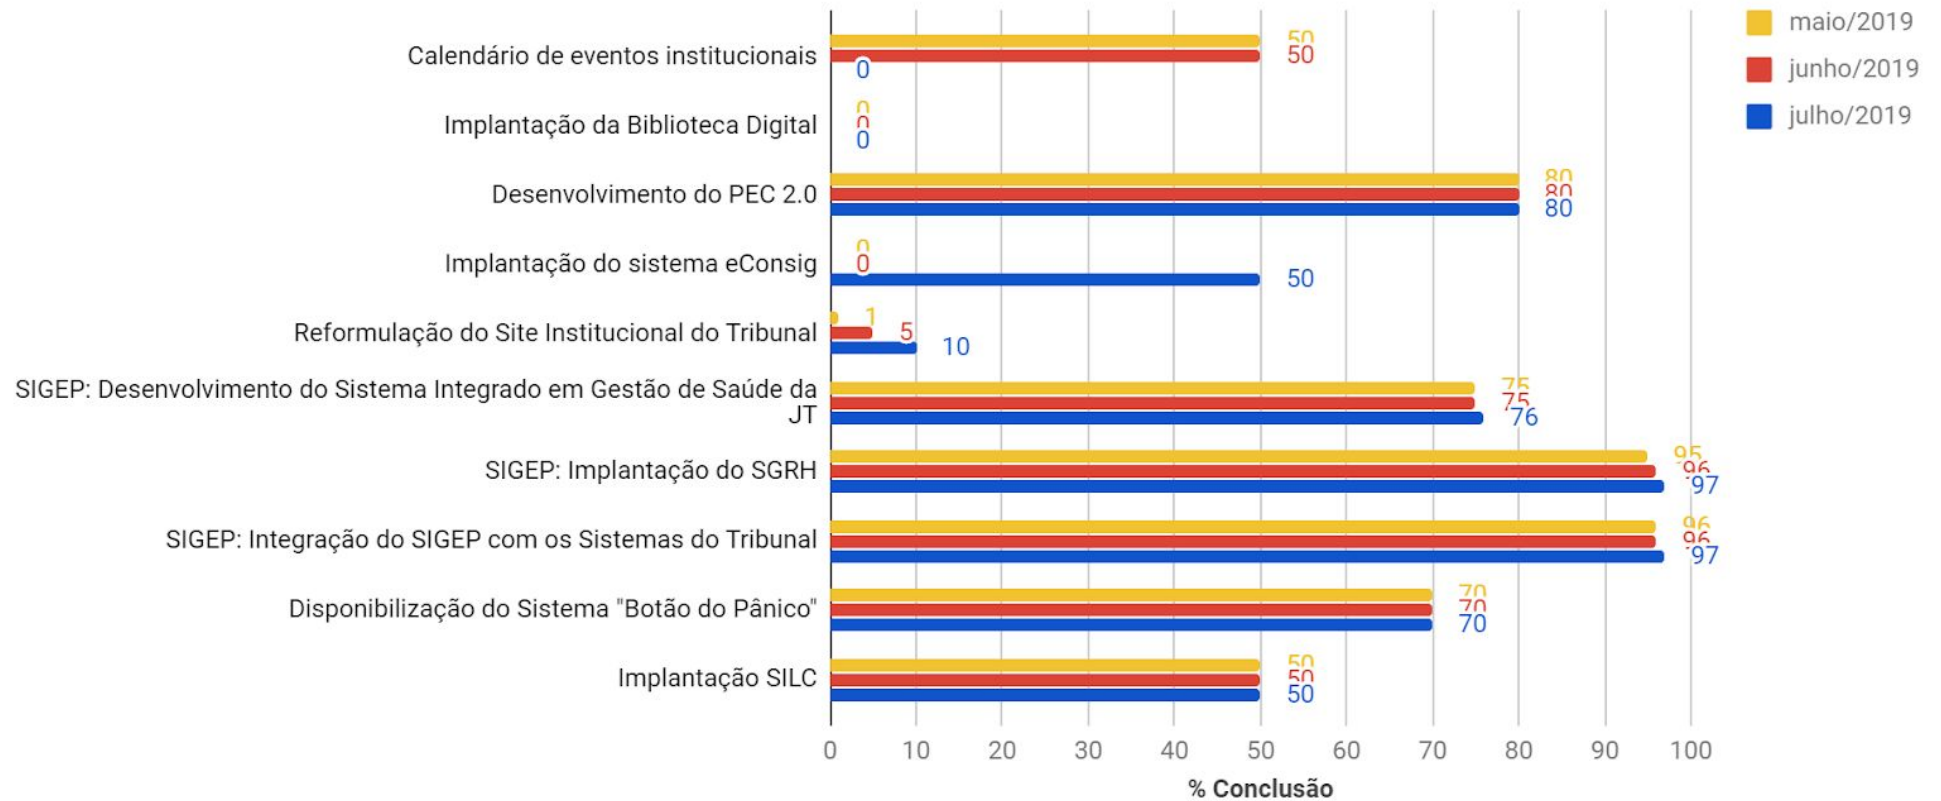

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	223	Calendário de eventos institucionais	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	06/12/2017	30/11/2019			0	Conforme alinhado em reunião com a Seção de Comunicação Social as solicitações originais do DOD foram substituídas pelos entregáveis descritos no Termo de Abertura do Projeto, concluído neste mês de julho/2019, não estando presentes quaisquer outros requisitos funcionais ou não funcionais. O projeto foi classificado como ação. A porcentagem de conclusão do projeto foi reavaliada e reduzida para se adequar ao novo escopo.
2	279	Implantação da Biblioteca Digital	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	01/01/2018	18/12/2020			0	Sem progressos no período. Projeto previsto para execução em 2020 de acordo com o PDTIC 2019/2020.
3	32	SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	24/05/2018	30/08/2019			97	- Realizado teste de virada de chave do Rh Legado para o SGRH em todos os sistemas já transicionados. Correções realizadas; - Adequação do eGestão em curso, tarefas realizadas: - identificação e correção de objetos pendentes de transição; - adequação dos itens administrativos para utilizar o pacote SIGEP de integração com eGestão fornecido pelo TRT2; - criação das procedures de transição para os itens administrativos;
4	187	SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	Diogo Duailibe da Silva	Em andamento	Projeto	25/08/2017	01/12/2020			76	- Desenvolvimento de novas funcionalidades do NGS1 (SBIS); - Desenvolvimento de impressão geral do prontuário; - Correções solicitadas pelo TRT-2.

5	224	Implantação do sistema eConsig	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	06/12/2017	30/08/2019		50	<p>- Contrato número 23/2019 celebrado. Sem pendências legais para o início da utilização do eConsig.</p> <p>- Pendência técnica: o Núcleo de Folha de Pagamento pediu à ZetraSoft que entre em contato com o Setor de Desenvolvimento para alinhar como será feito o cadastro dos servidores à plataforma.</p> <p>- Pendência de negócio: Sistema de FolhaWeb está em produção, mas ainda está em paralelo ao sistema legado de folha, o que impossibilita a utilização do eConsig na FolhaWeb de maneira efetiva, já que o pagamento da folha do tribunal ainda está sendo feito pelo sistema legado. A previsão atual para primeiro pagamento na FolhaWeb é a folha de Agosto de 2019, após o que o sistema legado será descontinuado.</p>
6	277	SIGEP: Implantação do SGRH	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	01/01/2018	31/08/2019		97	<p>Execução dos sistemas de FolhaWeb e SGRH em paralelo com os sistema de Rh e Folha legados (descontinuação prevista para Agosto/2019); Resolução de 46 chamados (via Assyst) 42 de SGRH e 4 de FolhaWeb</p>
7	280	Reformulação do Site Institucional do Tribunal	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	01/01/2018	27/12/2019	29/05/2019	10	<p>Entrega 1 - Mapeamento de Conteúdo e Configurações Iniciais: Concluída. Mapeamento inicial foi reavaliado para atender a resolução CSJT 243/2019 Foi feita a preparação e configuração da infra estrutura com o auxílio do servidor do TRT8 Houve o treinamento técnico ministrado pelo servidor do TRT8 na primeira semana de julho Entrega 2 - Desenvolvimento do Template da Página Inicial Template Drupal criado para Desktop Template Drupal criado para Dispositivos Móveis (responsivo) Feita apresentação para ASCOM</p>

8	354	Desenvolvimento do PEC 2.0	Ronny Paterson Cruz da Silva	Em andamento	Projeto	03/07/2018	24/01/2020			80	<p>No período anterior, ficaram pendentes de envio de integração as sub-tarefas da história PJEKZ-14331, pertencente ao entregável EGPJE-1643, o que foi realizado em 09/07/2019. Em relação ao entregável EGPJE-1643, devido à sua urgência, foi cancelado e a sua história (PJEKZ-14331), foi convertida em demanda de Melhoria, tendo sido entregue em 09/07/2019. Deve-se destacar que a melhoria em questão foi objeto de apresentação do servidor Ronny Paterson Cruz da Silva na I Reunião dos Gestores Regionais do PJe no CSJT, em Brasília/DF, na data de 19/06/2019.</p> <p>O PGP do projeto ainda não foi aprovado, mas adianto que 3 ou 4 entregáveis devem ser disponibilizados ao término do ciclo de desenvolvimento da versão 2.5, que finaliza-se em 13/09/2019.</p> <p>Em resumo, os próximos entregáveis serão apresentados como descrito abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-O entregável EGPJE-483 será mantido com as mesmas premissas, à exceção da história PJEKZ-10488, que fará parte do entregável EGPJE-484;</li> <li>-O entregável EGPJE-484 pode ser desmembrado em dois, sendo um para a integração com o GIM e outro para a integração com o GIGS, sendo a necessidade desta última o que levará a disponibilização de um 4º entregável;</li> <li>-A História PJEKZ-5287 será deslocada para um novo entregável, permitindo, assim, a homologação do entregável EGPJE-480.</li> </ul> <p>Entretanto, o prazo de desenvolvimento não deve ser considerado como marco final do projeto, pois há ainda todo o período de homologação, além do fato de novos requisitos para as histórias surgirem após estas terem sido</p>
---	-----	----------------------------	------------------------------	--------------	---------	------------	------------	--	--	----	---

											<p>entregue, de forma que este novo PGP apresentado indicará que o prazo final do projeto será em 24/01/2019, data em que está previsto o final de correções para os tribunais pilotos.</p> <p>Tal fato decorre do aprendizado no ciclo de desenvolvimento da versão 2.4, onde uma das funcionalidades desenvolvidas está integrada à versão, atualmente em produção em tribunais pilotos, e ensejou atuação numa demanda de crise apontada por um dos tribunais pilotos. Como este tipo de demanda é atribuído diretamente à equipe que desenvolveu a funcionalidade, tal situação deve ser contemplada no prazo final do projeto.</p>
9	19	Implantação SILC	Andre Pereira Nunes	Suspensão	Projeto	06/02/2018	31/07/2020			50	Sem progressos no período. Projeto postergado para execução em 2020 conforme PDTIC.
10	446	Disponibilização do Sistema "Botão do Pânico"	Darlon José Coqueiro	Suspensão	Projeto	13/11/2018	15/09/2019			70	Sem progresso no período. Pendência de atendimento do chamado S40061 pela SIC para prosseguimento.

## 4.4. Setor de Governança de TI

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses




#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	483	Serviço de Suporte Técnico do Software de Gerenciamento de Riscos 2020	Jose Augusto	A iniciar	Projeto	25/04/2019	31/12/2019			0	Projeto não iniciado. Aguardando a movimentação nacional dos tribunais responsáveis pela licitação.
2	392	Revisar as metodologias de Gerenciamento de Projeto e Portfólio de TIC	Maickel Roberto Neitzke	Concluído	Projeto	24/09/2018	31/07/2019		23/07/2019	100	Projeto concluído com a finalização e publicação da nova MGP e seus processos. Elaborado também um manual introdutório do tema.
3	372	Elaborar o processo de planejamento do PETIC e PDTIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Projeto	10/08/2018	30/08/2019			45	- Finalizado Planejamento do Projeto. - Iniciada a elaboração dos fluxos e do documento que descreve o processo (65% concluído).

4	482	Análise qualitativa, quantitativa, e de rotatividade do quadro de pessoal de TIC	Jose Augusto	Em andamento	Projeto	24/04/2019	30/08/2019	29/04/2019		75	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Montagem da planilha de captação de competências efetivas das unidades: SREC, SDS, SIC.</li> <li>- Montagem da planilha de competências existentes do PJE;</li> <li>- Preenchimento das planilhas do SGTI, SRC, SSI, SDS e SPJE;</li> <li>- Escrita do módulo de rotatividade do relatório conclusivo.</li> </ul>
5	486	Revisar PETIC 2017-2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Ação	13/05/2019	06/09/2019	14/05/2019		70	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finalização da minuta preliminar da nova versão do Plano Estratégico de TIC.</li> <li>- Início da coleta e análise dos indicadores referentes aos anos de 2017 e 2018.</li> </ul>

## 4.5. Setor de Infraestrutura Computacional

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

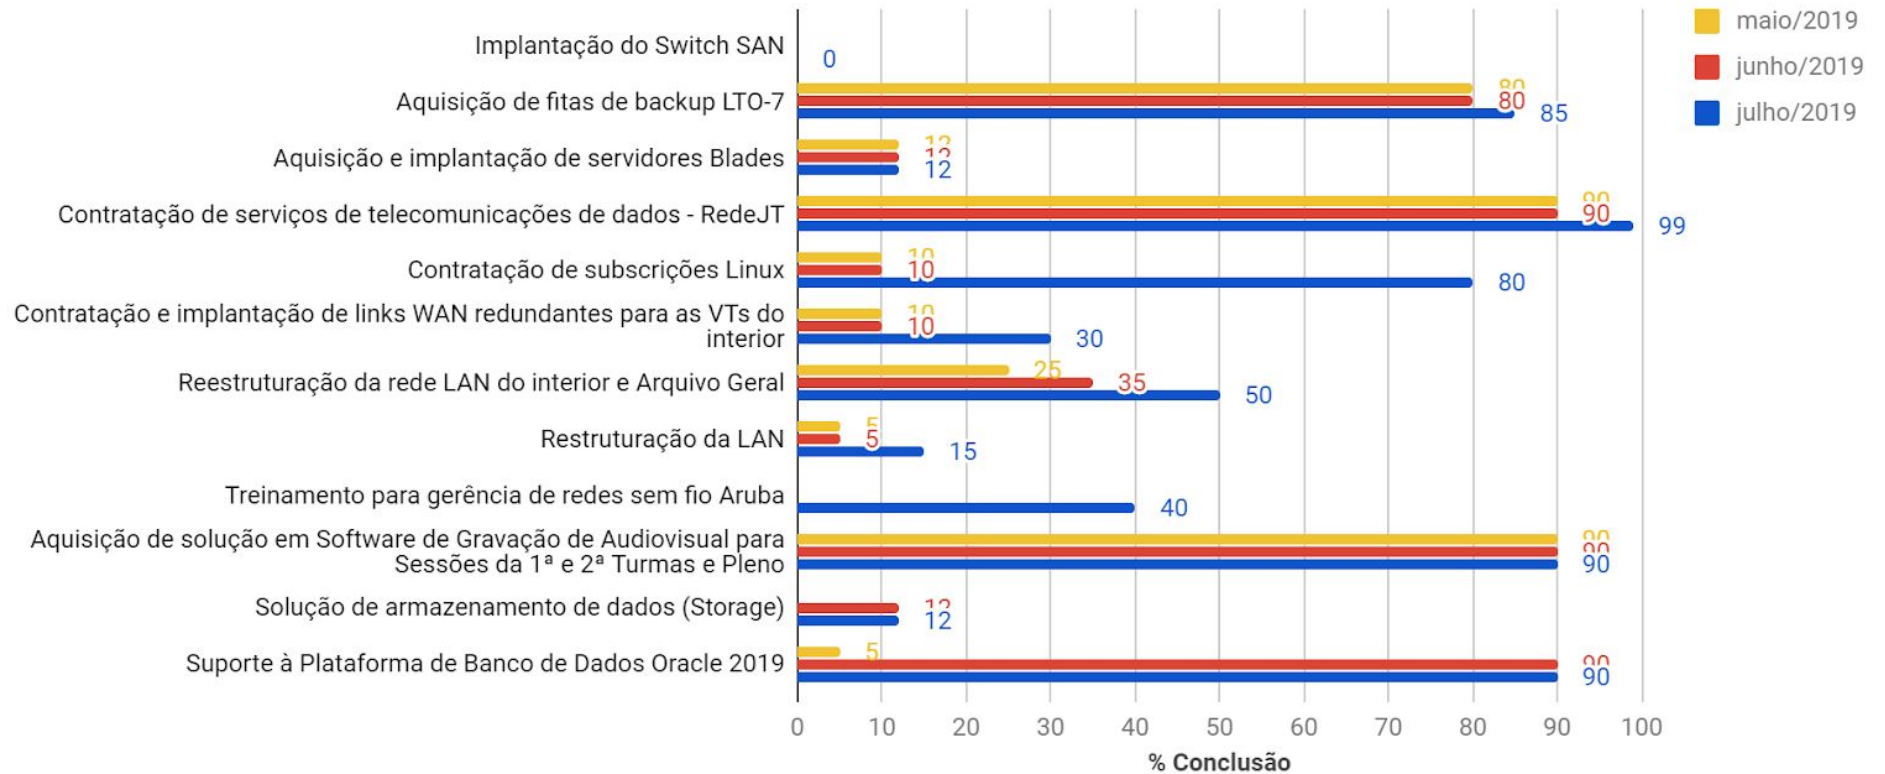

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	493	Implantação do Switch SAN	Danilo Augusto Alves Leite	A iniciar	Ação	02/07/2019	31/12/2019			0	Projeto não iniciado.




2	233	Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT	Danilo Augusto Alves Leite	Em andamento	Projeto	12/01/2018	31/12/2019			99	Upgrade finalizado nas VTs. Aguardando o atesto pelo fiscal e o encerramento formal do projeto.
3	442	Reestruturação da LAN	Danilo Augusto Alves Leite	Em andamento	Projeto	17/10/2018	31/12/2019			15	Novas varas do trabalho receberam switches e tiveram sua rede reestruturada.
4	455	Aquisição e implantação de servidores Blades	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	Projeto	15/01/2019	31/12/2019	31/01/2019		12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajustes nos contratos;</li> <li>- Contratos TRT 16 nº 20/2019 e 21/2019 assinados pela presidente e pela empresas;</li> <li>- Designação de novos fiscais para os contratos;</li> <li>- Extrato do contrato publicado no DOU/DEJT;</li> <li>- Contratos registrados no SIAF.</li> </ul> <p>Riscos e problemas:}</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrega dos ativos fora do prazo devido a restrições aos produtos Huawei;</li> <li>- Conflito com o cronograma de implantação de outros projetos;</li> <li>- Insuficiência de recursos humanos de SIC.</li> </ul>
5	460	Aquisição de fitas de backup LTO-7	Rodrigo Silveira Alexandre	Em andamento	Projeto	29/01/2019	30/09/2019	30/01/2019		85	<p>Publicado no DOU as ARP das fitas e etiquetas. Despachado para DG a solicitação de orçamento.</p> <p>Aprovado o remanejamento dos recursos excedentes de TIC na 5ª Reunião do CGovTIC para custear o projeto.</p> <p>Dotação orçamentária 257 apresentada com disponibilidade orçamentária suficiente.</p>
6	461	Contratação de subscrições Linux	Fernando Rola Ferreira Filho	Em andamento	Projeto	29/01/2019	05/09/2019	30/01/2019		80	Realizado o ETP, o preenchimento da IRP, bem como suas assinaturas. Aguardando a realização do pregão organizado pelo TRT5.

7	476	Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo Geral	Antonieli Magalhaes de Carvalho	Em andamento	Projeto	01/04/2019	14/09/2019	16/04/2019		50	- Reestruturação da rede LAN das VTs: São João dos Patos e Balsas; Bacabal e Pedreiras; Presidente Dutra e Barra do Corda; - WiFi configurado apenas em Presidente Dutra.
8	480	Contratação e implantação de links WAN redundantes para as VTs do interior	Danilo Augusto Alves Leite	Em andamento	Projeto	15/04/2019	31/12/2019	08/03/2019		30	ETP e TR finalizados. Pendência: revisão dos artefatos por parte do servidor administrativo (servidora em férias).
9	496	Treinamento para gerência de redes sem fio Aruba	Danilo Augusto Alves Leite	Em andamento	Ação	25/07/2019	29/11/2019	26/07/2019		40	- Projeto iniciado; - Realizado pesquisa de preço para fornecimento do treinamento; - Finalizado o ETP;
10	358	Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno	Pablo Teofilo Durans	Suspensão	Projeto	06/07/2018	31/08/2019			90	Sem progresso no período. Férias do integrante administrativo e empecilhos enfrentados pelo SIC.
11	485	Suporte à Plataforma de Banco de Dados Oracle 2019	Leonel Pereira	Suspensão	Projeto	02/05/2019	27/10/2019	17/05/2019		90	Sem progresso no período. Acompanhamento do processo de contratação.
12	490	Solução de armazenamento de dados (Storage)	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Suspensão	Projeto	18/06/2019	31/12/2019	18/06/2019		12	Sem progresso no período. Pendência: falta de recursos orçamentários. Riscos: - Falta de recursos de armazenamento, a prestação de novos serviços poderá ficar prejudicada; - Ausência futura de recurso de armazenamento poderá ocasionar indisponibilidade de serviços de TI.

## 4.6. Seção de Apoio ao PJe

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

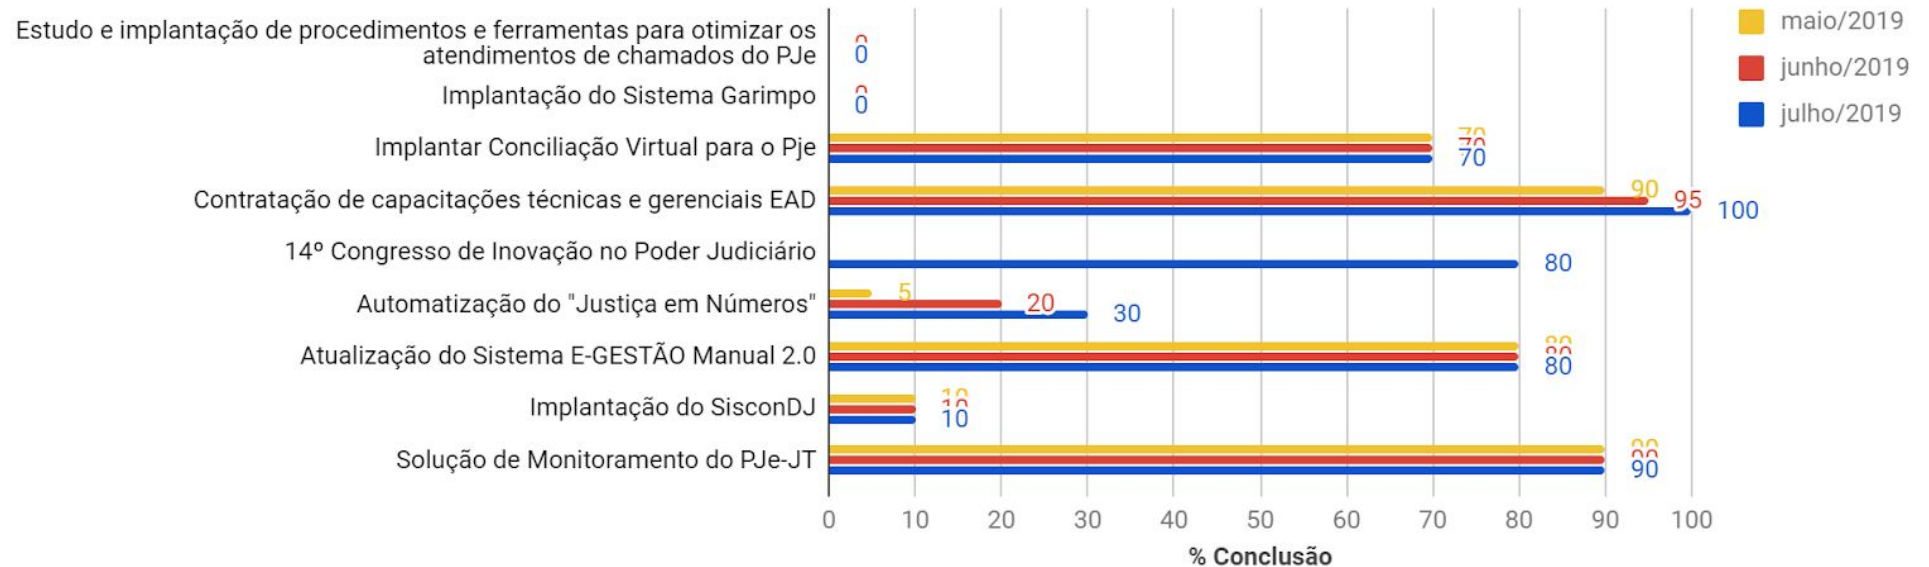


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	489	Implantação do Sistema Garimpo	Gilberto Cunha Filho	A iniciar	Projeto	05/06/2019	31/12/2019			0	Projeto a iniciar. Aguardando o CSJT validar o projeto antes dos regionais implantar.
2	492	Estudo e implantação de procedimentos e ferramentas para otimizar os atendimentos de chamados do PJe	Gilberto Cunha Filho	A iniciar	Projeto	18/06/2019	30/08/2019			0	Projeto não iniciado.

3	175	Implantar Conciliação Virtual para o Pje	Gilberto Cunha Filho	Cancelado	Projeto	20/07/2017	11/07/2019		11/07/2019	70	Projeto cancelado. Motivo: implantação de sistema que estará em não-conformidade com a política de nacionalização do sistema Pje-JT e de seus módulos satélites.
4	474	Contratação de capacitações técnicas e gerenciais EAD	Gilberto Cunha Filho	Concluído	Ação	28/03/2019	02/07/2019	29/03/2019	02/07/2019	100	Projeto concluído. Pagamento efetuado e projeto encerrado formalmente.
5	481	Automatização do "Justiça em Números"	Djeison Rafael Neitzke	Em andamento	Ação	23/04/2019	06/09/2019	19/06/2019		30	- Criação das views auxiliares faltantes para geração do xml referente ao sistemas legado SAPT2; - Criação das duas views principais para geração do xml referente aos sistemas legados (SAPT1 e SAPT2);
6	494	14º Congresso de Inovação no Poder Judiciário	Gilberto Cunha Filho	Em andamento	Ação	05/07/2019	31/07/2019			80	Projeto iniciado, autorização emitida e inscrições realizadas.
7	56	Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0	Gilberto Cunha Filho	Suspenso	Projeto	06/04/2018	31/12/2019			80	Sem progresso no período. Pendência: definição pelo TST da data inicial de vigência para liberação das novas regras já implementadas.
8	353	Solução de Monitoramento do PJe-JT	Romulo Moura	Suspenso	Projeto	21/06/2018	31/07/2019			90	Sem reporte do gerente do projeto. (EGP-TIC)
9	477	Implantação do SisconDJ	Gilberto Cunha Filho	Suspenso	Ação	05/12/2018	30/09/2019			10	Sem progresso no período. Pendência de recursos humanos da SIC.

## 4.7. Setor de Relacionamento com o Cliente


Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

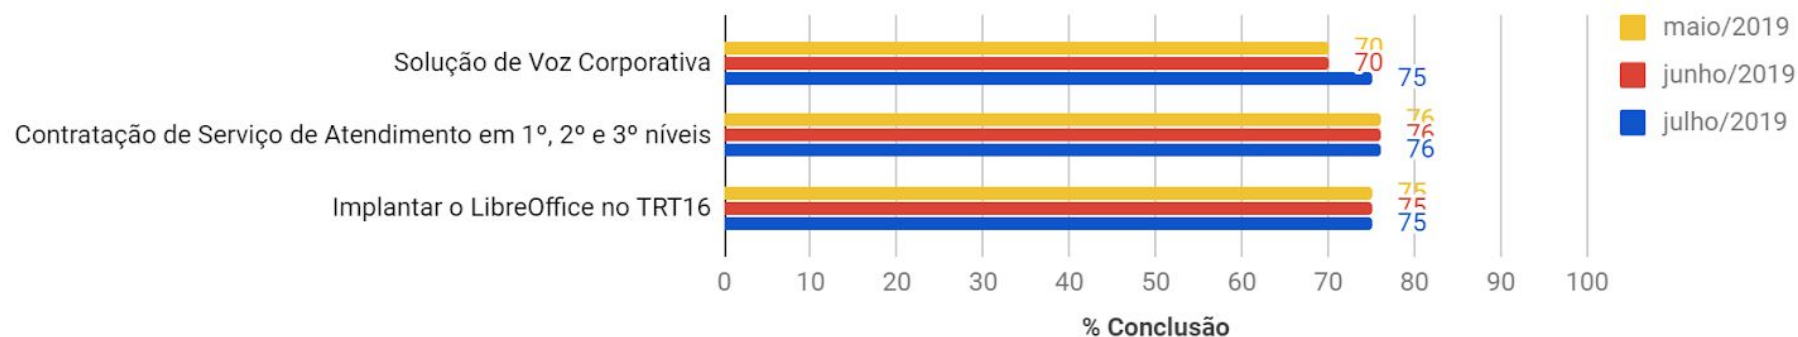

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	381	Solução de Voz Corporativa	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	27/08/2018	30/08/2019			75	ETP e o TR concluídos e enviados à Diretoria-Geral. O projeto entrará na fase de acompanhamento da contratação.
2	351	Implantar o LibreOffice no TRT16	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Suspensão	Projeto	25/06/2018	30/08/2019			75	Sem progresso no período. Sobrecarga de trabalho no SIC para atualização das GPOs de instalação.
3	391	Contratação de Serviço de Atendimento em 1º, 2º e 3º níveis	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Suspensão	Projeto	19/09/2018	20/12/2019			76	Sem progresso no período. Problema: concorrência de outras atividades do setor e férias do servidor que conduz o projeto.

## 4.8. Seção de Segurança da Informação

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

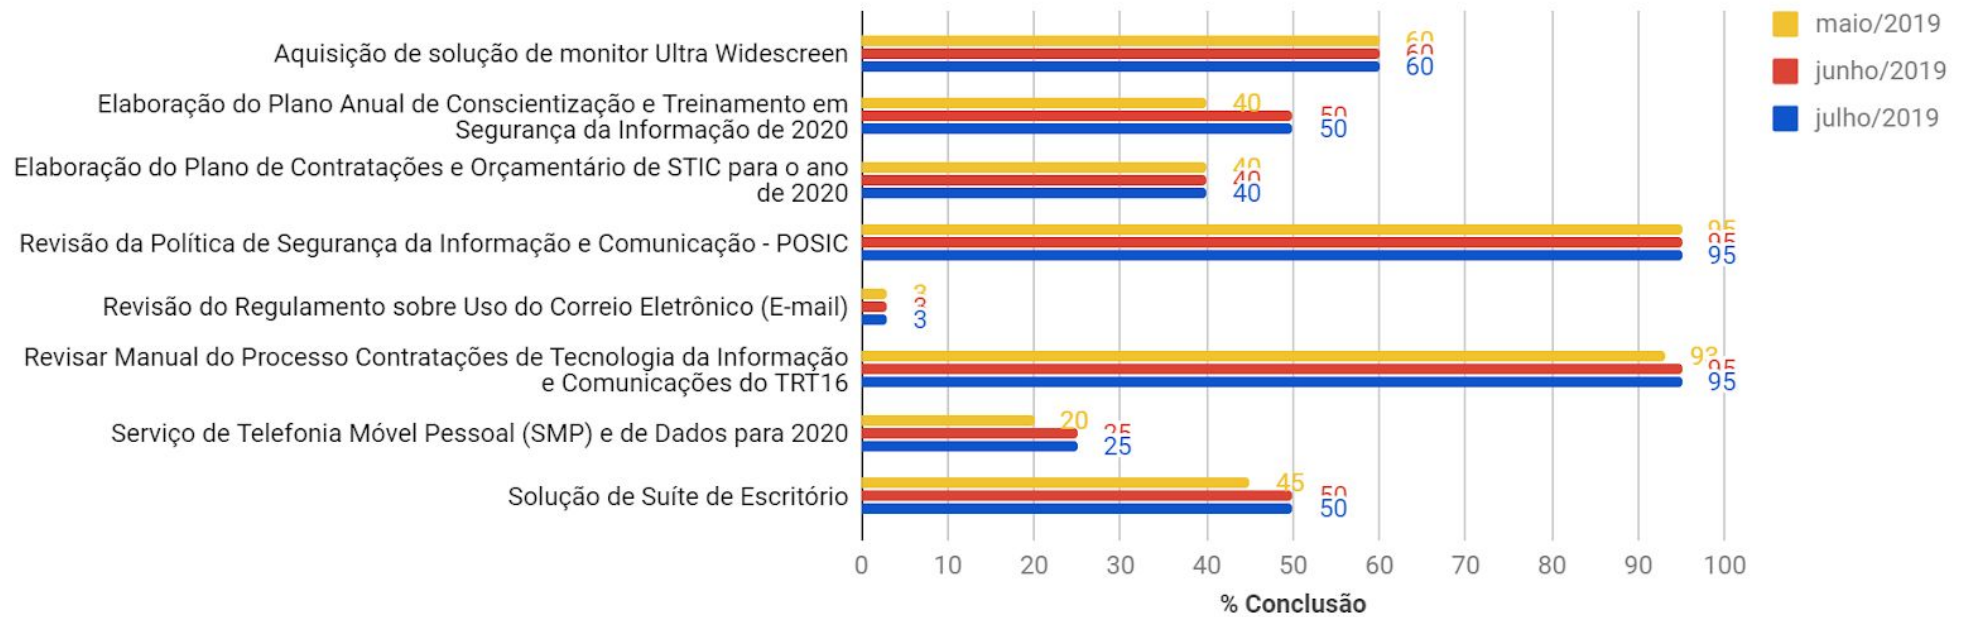

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	147	Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16	Stanley Araujo de Sousa	Suspense	Projeto	09/05/2017	15/08/2019			95	Sem reporte do gerente do projeto. Servidor em férias. (EGP-TIC)

2	168	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC	Stanley Araujo de Sousa	Suspenso	Projeto	28/06/2017	31/07/2019			95	Sem reporte do gerente do projeto. Servidor em férias. (EGP-TIC)
3	375	Aquisição de solução de monitor Ultra Widescreen	Stanley Araujo de Sousa	Suspenso	Projeto	27/08/2018	30/09/2019			60	Sem reporte do gerente do projeto. Servidor em férias. (EGP-TIC)
4	450	Solução de Suíte de Escritório	Stanley Araujo de Sousa	Suspenso	Projeto	21/11/2018	31/10/2019			50	Sem reporte do gerente do projeto. Servidor em férias. (EGP-TIC)
5	454	Elaboração do Plano de Contratações e Orçamentário de STIC para o ano de 2020	Stanley Araujo de Sousa	Suspenso	Projeto	04/01/2019	31/10/2019	04/01/2019		40	Sem reporte do gerente do projeto. Servidor em férias. (EGP-TIC)
6	457	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2020	Stanley Araujo de Sousa	Suspenso	Projeto	22/01/2019	27/03/2020	15/03/2019		25	Sem reporte do gerente do projeto. Servidor em férias. (EGP-TIC)
7	473	Elaboração do Plano Anual de Conscientização e Treinamento em Segurança da Informação de 2020	Stanley Araujo de Sousa	Suspenso	Projeto	01/04/2019	31/10/2019	08/04/2019		50	Sem reporte do gerente do projeto. Servidor em férias. (EGP-TIC)
8	475	Revisão do Regulamento sobre Uso do Correio Eletrônico (E-mail)	Stanley Araujo de Sousa	Suspenso	Projeto	05/04/2019	30/09/2019			3	Sem reporte do gerente do projeto. Servidor em férias. (EGP-TIC)
